

道路・河川・港湾・漁港等の復旧

【 担当課: 土木課 】

■主要インフラの災害復旧

【事業名称】道路災害復旧事業

河川災害復旧事業

港湾等災害復旧事業

漁港等災害復旧事業

【事業期間】

令和7年度～令和16年度

令和7年度～令和13年度

令和7年度～令和12年度

令和7年度～令和12年度

【事業内容】道路復旧

壊れた道を直し、安全に通れるようにする。

河川復旧

堤防や護岸を直し、洪水などを防ぐ。

港湾・漁港等の復旧

物流や防災の拠点として港の機能を復旧し、地域の暮らしを支える。

【事業概要】被災道路の復旧

212 箇所

被災港湾等の復旧

3 箇所

被災河川の復旧

28 箇所

被災漁港等の復旧

15 箇所

【事業費】 192

億円

【復旧状況】(代表的な復旧箇所)

従前



従後




【事業スケジュール】

種別	令和7年度		令和8年度		令和9年度		令和10年度		令和11年度以降	
道路	調査・設計	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事
河川	調査・設計	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事
港湾等	調査・設計	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事
漁港等	調査・設計	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事


【進捗状況】

項目		進捗率		R7年度	
道路	復旧路線数		19%	41	箇所
	被災路線数			212	箇所
河川	復旧河川数		14%	4	箇所
	被災河川数			28	箇所
港湾等	復旧港湾数		0%	0	箇所
	被災港湾数			3	箇所
漁港等	復旧漁港数		20%	3	箇所
	被災漁港数			15	箇所


【位置図】道路復旧

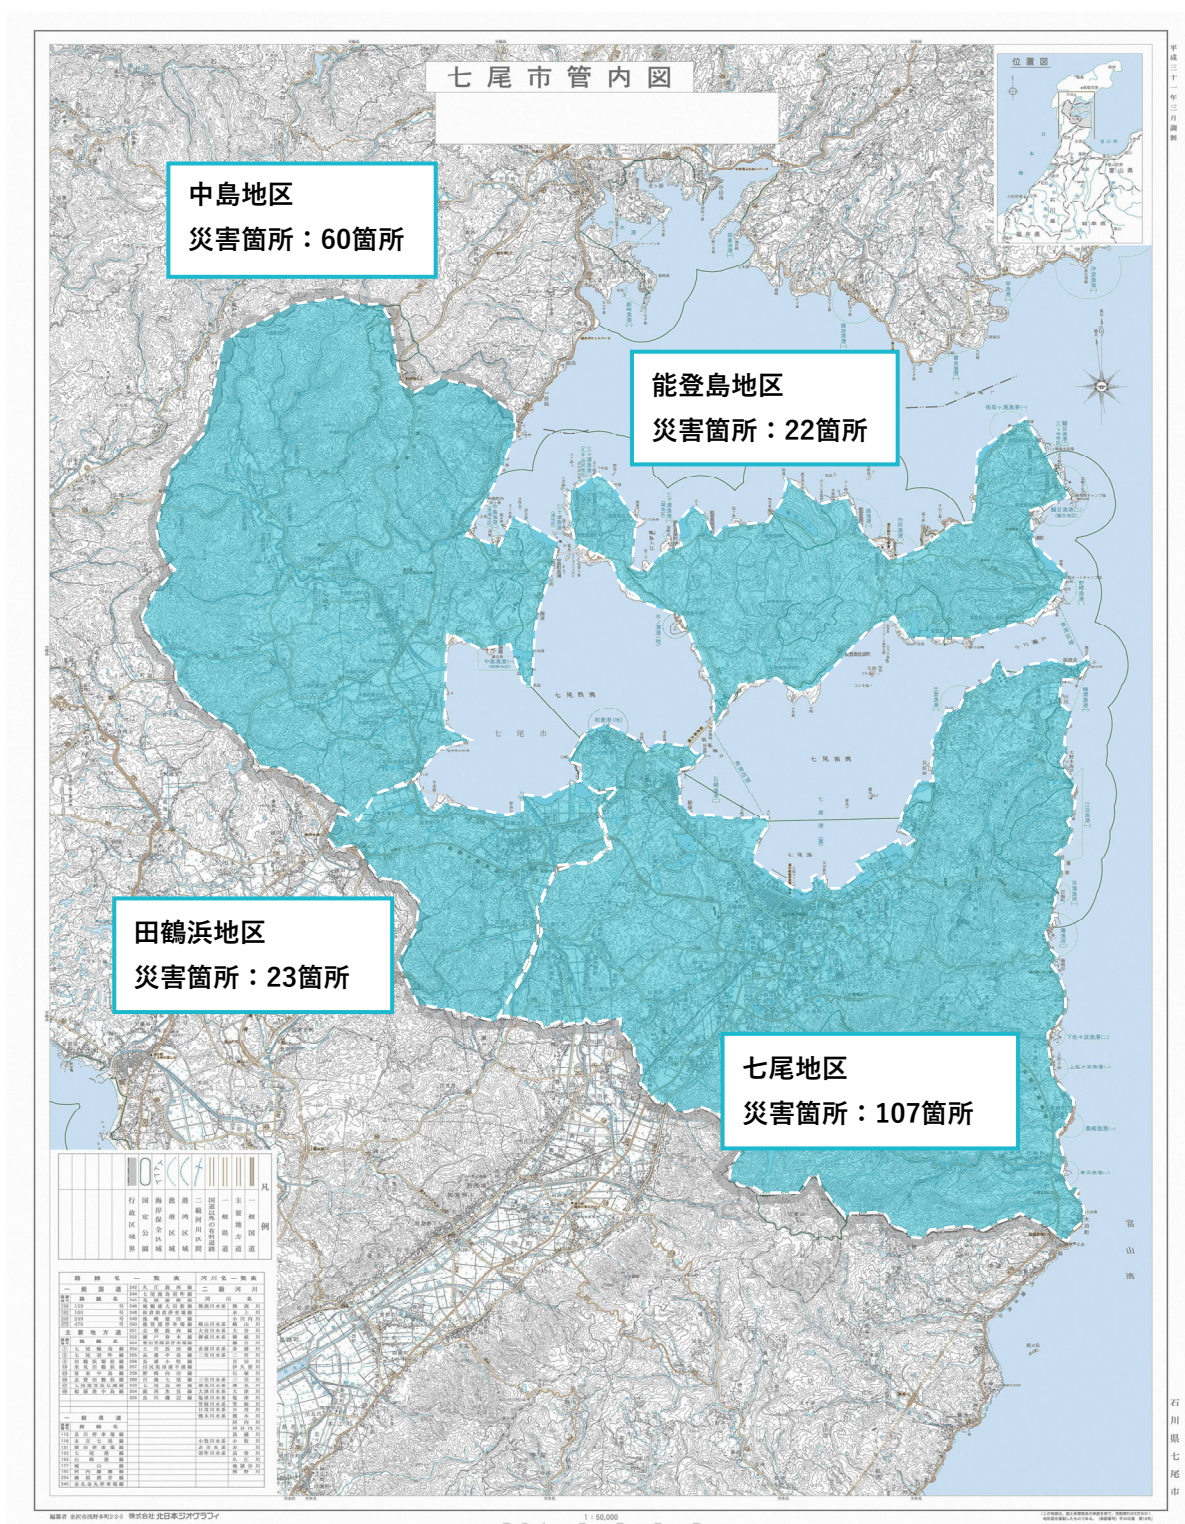

【位置図】 河川復旧

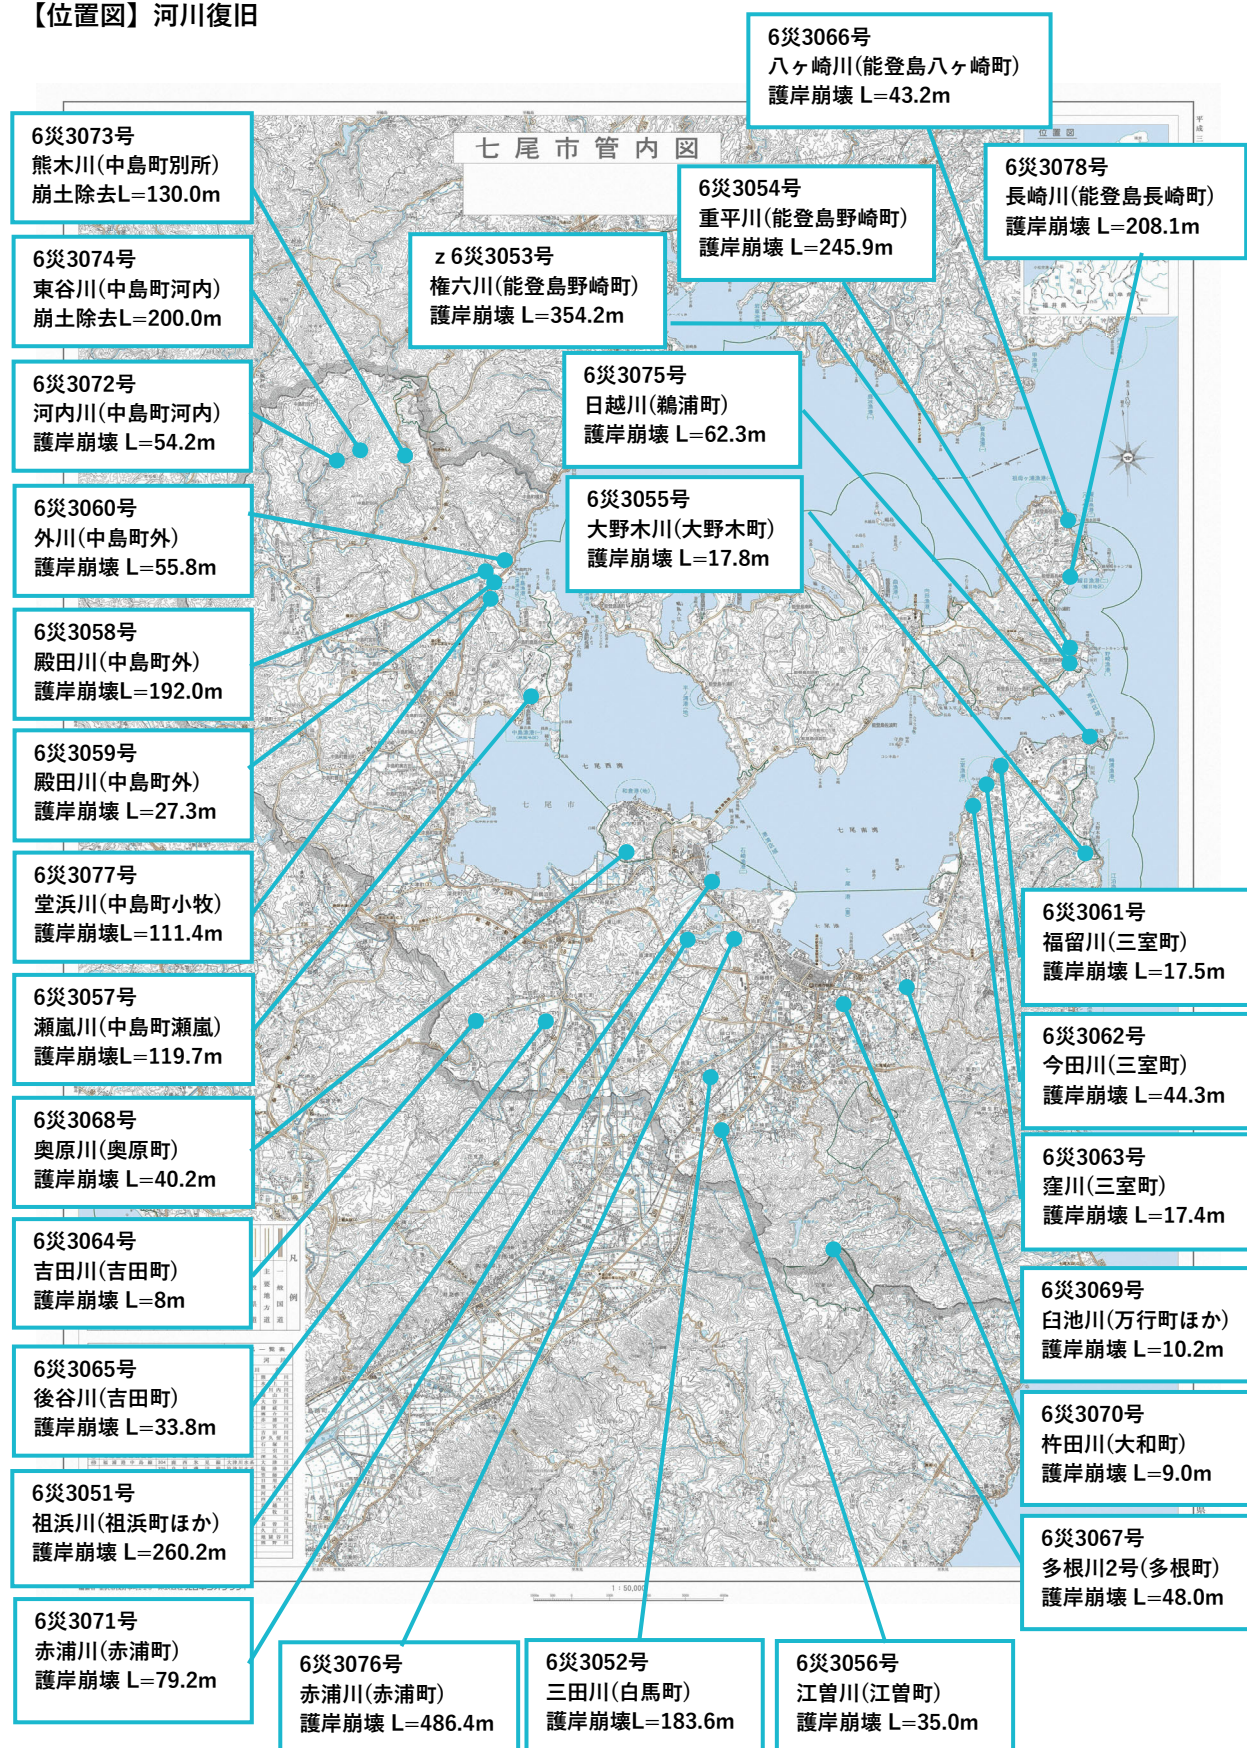

【位置図】 港湾・漁港等の復旧

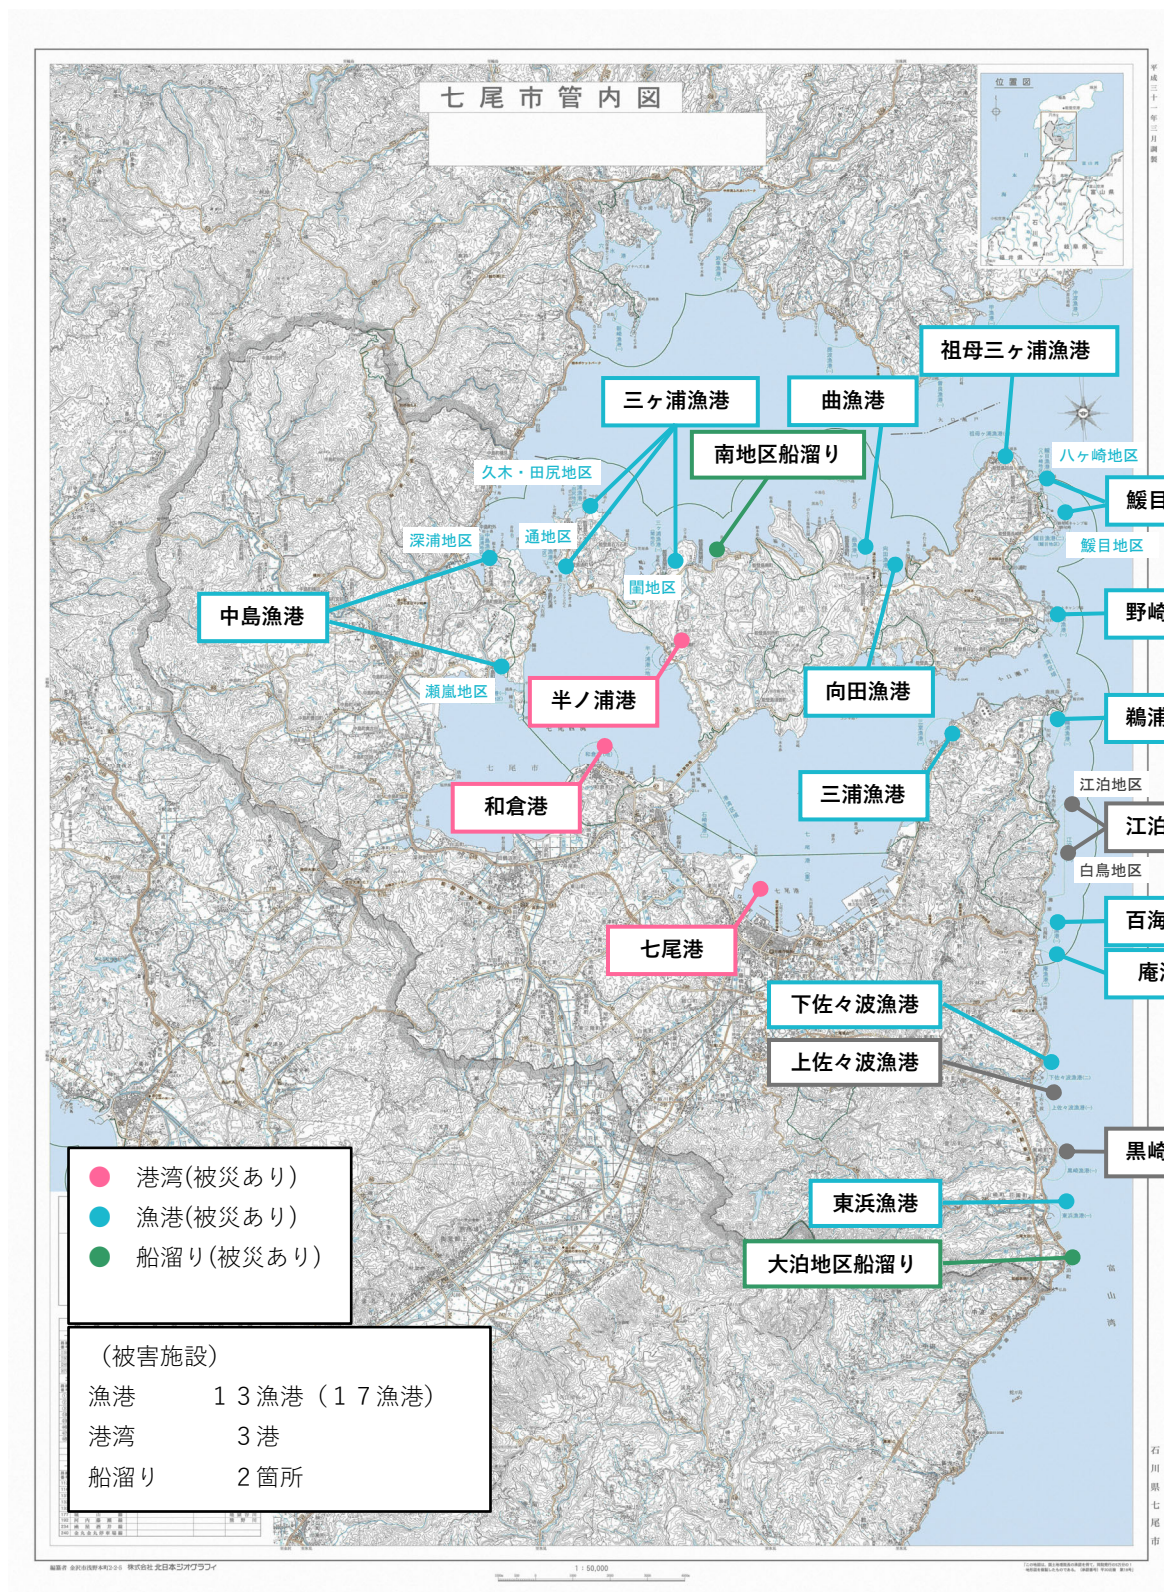

橋梁の復旧

【 担当課: 土木課 】

■ 橋梁の災害復旧

【事業名称】 橋梁復旧事業

【事業期間】 令和7年度～令和10年度

【事業内容】 被災した橋梁の安全確認や応急復旧を迅速に行い、通行機能を確保するとともに恒久的な復旧工事を推進する。

【事業概要】 被災橋梁の復旧 2 橋

【事業費】 330,000 千円

【復旧状況】 (代表的な復旧箇所)

従前



従後




【事業スケジュール】

種別	令和7年度		令和8年度		令和9年度		令和10年度		令和11年度以降	
橋梁	調査・設計	調査・設計	工事	工事	工事	工事	工事	完了予定	—	—

【進捗状況】

項目		進捗率			R7年度	
橋梁	復旧橋梁	0%			0	橋
	被災橋梁				2	橋

【位置図】

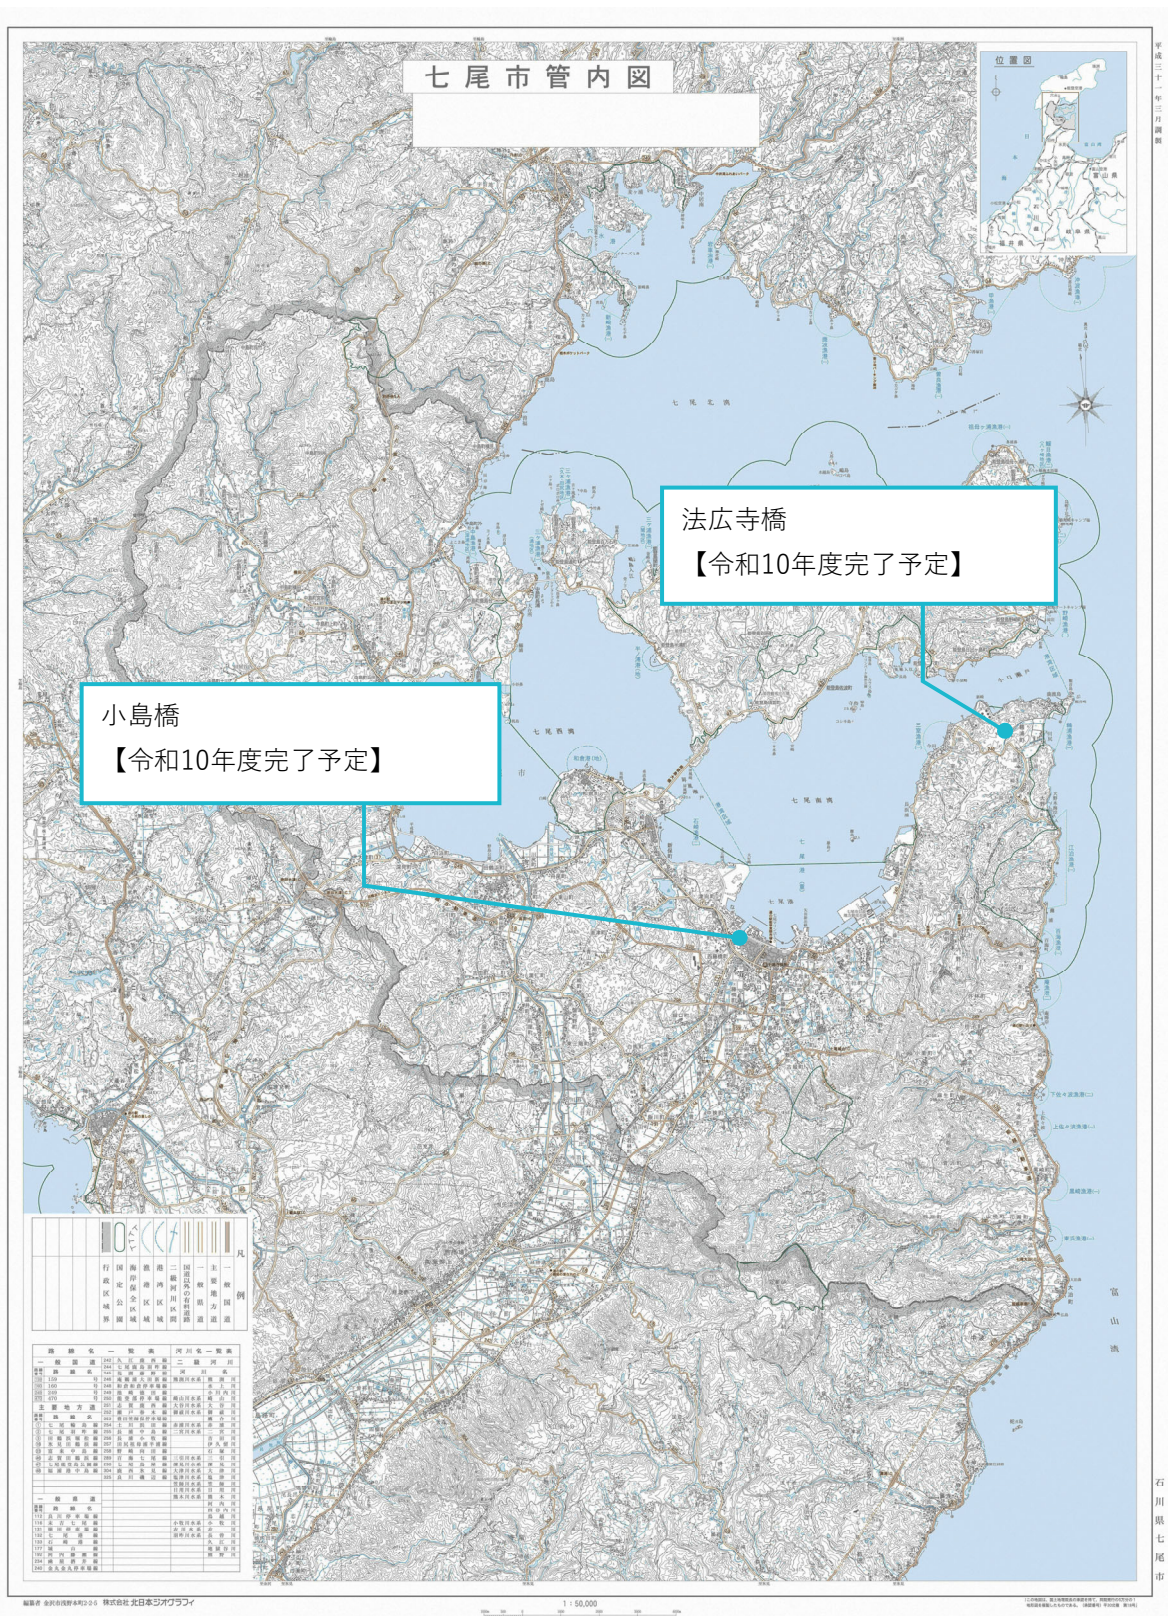

公園・緑地の災害復旧

【 担当課: 都市建築課 】

■ 主な公園・被災緑地の復旧

【事業名称】 都市災害復旧事業（御祓川緑地）	【事業期間】 令和6年度～令和6年度
都市災害復旧事業（和倉公園）	令和6年度～令和7年度
都市災害復旧事業（小丸山城址公園）	令和6年度～令和8年度
都市災害復旧事業（希望の丘公園）	令和6年度～令和8年度
都市災害復旧事業（香島1号緑地）	令和6年度～令和7年度
都市災害復旧事業（鯉ヶ浦緑地）	令和6年度～令和7年度

【事業内容】 被災した公園・緑地施設を復旧し、安全で安心して利用できる環境を復旧する。

【事業概要】 被災した公園・緑地の概要

御祓川緑地の復旧	20,826 千円	希望の丘公園の復旧	243,442 千円
和倉公園の復旧	8,433 千円	香島1号緑地の復旧	22,530 千円
小丸山城址公園の復旧	73,536 千円	鯉ヶ浦緑地の復旧	16,609 千円

【事業費】 385,376 千円

【復旧状況】 (代表的な復旧箇所) 御祓川緑地 時計塔

従前



従後



【事業スケジュール】

種別	令和 7 年度		令和 8 年度		令和 9 年度		令和 1 0 年度		令和 1 1 年度以降	
御祓川 緑地	完了済	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和倉公園	完了済	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小丸山 城址公園	工事	工事	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—
希望の丘 公園	工事	工事	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—
香島1号 緑地	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—	—	—
鯉ヶ浦 緑地	完了済	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【進捗状況】

項目		進捗率	R7年度	
御祓川 緑地	進捗額	100%	20,826	千円
	全体額		20,826	千円
和倉公園	進捗額	100%	8,433	千円
	全体額		8,433	千円
小丸山 城址公園	進捗額	10%	7,198	千円
	全体額		73,536	千円
希望の丘 公園	進捗額	11%	26,287	千円
	全体額		243,442	千円
香島1号 緑地	進捗額	0%	0	千円
	全体額		22,530	千円
鯉ヶ浦 緑地	進捗額	100%	16,609	千円
	全体額		16,609	千円

【位置図】

