

第4章 法面保護工事の概要

工事名 令和2年度 上町マンダラ古墳群法面保護工事
 工事箇所 七尾市中島町上町
 受注者 有限会社中村技研工業 代表取締役 中村 勇
 契約締結日 令和2年5月26日
 着手 令和2年5月26日 完成期限 令和2年9月18日
 完成日 令和2年9月17日 検査日 令和2年9月24日
 請負金額 3,990,800円

工事概要 施行延長 L=28m

掘削工 79.7 m³ 法面整形工 74.0 m² 植生工 92.1 m² かご工 74.0 m²

植生工は現場での条件を踏まえて以下の草本類を選定し、植生工で厚さ4~5cmに施工した。

草木類	ケンタッキーブルーグラス	草丈 30~40 cm	・寒地型であるが発芽適温が若干高め。 ・2~3年目以降に発育が旺盛になる。
	チューイングフェイクコンパス2	草丈 30~40 cm	・耐暑性、耐陰性に優れ、強健に生育する。
	バミューダグラス	草丈 10~20 cm	・暖地型草で、耐暑性、耐乾燥性に優れる。 ・生育適温は平均30℃前後
	メドハギ	草丈 60~100 cm	・硬質地、瘦せ地、乾燥地でもよく育成する。 ・肥料草として有効
	バースフットトレフォイル	草丈 30~50 cm	・土壤適応に優れ、法面緑化における肥料草として有効。

<道路土工一切土工・斜面安定工指針－平成21年度版より>



法面保護工事完了(2号墳側)



法面保護工事完了(南側)

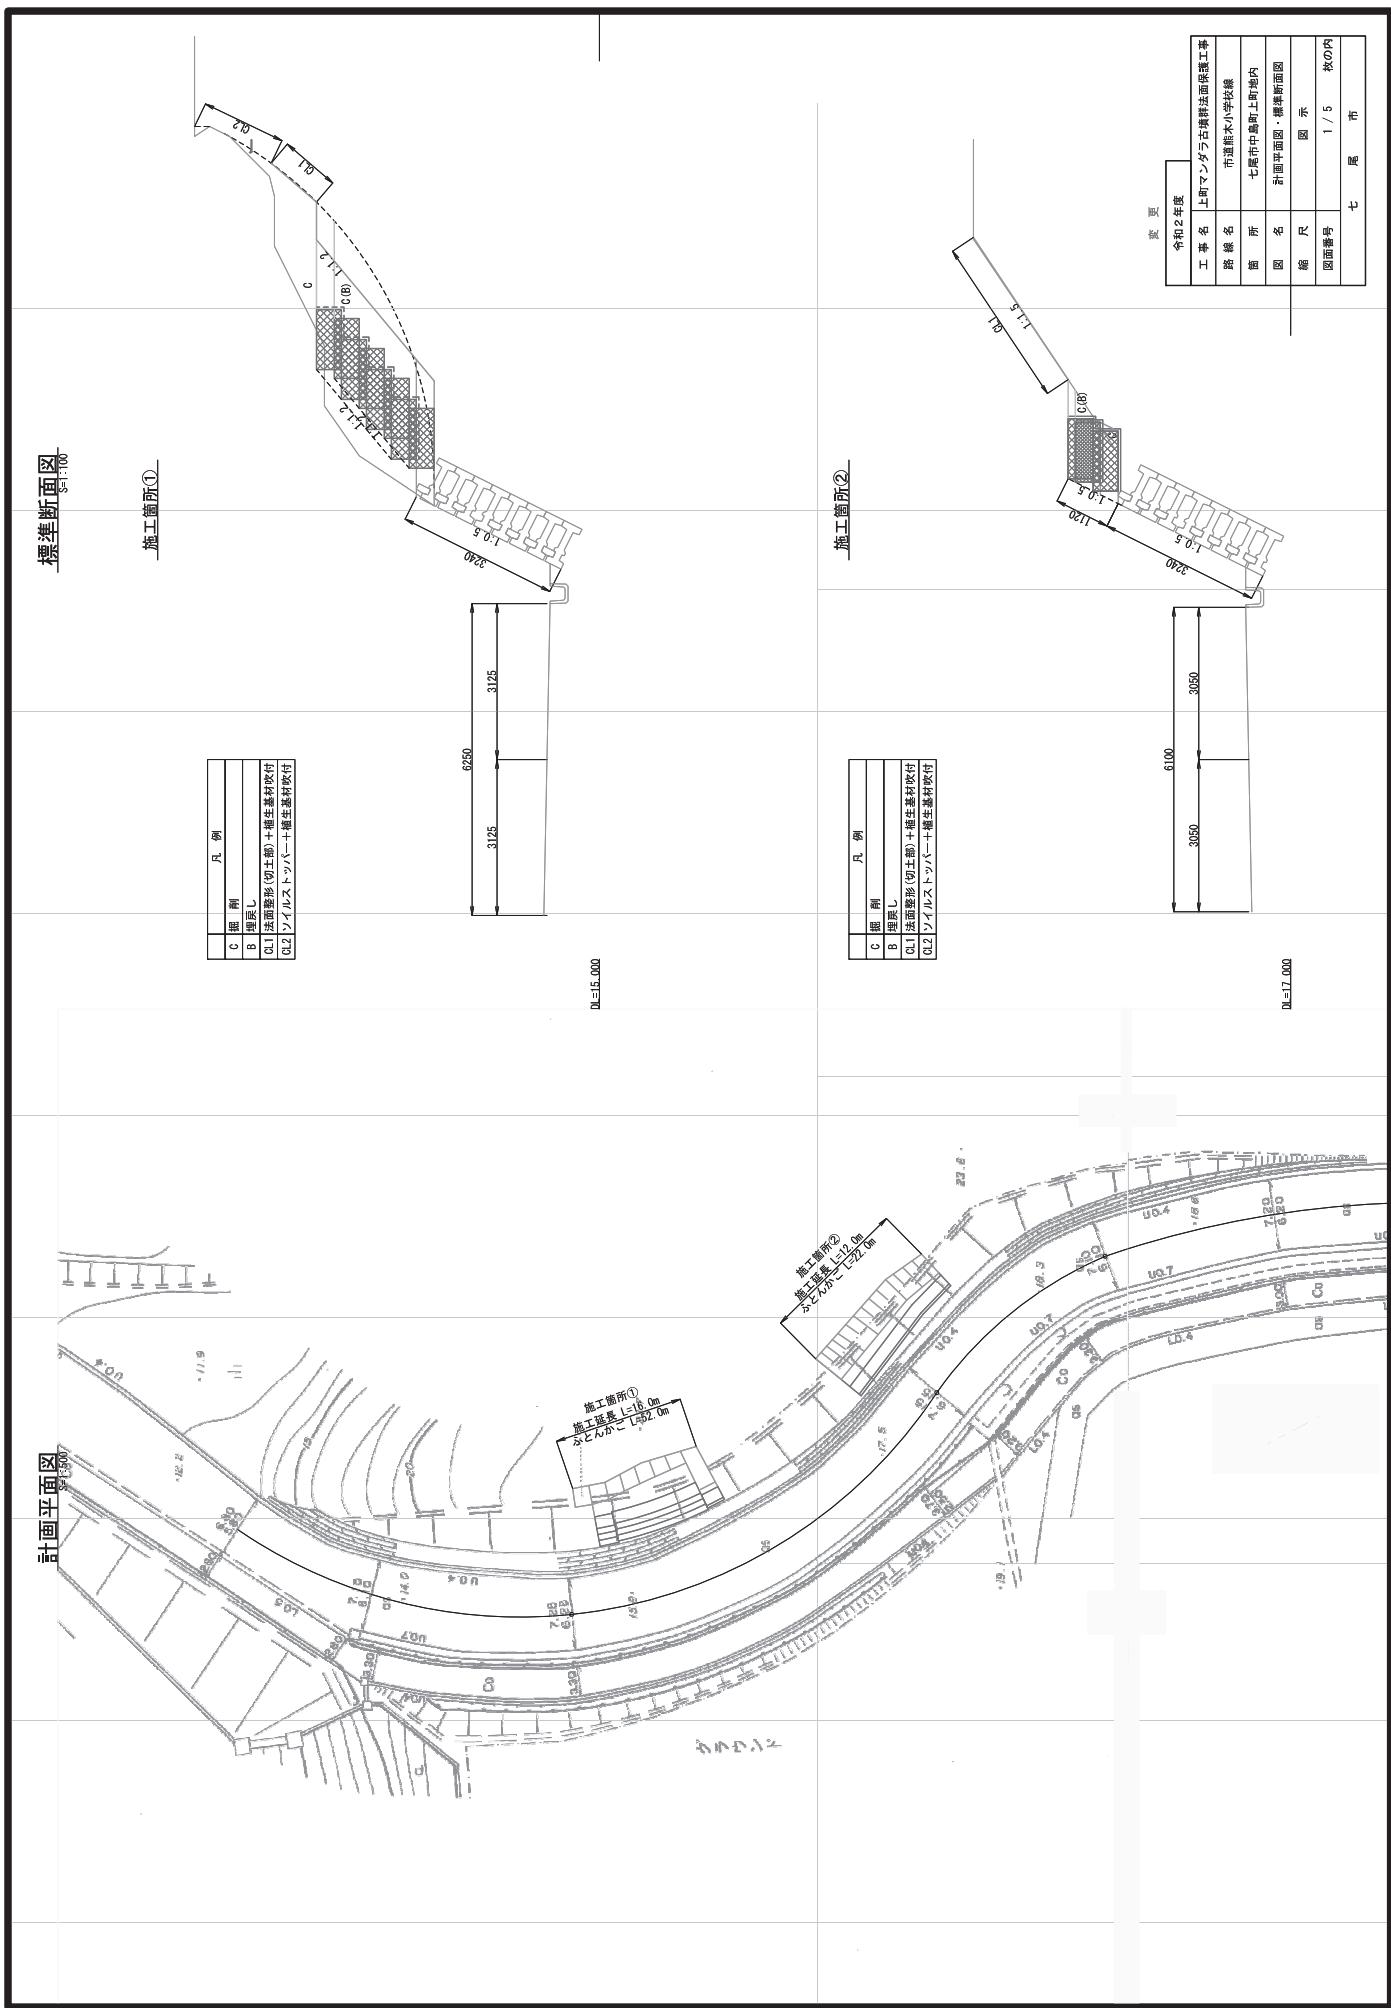


図7 計画平面図・標準断面図 (1:150)
