



# 七尾市

## 復興アクションプラン



## 目次

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 七尾市復興アクションプランの策定にあたって | 1 |
| 地区別復興構想との関連性について      | 2 |

### 1. 被災者一人ひとりに寄り添った生活再建プロジェクト

|                      |    |
|----------------------|----|
| ・災害公営住宅の建設（ハード）      | 4  |
| ・仮設住宅の再利用による安価な住宅の提供 | 8  |
| ・恒久的な住まいへの再建支援       | 9  |
| ・液状化など被災宅地の復旧促進      | 12 |
| ・専門家による生活再建相談の推進     | 13 |
| ・被災者の見守り体制づくり        | 15 |

### 2. 地域コミュニティ再生プロジェクト

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ・集会施設や地域コミュニティ施設の再建と機能強化（ハード・ソフト） | 16 |
| ・祭りや被災文化財の再建                      | 22 |
| ・祭りや伝統文化行事の開催支援                   | 23 |
| ・震災後のニーズを踏まえた公共交通網の構築             | 25 |
| ・空き家、空き地などの利活用の推進                 | 26 |

### 3. 震災の経験を生かしたインフラ強靱化プロジェクト

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ・防災機能の強化（ハード）                    | 27 |
| ・環境施設の復旧（ハード）                    | 31 |
| ・道路・河川・港湾・漁港などの復旧（ハード）           | 33 |
| ・橋梁の復旧（ハード）                      | 38 |
| ・公園・緑地の復旧（ハード）                   | 40 |
| ・水道施設の復旧（ハード）                    | 53 |
| ・下水道施設などの復旧（ハード）                 | 55 |
| ・消防施設の復旧（ハード）                    | 56 |
| ・能越自動車道田鶴浜七尾道路・国道159号七尾バイパスの整備促進 | 58 |
| ・七尾港の強靱化及び防災拠点化                  | 59 |
| ・避難所機能の強化                        | 60 |

#### **4. なりわい再建プロジェクト**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| ・農林業施設の復旧（ハード）          | 61 |
| ・再建を目指す事業者への支援          | 64 |
| ・商業、商店街の再建や賑わい創出への支援    | 66 |
| ・被災した農業用機械や施設の修理、再生整備支援 | 68 |
| ・能登ブランドの価値向上            | 70 |
| ・事業承継の推進                | 72 |
| ・持続可能な地域経済の復興           | 73 |

#### **5. 和倉温泉創造的復興プロジェクト**

|                    |    |
|--------------------|----|
| ・和倉温泉創造的復興プランの実現   | 74 |
| ・護岸の早期復旧によるまちなみの再生 | 76 |
| ・復興に向けた誘客の促進       | 77 |

#### **6. スポーツ・歴史文化で賑わい創出プロジェクト**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ・観光施設や観光資源、スポーツ拠点施設の早期復旧（ハード） | 78 |
| ・新たな合宿や体験型旅行の誘致               | 86 |
| ・スポーツイベントを活用した魅力づくりの推進        | 88 |
| ・能登演劇堂などの文化施設の活用促進            | 90 |
| ・周遊サイクリングロードの整備促進             | 92 |

#### **7. 未来を担うひとづくりプロジェクト**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ・学校施設の早期復旧（ハード）          | 93  |
| ・公園・緑地の機能強化（ハード）         | 97  |
| ・子どもの屋内遊び場の整備（ハード）       | 100 |
| ・被災した子どもたちの心のケア          | 102 |
| ・ICT環境を活用した情報活用能力の育成     | 103 |
| ・女性活躍、男女共同参画推進のための人材育成支援 | 104 |
| ・市内企業が求める人材の育成           | 105 |
| ・保育園留学やデュアルスクールなどの促進     | 106 |


|                      |     |
|----------------------|-----|
| 参考 地域との意見交換会でいただいた意見 | 107 |
|----------------------|-----|

# 七尾市復興アクションプランの策定にあたって

令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けた本市では、震災からの復興に向け、さらに魅力あるまちへ発展していくため、令和7年2月に「七尾市戦略的復興プラン」を策定しました。


復興のまちづくりの将来像として「すべての暮らしと営みに幸せを～みんなの笑顔が輝くまち～」を掲げて、市民一人ひとりが主体となり、市民と行政が力を結集し、創造的かつ戦略的復興に向けて多くの取組みを実施する必要があります。

これらの取組みの着実な推進に向けて、計画全体を先導していく役割を担う重点プロジェクトの取組み内容やスケジュールを住民の皆様と共有していくために「七尾市復興アクションプラン」を策定しました。なお、掲載している各取組みは、社会経済情勢の変化や復興の状況などを踏まえ、必要に応じて見直しを行っていきます。

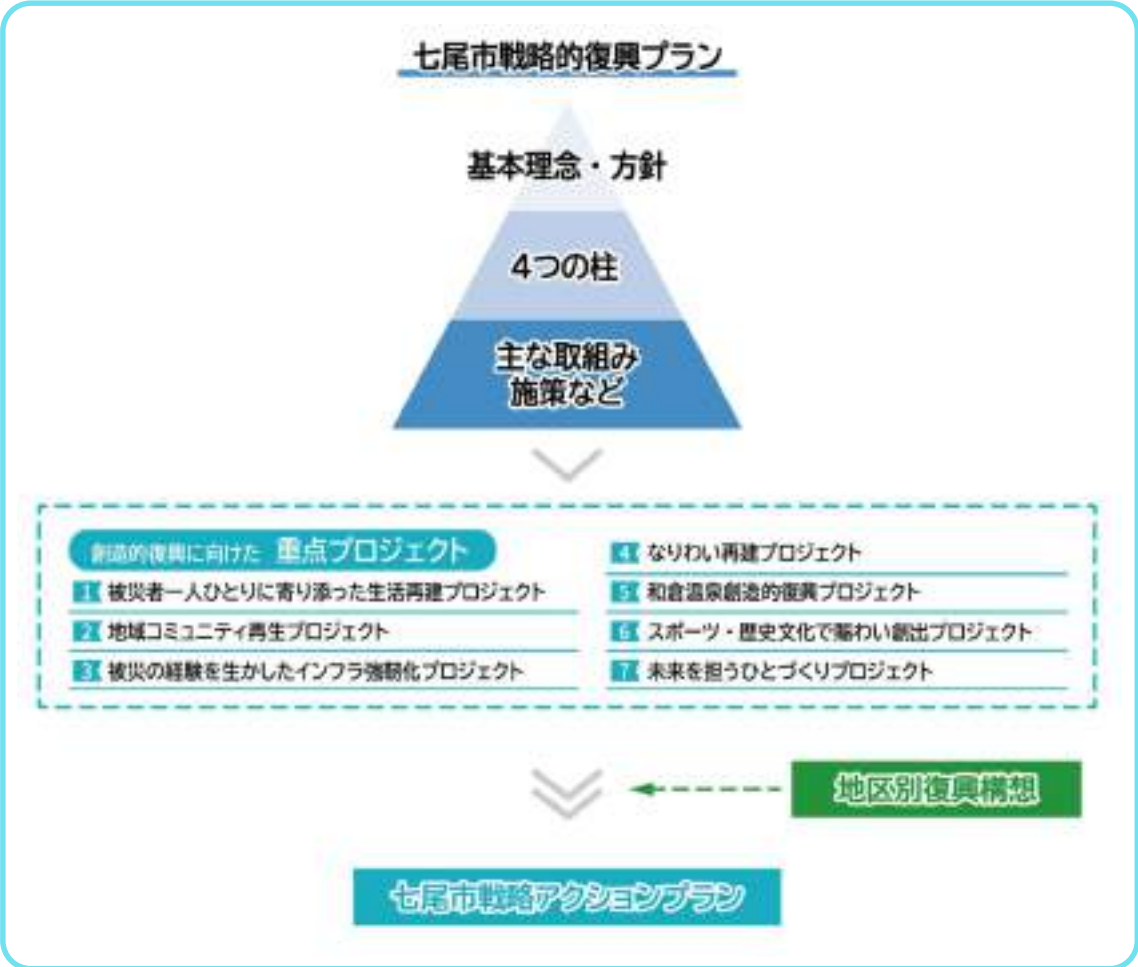

## 地区別復興構想との関連性について

市内の各地区では、それぞれの地域特性や被災状況に基づき、地区別の復興構想が策定されています。これらの構想は、地域の再生と発展を目指すものであり、七尾市復興アクションプランに反映されます。これにより、官民が一体となって連携し、創造的な復興を推進していきます。



今年度は、地区単位での復興を推進するため、課題や施策などについて地域づくり協議会と意見交換を実施しました。意見交換会では、「地域の現状と課題」「復興まちづくりの方針」「地域が重要と考える復興に向けた取り組み」に対して意見を伺いました。



### 七尾市戦略的復興プランに位置づけられる7つの重点プロジェクト



#### 重点プロジェクト1

被災者一人ひとりに寄り添った生活再建プロジェクト



#### 重点プロジェクト2

地域コミュニティ再生プロジェクト



#### 重点プロジェクト3

震災の経験を生かしたインフラ強靱化プロジェクト



#### 重点プロジェクト4

なりわい再建プロジェクト



#### 重点プロジェクト5

和倉温泉創造的復興プロジェクト



#### 重点プロジェクト6

スポーツ・歴史文化で賑わい創出プロジェクト



#### 重点プロジェクト7

未来を担うひとづくりプロジェクト





# 被災者一人ひとりに寄り添った 生活再建プロジェクト

【ハード事業】

## 災害公営住宅の建設

【 担当課: 都市建築課 】

### ■復興公営住宅の建設

【事業名称】復興公営住宅建設事業 【事業期間】 令和7年度～令和9年度

【事業内容】 災害で住宅を失い、自力での住宅再建が難しい被災世帯向けに、七尾市が整備して低廉な家賃で賃貸する公営住宅であり、被災世帯の恒久的な住まいの確保を支援するものとする。

【事業概要】復興公営住宅の整備計画、整備状況

|           |    |    |            |
|-----------|----|----|------------|
| 復興公営住宅の計画 | 14 | 団地 | (計 388 戸 ) |
| 復興公営住宅の建設 | 14 | 団地 | (計 388 戸 ) |

【事業費】 1,272,145 千円

【復旧状況】(代表的な箇所)



イメージ図



【事業スケジュール】


| 種別     | 令和7年度 |    | 令和8年度 |    | 令和9年度 |      | 令和10年度 |   | 令和11年度以降 |   |
|--------|-------|----|-------|----|-------|------|--------|---|----------|---|
| 復興公営住宅 | 調査・設計 | 工事 | 工事    | 工事 | 工事    | 完了予定 | —      | — | —        | — |

【進捗状況】


| 項目 |           | 進捗率 |  |  |  | R7年度 |    |
|----|-----------|-----|--|--|--|------|----|
| 計画 | 計画済戸数(団地) | 64% |  |  |  | 9    | 団地 |
|    | 予定戸数(団地)  |     |  |  |  | 14   | 団地 |
| 竣工 | 竣工戸数(団地)  | 0%  |  |  |  | 0    | 団地 |
|    | 予定戸数(団地)  |     |  |  |  | 14   | 団地 |

上記に示している整備予定戸数は、令和6年度から令和7年度にかけて実施した住まいの復興に関するアンケートの回答結果から、現時点で必要と推定される戸数であるため、引き続き意向調査を進めた上で、地区、整備予定戸数は変更する可能性がある。

【七尾地区】

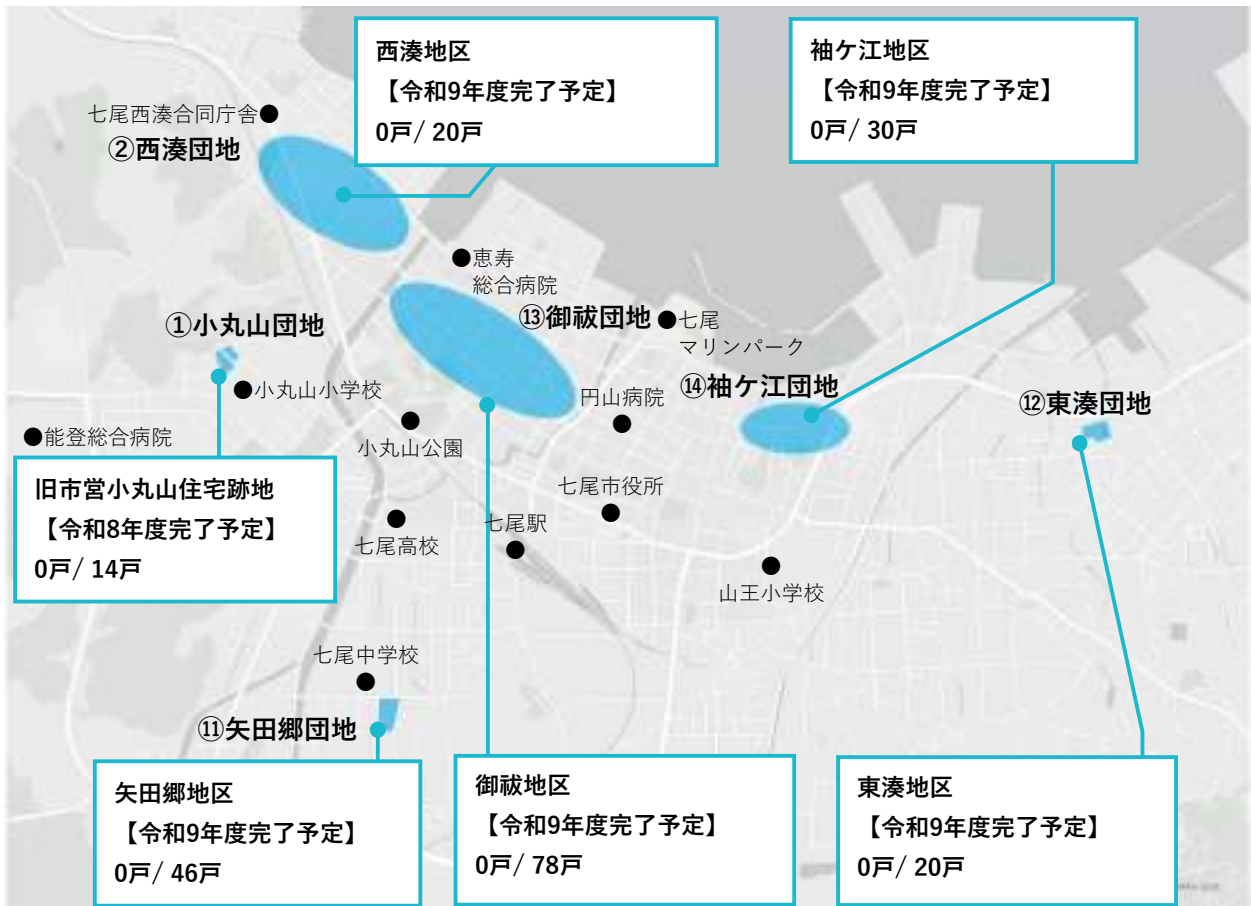

【中島地区】

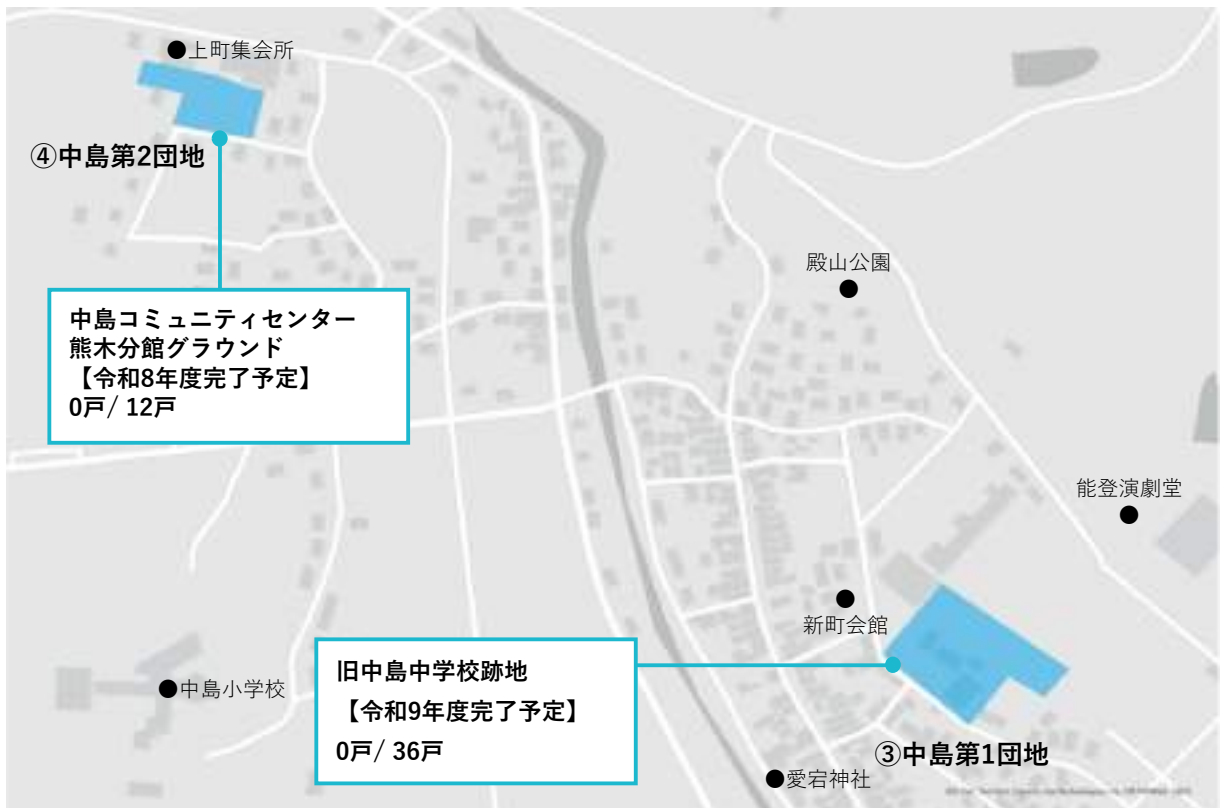

【能登島地区】



【田鶴浜地区】



【和倉・石崎地区】



# 1 被災者一人ひとりに寄り添った生活再建プロジェクト

## 仮設住宅の再利用による安価な住宅の提供

**【取組・施策】** 応急仮設住宅を解体・廃棄せずに転用・再利用することにより、新築に比べて建設コストを大幅に抑制することにより、被災者などの経済的負担を軽減しつつ、迅速かつ安定的な住居の確保を図る。

### ■ 応急仮設住宅再利用支援事業

**【担当課:** 都市建築課 **】**

**【事業内容】** 木造応急仮設住宅（集会所及び談話室を含む）を県から譲与を受け、市・町・自治会などが移設する際に必要な工事費などの経費を支援する。  
※現在、需要があるか調査中

**【事業期間】** 令和10年度～



|                 | 短期 | 中期 |    | 長期  |     |     |
|-----------------|----|----|----|-----|-----|-----|
|                 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| ① 応急仮設住宅再利用支援事業 |    |    |    | →   |     |     |
| (事業費：千円)        |    |    |    | 未定  | 未定  | 未定  |



# 被災者一人ひとりに寄り添った生活再建プロジェクト

## 恒久的な住まいへの再建支援

**【取組・施策】** 被災した住家の応急修理をはじめとする各種被災者支援を実施するとともに、応急仮設住宅などの一時的な住居に入居されている方が、恒久的な住まいへ円滑に移行できるよう、生活再建に向けた支援を行う。

### ■ 被災者生活再建支援事業

**【 担当課: 危機対策課 】**

**【事業内容】** 住宅に被害を受け、生活を再建するにあたり、被害の状況などに応じた定額の支援金を支給する。

**【事業期間】** 令和6年度～令和8年度

- ・最大300万円（全壊で新築又は購入は基礎支援金100万円、加算支援金200万円 ※単身世帯は、3/4で225万円）
- ・その他、半壊などの修繕又は賃貸借に対するの支援



### ■ 住まいの再建支援事業

**【 担当課: 都市建築課 】**

**【事業内容】** 住宅に被害を受け、半壊以上の判定を受けた世帯を対象に市内で住まいを建設・購入・修理した場合に対して支援する。（再建・購入：上限250万円、修理：上限125万円）

**【事業期間】** 令和7年度～令和9年度

| 再建方法  | 再建費用    | 支援額<br>(再建費用×10%) | 加算額(子育て世帯)<br>支援額×25% |
|-------|---------|-------------------|-----------------------|
| 新築・購入 | 500万円以上 | 上限200万円           | 上限50万円<br>(最大250万円)   |
| 修 繕   | 300万円以上 | 上限100万円           | 上限25万円<br>(最大125万円)   |

### ■ 住まいの復旧支援事業

**【 担当課: 都市建築課 】**

**【事業内容】** 被害を受けた住宅で準半壊若しくは一部損壊の判定を受けた世帯を対象に、日常生活に必要な不可欠な部分の復旧を支援する。（対象工事費の20%,上限額30万円）

**【事業期間】** 令和7年度～令和8年度

|      | ①全体工事費    | ②対象工事費    | ③応急修理<br>制度取戻額 | ④補助対象<br>工事費<br>(②-③) | ⑤補助金額<br>(④の20%)<br>※1000円未満四捨五入 |
|------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| 準半壊  | 700,000   | 500,000   | 343,000        | 157,000               | 31,000                           |
| 準半壊  | 1,843,000 | 1,843,000 | 343,000        | 1,500,000             | (上限)300,000                      |
| 一部損壊 | 500,000   | 500,000   | 0              | 500,000               | 100,000                          |
| 一部損壊 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0              | 1,500,000             | (上限)300,000                      |

※この額が150万円の場合に限度額になります。

## ■ 公営住宅入居助成事業

【事業内容】 被災者が公営住宅に入居する際の費用（コンロ・湯沸し器など）に対して一律10万円を支給する。

【担当課: 都市建築課】

【事業期間】 令和6年度～



## ■ 民間賃貸住宅入居助成事業

【事業内容】 被災者が民間賃貸住宅へ入居する際の契約初期費用（敷金・礼金など）に対して一律20万円を支給する。

【担当課: 都市建築課】

【事業期間】 令和6年度～



## ■ 転居費用助成事業

【事業内容】 被災者が仮設住宅などから自宅などへの転居する際の費用（一律10万円）を支援する。

【担当課: 都市建築課】

【事業期間】 令和6年度～



## ■ 被災住宅応急修理事業

【事業内容】 被害を受けた住宅に対し、日常生活に必要不可欠な部分の応急的な修理費を支援する。（半壊以上の場合70.6万円、準半壊34.3万円）

【担当課: 都市建築課】

【事業期間】 令和6年度～

### 費用の限度額（1世帯あたり）

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊：706,000円以内








準半壊：343,000円以内

※費用は市町から施工者に直接支払います。  
※限度額を超える部分は、自己負担となります。

### 期限

申請期限：令和8年9月30日

完了期限：当面、設定しない

|                       | 短期   | 中期        |         | 長期      |         |         |
|-----------------------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                       | R7   | R8        | R9      | R10     | R11     | R12     |
| ①被災者生活<br>再建支援事業      |     |           |         |         |         |         |
| (事業費：千円)              | 1,090,000  | 355,200   |         |         |         |         |
| ②住まいの<br>再建支援事業       |     |           |         |         |         |         |
| (事業費：千円)              | 1,450,500  | 335,000   | 271,500 |         |         |         |
| ③住まいの<br>復旧支援事業       |     |           |         |         |         |         |
| (事業費：千円)              | 1,230,000  | 542,100   |         |         |         |         |
| ④公営住宅<br>入居助成事業       |    |           |         |         |         |         |
| (事業費：千円)              | 4,100  | 4,000     | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 4,000   |
| ⑤民間賃貸<br>住宅入居助成<br>事業 |  |           |         |         |         |         |
| (事業費：千円)              | 33,000   | 33,000    | 33,000  | 33,000  | 33,000  | 33,000  |
| ⑥転居費用<br>助成事業         |  |           |         |         |         |         |
| (事業費：千円)              | 44,000   | 40,000    | 40,000  | 40,000  | 40,000  | 40,000  |
| ⑦被災住宅<br>応急修理事業       |  |           |         |         |         |         |
| (事業費：千円)              | 1,513,338  | 1,200,000 | 960,000 | 770,000 | 620,000 | 500,000 |



# 被災者一人ひとりに寄り添った生活再建プロジェクト

## 液状化など被災宅地の復旧促進

【取組・施策】 宅地被害に苦しむ被災者の負担を軽減し、早期の生活再建と地域の復興を図る。

### ■ 宅地復旧支援事業

【 担当課: 都市建築課 】

【事業内容】 被災した宅地の復旧工事などに要する経費の一部を支援する。  
(対象工事費から50万円を控除した額の5/6で上限額958.3万円)

【事業期間】 令和6年度～

### 被災した宅地の復旧を支援します

#### ■対象となる宅地

被害を受けた時点で住んでいた宅地で次のもの  
戸建て住宅、アパート・マンション、併用住宅のうちの住宅部分

次の建物は対象外です。

倉庫・納屋、店舗、事業所・事務所、工場、事業用倉庫、社宅・寮など、住宅と認められないもの

#### ■対象工事

復旧工事(原型復旧)  
のり面、擁壁、地盤の復旧工事

地盤改良工事  
液状化が発生した区域における再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事

|               | 短期        | 中期      |         | 長期  |     |     |
|---------------|-----------|---------|---------|-----|-----|-----|
|               | R7        | R8      | R9      | R10 | R11 | R12 |
| ①宅地復旧<br>支援事業 | ▶         |         |         |     |     |     |
| (事業費：千円)      | 1,118,473 | 900,000 | 750,000 | 未定  | 未定  | 未定  |



# 被災者一人ひとりに寄り添った生活再建プロジェクト

## 専門家による生活再建相談の推進

**【取組・施策】** 被災した住宅の応急修理や宅地被害の復旧支援などの様々な支援制度に係る相談をワンストップで対応するとともに、生活再建に向けた各種支援制度に関する相談、申請受付、情報提供などの充実を図る。

### ■ 被災者総合窓口運営事業

**【 担当課: 危機対策課 】**

**【事業内容】** 令和6年能登半島地震にかかる各種支援制度の総合窓口業務を行う。

**【事業期間】** 令和6年度～令和8年度

- ・住宅の応急修理制度
- ・住まいの復旧支援事業
- ・住まいの再建支援事業
- ・被災者生活再建支援金
- ・地域福祉推進支援臨時特例給付金
- ・能登半島地震支援制度コールセンター



### ■ 住まいの再建相談事業

**【 担当課: 都市建築課 】**

**【事業内容】** 住宅に大きな被害を受けた方を対象に建築士などの専門家が技術的な相談に応じる被災住宅相談会の開催について支援を行う。

**【事業期間】** 令和6年度～令和9年度






### ■ 情報発信事業

**【 担当課: 広報広聴課 】**

**【事業内容】** 市外避難者を対象に市の広報紙を郵送する。

**【事業期間】** 令和6年度～令和9年度



|                        | 短期  | 中期     |       | 長期  |     |     |
|------------------------|---|--------|-------|-----|-----|-----|
|                        | R7  | R8     | R9    | R10 | R11 | R12 |
| ①被災者総合<br>相談窓口運営<br>事業 |  |        |       |     |     |     |
| (事業費：千円)               | 21,413  | 11,521 |       |     |     |     |
| ②住まいの<br>再建相談事業        |  |        |       |     |     |     |
| (事業費：千円)               | 2,270   | 2,270  | 2,270 |     |     |     |
| ③情報発信<br>事業            |  |        |       |     |     |     |
| (事業費：千円)               | 397   | 397    | 397   |     |     |     |



# 被災者一人ひとりに寄り添った生活再建プロジェクト

## 被災者の見守り体制づくり

**【取組・施策】** 応急仮設住宅やみなし仮設住宅、在宅避難などの多様な生活環境において孤立することを防止し、心身の健康維持及び生活再建を主体的に取り組むことができるよう、切れ目のない伴走型支援を提供する。

### ■ 被災者見守り・相談支援など事業費

**【担当課:** 福祉課 **】**

**【事業内容】** 地震により被害を受けた方々が地域で安心して日常生活を送れるよう、心身の健康維持、生活再建に向けた相談、コミュニティ形成など、「心の復興」を含めた切れ目のない支援を総合的に行う。

**【事業期間】** 令和7年度～令和9年度



|                   | 短期     | 中期     |    | 長期  |     |     |
|-------------------|--------|--------|----|-----|-----|-----|
|                   | R7     | R8     | R9 | R10 | R11 | R12 |
| ①被災者見守り・相談支援など事業費 | ▶      |        |    |     |     |     |
| (事業費：千円)          | 45,448 | 87,827 | 未定 |     |     |     |

## 集会施設や地域コミュニティ施設の再建と機能強化

【担当課: 地域づくり支援課】

## ■ コミュニティ施設の災害復旧

【事業名称】 公共施設災害復旧事業

【事業期間】 令和7年度～令和9年度

【事業内容】 コミュニティセンター（本館11施設・分館7施設）および附属施設（2施設）の災害復旧工事を行い、地域活動拠点の機能回復により地域活性化を図る取組みとする。

|        |                      |      |
|--------|----------------------|------|
| 【事業概要】 | 西湊地区コミュニティセンターほか     | 6 箇所 |
|        | 和倉地区コミュニティセンターほか     | 7 箇所 |
|        | 中島地区コミュニティセンター鉦打分館ほか | 4 箇所 |
|        | 崎山地区コミュニティセンター       | 1 箇所 |
|        | 附属施設（南部体育館ほか）        | 2 箇所 |

【事業費】 1,289,000 千円

【復旧状況】（代表的な復旧箇所）

復旧前（袖ヶ江地区コミセン）



復旧後




## 【事業スケジュール】

| 種別                   | 令和7年度 |       | 令和8年度 |      | 令和9年度 |   | 令和10年度 |   | 令和11年度以降 |   |
|----------------------|-------|-------|-------|------|-------|---|--------|---|----------|---|
| 西湊地区コミュニティセンターほか     | 調査・設計 | 工事    | 完了予定  | —    | —     | — | —      | — | —        | — |
| 和倉地区コミュニティセンターほか     | 調査・設計 | 工事    | 工事    | 完了予定 | —     | — | —      | — | —        | — |
| 中島地区コミュニティセンター鉦打分館ほか | 調査・設計 | 調査・設計 | 工事    | 完了予定 | —     | — | —      | — | —        | — |
| 崎山地区コミュニティセンター       | 調査・設計 | 調査・設計 | 工事    | 工事   | 完了予定  | — | —      | — | —        | — |
| 附属施設（南部体育館ほか）        | 調査・設計 | 工事    | 工事    | 完了予定 | —     | — | —      | — | —        | — |


【進捗状況】

| 項目                       |       | 進捗率 | R7年度 |    |
|--------------------------|-------|-----|------|----|
| 西湊地区コミュニティ<br>センターほか     | 復旧施設数 | 17% | 1    | 箇所 |
|                          | 被災施設数 |     | 6    | 箇所 |
| 和倉地区コミュニティ<br>センターほか     | 復旧施設数 | 0%  | 0    | 箇所 |
|                          | 被災施設数 |     | 7    | 箇所 |
| 中島地区コミュニティ<br>センター鉦打分館ほか | 復旧施設数 | 0%  | 0    | 箇所 |
|                          | 被災施設数 |     | 4    | 箇所 |
| 崎山地区コミュニティ<br>センター       | 復旧施設数 | 0%  | 0    | 箇所 |
|                          | 被災施設数 |     | 1    | 箇所 |
| 附属施設（南部体育館<br>ほか）        | 復旧施設数 | 0%  | 0    | 箇所 |
|                          | 被災施設数 |     | 2    | 箇所 |

【位置図(令和7~8年度完了予定)】

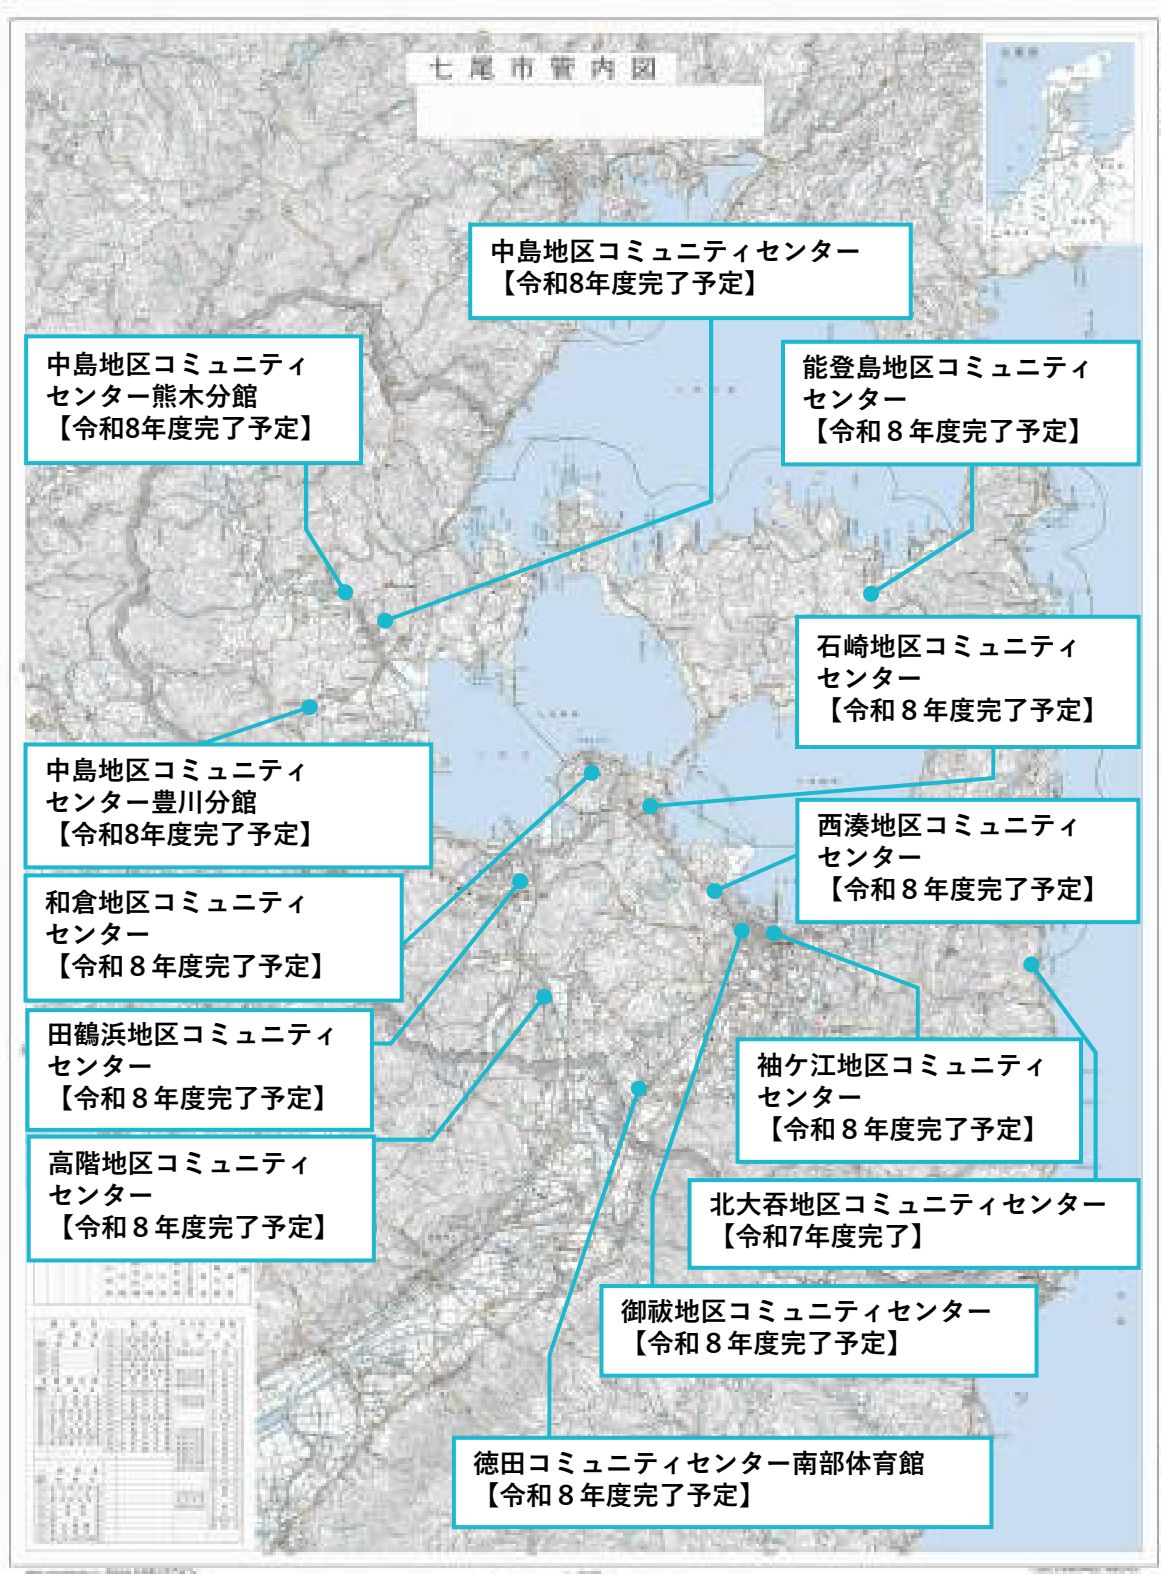

【位置図(令和8~9年度完了予定)】

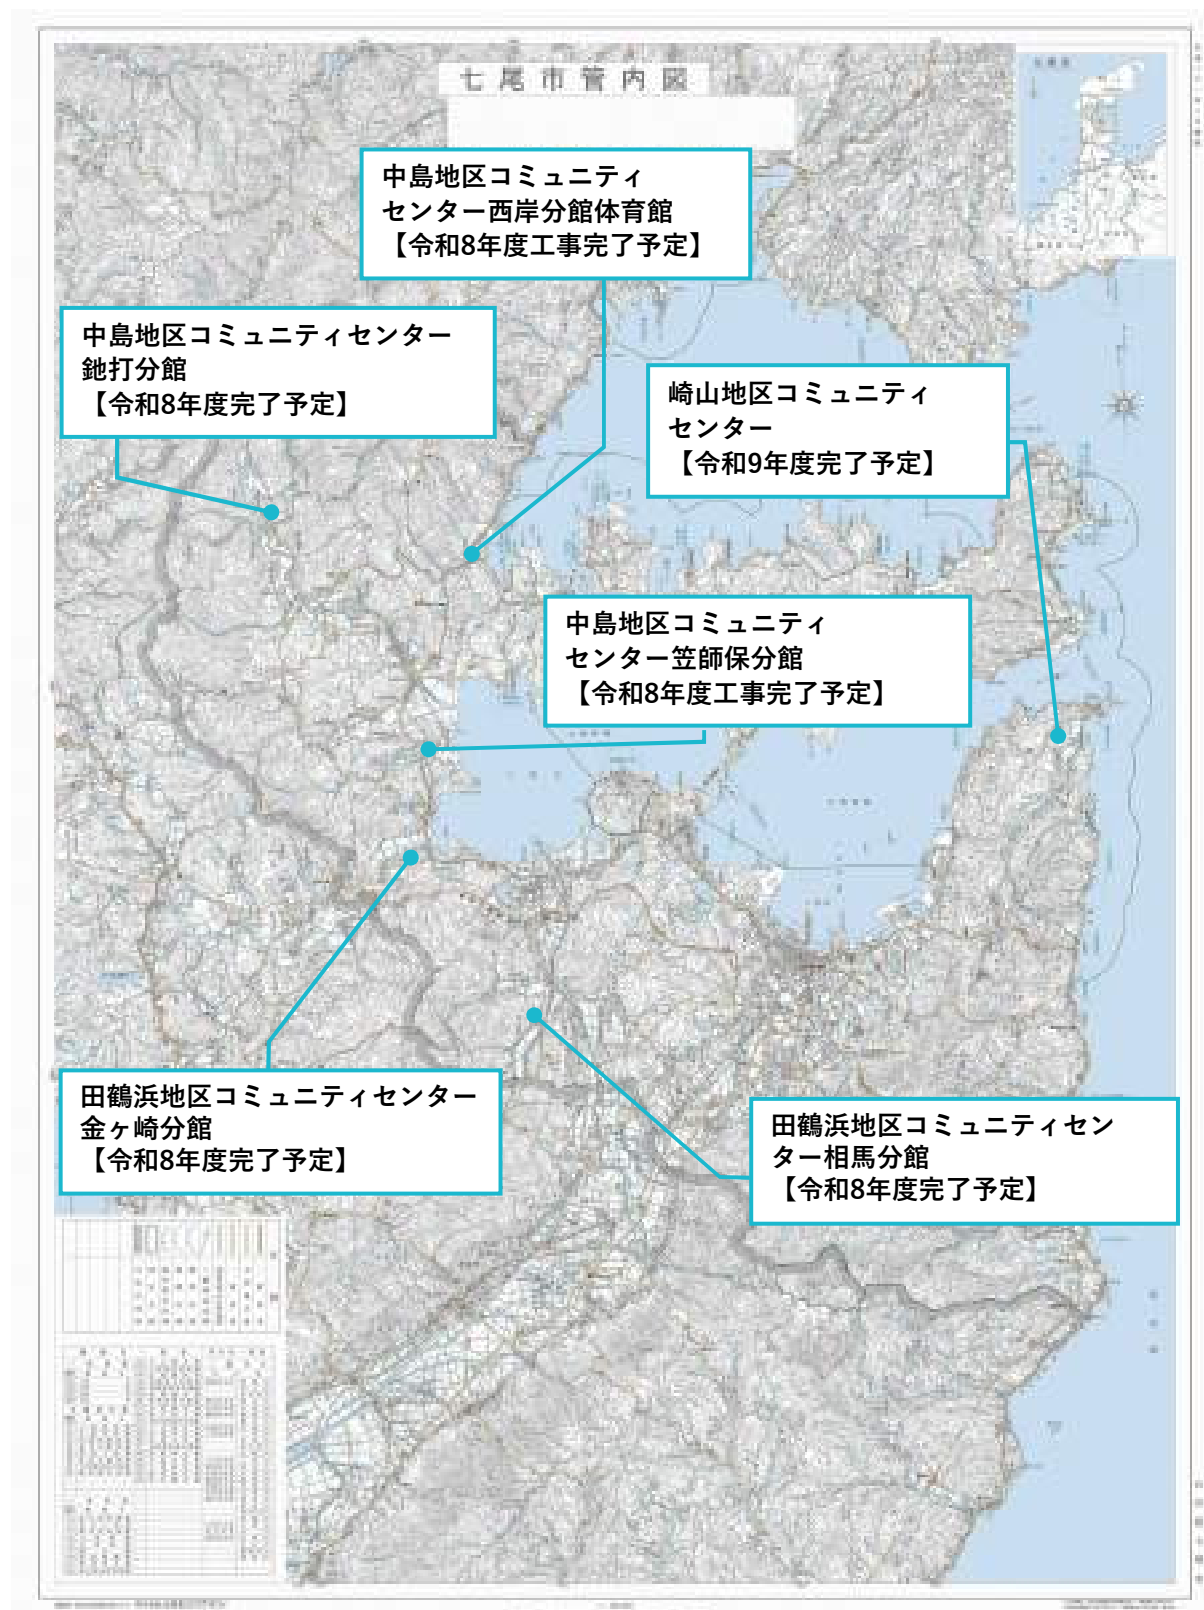

## 集会施設や地域コミュニティ施設の再建と機能強化

**【取組み・施策】** 地域コミュニティ形成のための拠点である集会施設や神社など震災の被害からの早期復旧に向けて、再建や改修などに要する費用負担の軽減を図る。

### ■ 地域コミュニティ施設など再建支援事業

**【 担当課: 地域づくり支援課 】**

**【事業内容】** 令和6年能登半島地震により被害を受けた地域コミュニティ施設などの建て替えや修繕事業に対する費用を補助する。  
補助金の額：補助対象経費の8分の7  
補助限度額：1施設につき1,400万円

**【事業期間】** 令和7年度～



### ■ 集会施設など再建支援事業

**【 担当課: 地域づくり支援課 】**

**【事業内容】** 令和6年能登半島地震により被災した集会施設の修繕に対する費用を補助する。  
補助金の額：補助対象経費の10分の10  
補助限度額：1施設につき100万円

**【事業期間】** 令和7年度～



### ■ 仮設住宅自治組織形成支援事業

**【 担当課: 地域づくり支援課 】**

**【事業内容】** 応急仮設住宅の住民が行う自治組織形成に資する活動に対する費用を補助する。  
補助の額：活動に要した実費額（自治組織などの活動に参加する応急仮設住宅入居世帯数に応じて上限あり）

**【事業期間】** 令和7年度～令和9年度



## ■ 震災復興ゆめ基金事業

【 担当課: 地域づくり支援課 】

**【事業内容】** 令和6年能登半島地震により被災した地域における復旧・復興及びコミュニティ活動を維持・促進する事業に対して補助を行う。  
補助金の額 上限500万円（年度）/1協議会

**【事業期間】** 令和7年度～令和10年度



|                     | 短期      | 中期      |        | 長期     |     |     |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|
|                     | R7      | R8      | R9     | R10    | R11 | R12 |
| ①地域コミュニティ施設など再建支援事業 | ▶       |         |        |        |     |     |
| (事業費：千円)            | 914,350 | 627,200 | 未定     | 未定     | 未定  | 未定  |
| ②集会施設など再建支援事業       | ▶       |         |        |        |     |     |
| (事業費：千円)            | 50,000  | 20,000  | 未定     | 未定     | 未定  | 未定  |
| ③仮設住宅自治組織形成支援事業     | ▶       |         |        |        |     |     |
| (事業費：千円)            | 1,450   | 1,450   | 1,450  |        |     |     |
| ④震災復興ゆめ基金事業         | ▶       |         |        |        |     |     |
| (事業費：千円)            | 75,000  | 75,000  | 75,000 | 75,000 |     |     |

## 祭りや被災文化財の再建

**【取組・施策】** 地域文化の継承に資する文化財などについて、震災による被害からの早期復旧を図るために、再建または修繕に要する経費の負担軽減を図る。

## ■ 文化財の保存事業など補助金

**【担当課:** スポーツ・文化課 **】**

**【事業内容】** 地震で被害にあった市内の文化財などの再建や修繕などに要する経費の一部を補助する。  
※都度、申請のあった国、県、市の指定文化財や登録文化財については補正予算で対応

**【事業期間】** 令和7年度～令和14年度



|                  | 短期  | 中期  |     | 長期   |      |      |
|------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
|                  | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
| ①指定文化財の保存事業など補助金 |     |     |     |      |      |      |
| (事業費：千円)         | 172 | 667 | 未定  | 未定   | 未定   | 未定   |

## 祭りや伝統文化行事の開催支援

**【取組・施策】** 地域固有の文化であり、地域の魅力向上、郷土愛の醸成、および住民相互の連帯感の強化に資する市内4大祭りを中心とする地域の祭礼などについて、観光客の受入やPRを支援することで、地域の活力を回復させ、コミュニティの再生を図る。

### ■ 青柏祭でか山開催支援事業

**【事業内容】** 青柏祭の曳山行事【ユネスコ無形文化遺産・国指定重要無形民俗文化財】の開催に伴う観光客受け入れ及びPRに対する支援を行う。

**【担当課:** 交流推進課 **】**

**【事業期間】** 令和7年度～



### ■ 石崎奉燈祭開催支援事業

**【事業内容】** 石崎奉燈祭【能登半島を代表するキリコ祭り】の開催に伴う観光客受け入れ及びPRに対する支援を行う。

**【担当課:** 交流推進課 **】**

**【事業期間】** 令和6年度～



### ■ 能登島向田の火祭開催支援事業

**【事業内容】** 能登島向田の火祭【日本三大火祭り】の開催に伴う観光客受け入れ及びPRに対する支援を行う。

**【担当課:** 交流推進課 **】**

**【事業期間】** 令和6年度～



## ■ お熊甲祭開催支援事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 お熊甲祭の杵旗行事【国指定重要無形民俗文化財】の開催に伴う観光客受け入れ及びPRに対する支援を行う。

【事業期間】 令和6年度～



|                 | 短期                            | 中期     |        | 長期     |        |        |
|-----------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | R7                            | R8     | R9     | R10    | R11    | R12    |
| ①青柏祭でか山開催支援事業   | [Progress bar from R7 to R12] |        |        |        |        |        |
| (事業費：千円)        | 11,699                        | 11,677 | 11,677 | 11,677 | 11,677 | 11,677 |
| ②石崎奉燈祭開催支援事業    | [Progress bar from R7 to R12] |        |        |        |        |        |
| (事業費：千円)        | 2,656                         | 2,656  | 2,656  | 2,656  | 2,656  | 2,656  |
| ③能登島向田の火祭開催支援事業 | [Progress bar from R7 to R12] |        |        |        |        |        |
| (事業費：千円)        | 1,130                         | 1,130  | 1,130  | 1,130  | 1,130  | 1,130  |
| ④お熊甲祭開催支援事業     | [Progress bar from R7 to R12] |        |        |        |        |        |
| (事業費：千円)        | 958                           | 958    | 958    | 958    | 958    | 958    |

## 震災後のニーズを踏まえた公共交通網の構築

【取組・施策】 災害からの復旧・復興フェーズに応じて住民の移動ニーズに対応し、将来にわたる持続可能な地域公共交通体系を確立するための取組みを構築する。

## ■ 地域主体デマンド型乗合タクシー推進事業

【 担当課: 企画政策課 】

【事業内容】 交通空白地域や交通不便地域の「移動の足」を確保するため、地域住民が主体となって企画・運営する、予約制の交通サービスの取組みに対する支援を行う。

【事業期間】 令和6年度～



## ■ オンデマンド型地域公共交通システム構築事業

【 担当課: 企画政策課 】

【事業内容】 利用者にとっての利便性向上だけでなく、運行事業者にとっては効率化とコスト削減、そして地域全体にとっては持続可能な交通ネットワークを構築する。

【事業期間】 令和7年度～



|                        | 短期    | 中期    |       | 長期    |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        | R7    | R8    | R9    | R10   | R11   | R12   |
| ①地域主体デマンド型乗合タクシー推進事業   | ▶     |       |       |       |       |       |
| (事業費：千円)               | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ②オンデマンド型地域公共交通システム構築事業 | ▶     |       |       |       |       |       |
| (事業費：千円)               | 未定    | 未定    | 未定    | 未定    | 未定    | 未定    |

## 2

# 地域コミュニティ再生プロジェクト

## 空き家、空き地などの利活用の推進

**【取組・施策】** 空き家、空き地を「災害からの克服」と「新たな地域づくり」を牽引する地域資源として最大限に活用し、安全で活力あるまちの早期再建を目指します。

### ■ 空き家バンク運営事業

**【 担当課:** 都市建築課 **】**

**【事業内容】** 移住を希望される方や、市内で住まいを探している方に、空き家、空き地の情報を提供することで、定住の促進に繋げる。

**【事業期間】** 令和6年度～



### ■ 空き家リフォーム支援事業補助金

**【 担当課:** 都市建築課 **】**

**【事業内容】** 空き家バンクを利用し、売買または賃貸借した際に、空き家の改修費用に対する費用を補助する。

**【事業期間】** 令和6年度～



|                  | 短期                            | 中期    |       | 長期    |       |       |
|------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  | R7                            | R8    | R9    | R10   | R11   | R12   |
| ①空き家バンク事業        | [Progress bar from R7 to R12] |       |       |       |       |       |
| (事業費：千円)         | 600                           | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   |
| ②空き家リフォーム支援事業補助金 | [Progress bar from R7 to R12] |       |       |       |       |       |
| (事業費：千円)         | 3,000                         | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |



## 震災の経験を生かしたインフラ強靱化プロジェクト

【ハード事業】

### 防災機能の強化

【 担当課: 危機対策課 】

#### ■ 防災備蓄倉庫の整備

【事業名称】 防災備蓄倉庫の整備 【事業期間】 令和8年度～令和9年度

【事業内容】 市内の各地区に防災備蓄倉庫を整備し、災害時に必要な食料・水・救急用品などを迅速に供給できる体制を確保する。

【事業概要】 防災備蓄倉庫 20 箇所

【事業費】 143,954 千円

【復旧状況】 (代表的な復旧箇所)

イメージ図




#### 【事業スケジュール】

| 種別     | 令和7年度 |   | 令和8年度 |    | 令和9年度 |    | 令和10年度 |   | 令和11年度以降 |   |
|--------|-------|---|-------|----|-------|----|--------|---|----------|---|
| 防災備蓄倉庫 | —     | — | 調査・設計 | 工事 | 調査・設計 | 工事 | —      | — | —        | — |

#### 【進捗状況】

| 項目     |         | 進捗率 | R7年度 |    |
|--------|---------|-----|------|----|
| 防災備蓄倉庫 | 整備済箇所数  | 0%  | 0    | 箇所 |
|        | 整備予定箇所数 |     | 20   | 箇所 |

【位置図】

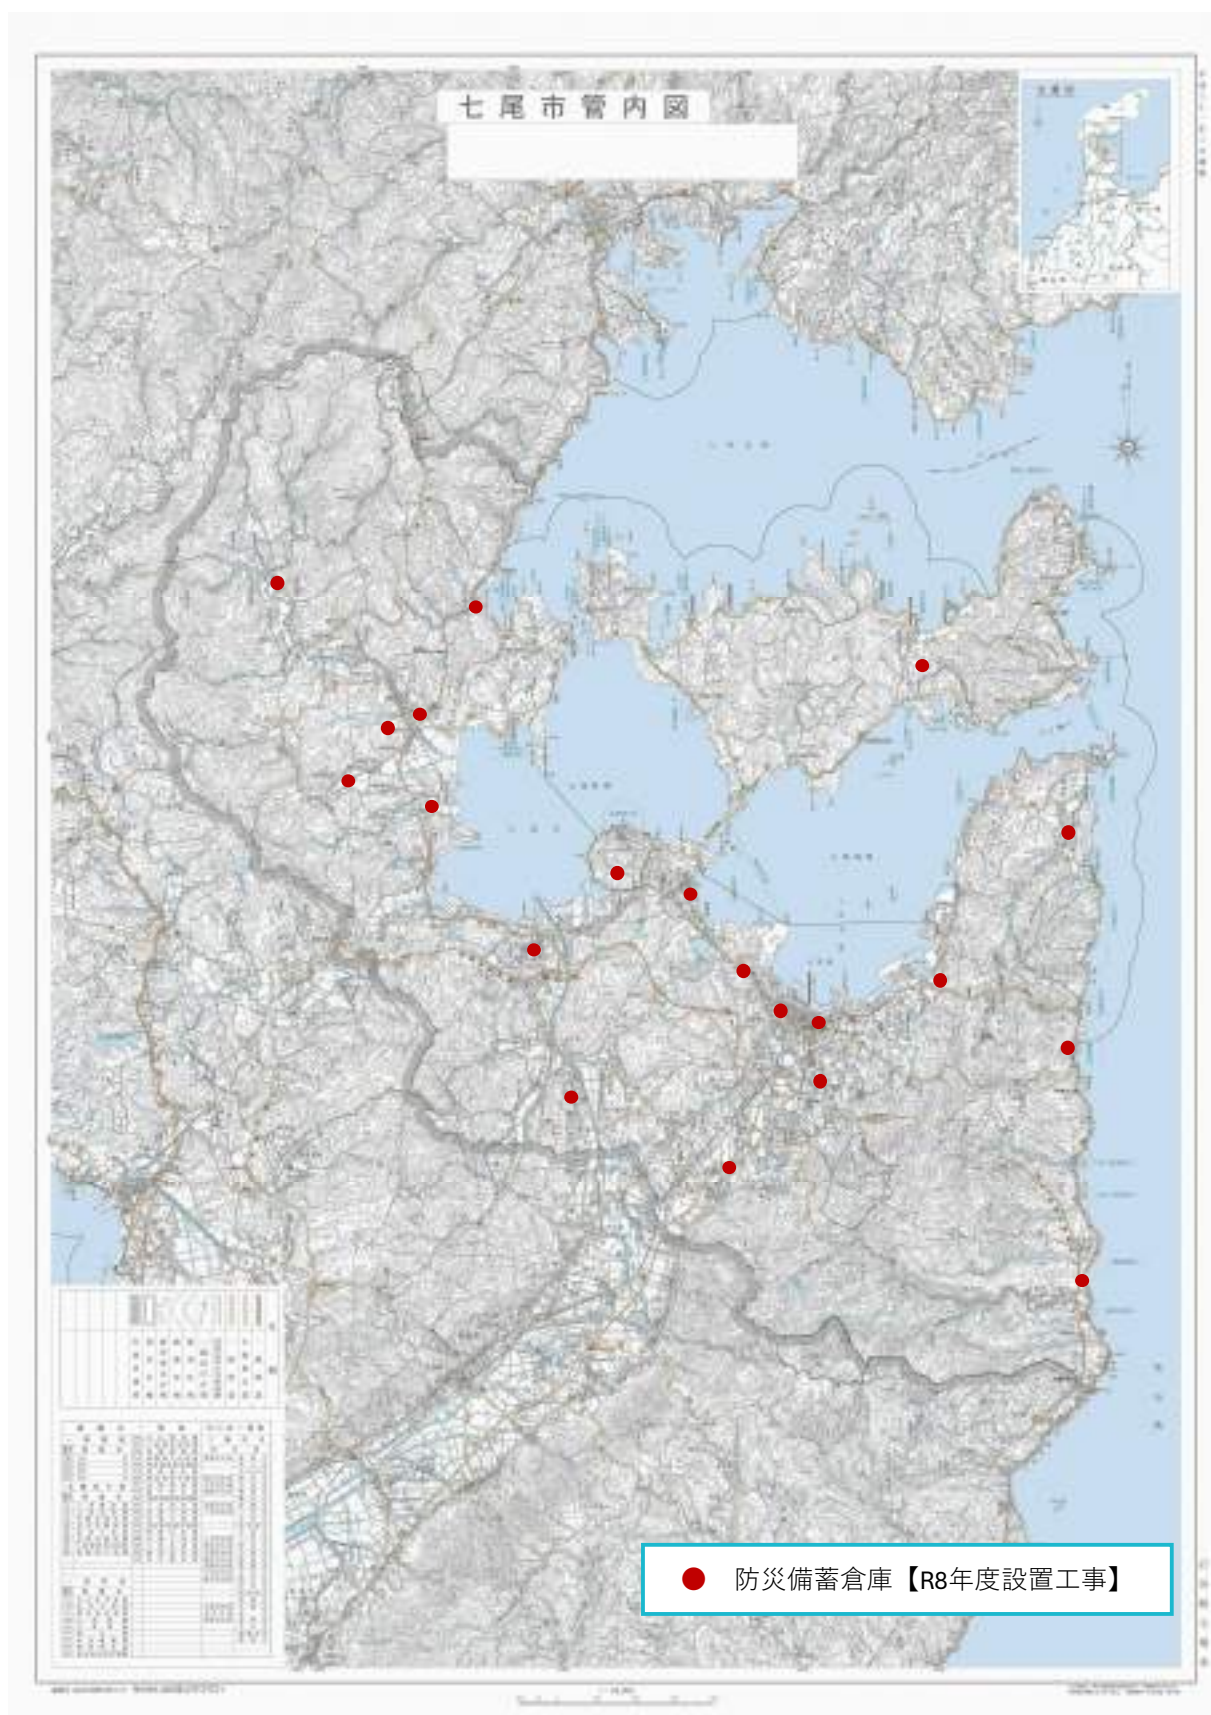



# 震災の経験を生かしたインフラ強靱化プロジェクト

【ハード事業】

## 防災機能の強化

【 担当課: 危機対策課 】

### ■ 緊急情報告知システムの整備

【事業名称】 緊急防災情報告知システムの整備      【事業期間】 令和7年度～令和8年度


【事業内容】 災害時に避難指示や避難所情報などを迅速・確実に伝達するため、デジタル同報系防災行政無線(※)や市民向け防災アプリケーションなどを整備する。

※従来の「アナログ方式」の防災行政無線をデジタル技術を用いて高機能化したシステムのこと

【事業概要】 緊急情報告知システム

【事業費】 2,117,924 千円

【復旧状況】 (代表的な復旧箇所)

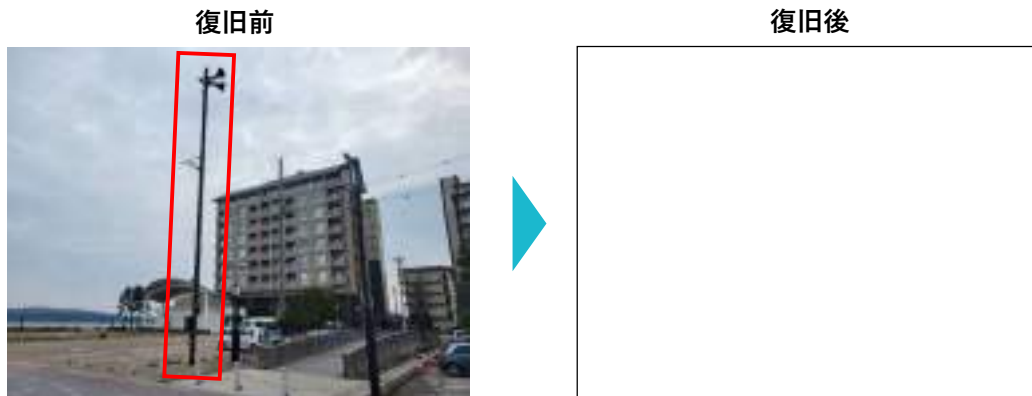


### 【事業スケジュール】

| 種別         | 令和7年度 |    | 令和8年度 |      | 令和9年度 |   | 令和10年度 |   | 令和11年度以降 |   |
|------------|-------|----|-------|------|-------|---|--------|---|----------|---|
| 緊急情報告知システム | 調査・設計 | 工事 | 工事    | 完了予定 | —     | — | —      | — | —        | — |

### 【進捗状況】

| 項目         |     | 進捗率 |  |  |  | R7年度      |    |
|------------|-----|-----|--|--|--|-----------|----|
| 緊急情報告知システム | 進捗額 | 18% |  |  |  | 385,038   | 千円 |
|            | 全体額 |     |  |  |  | 2,117,924 | 千円 |

【位置図】

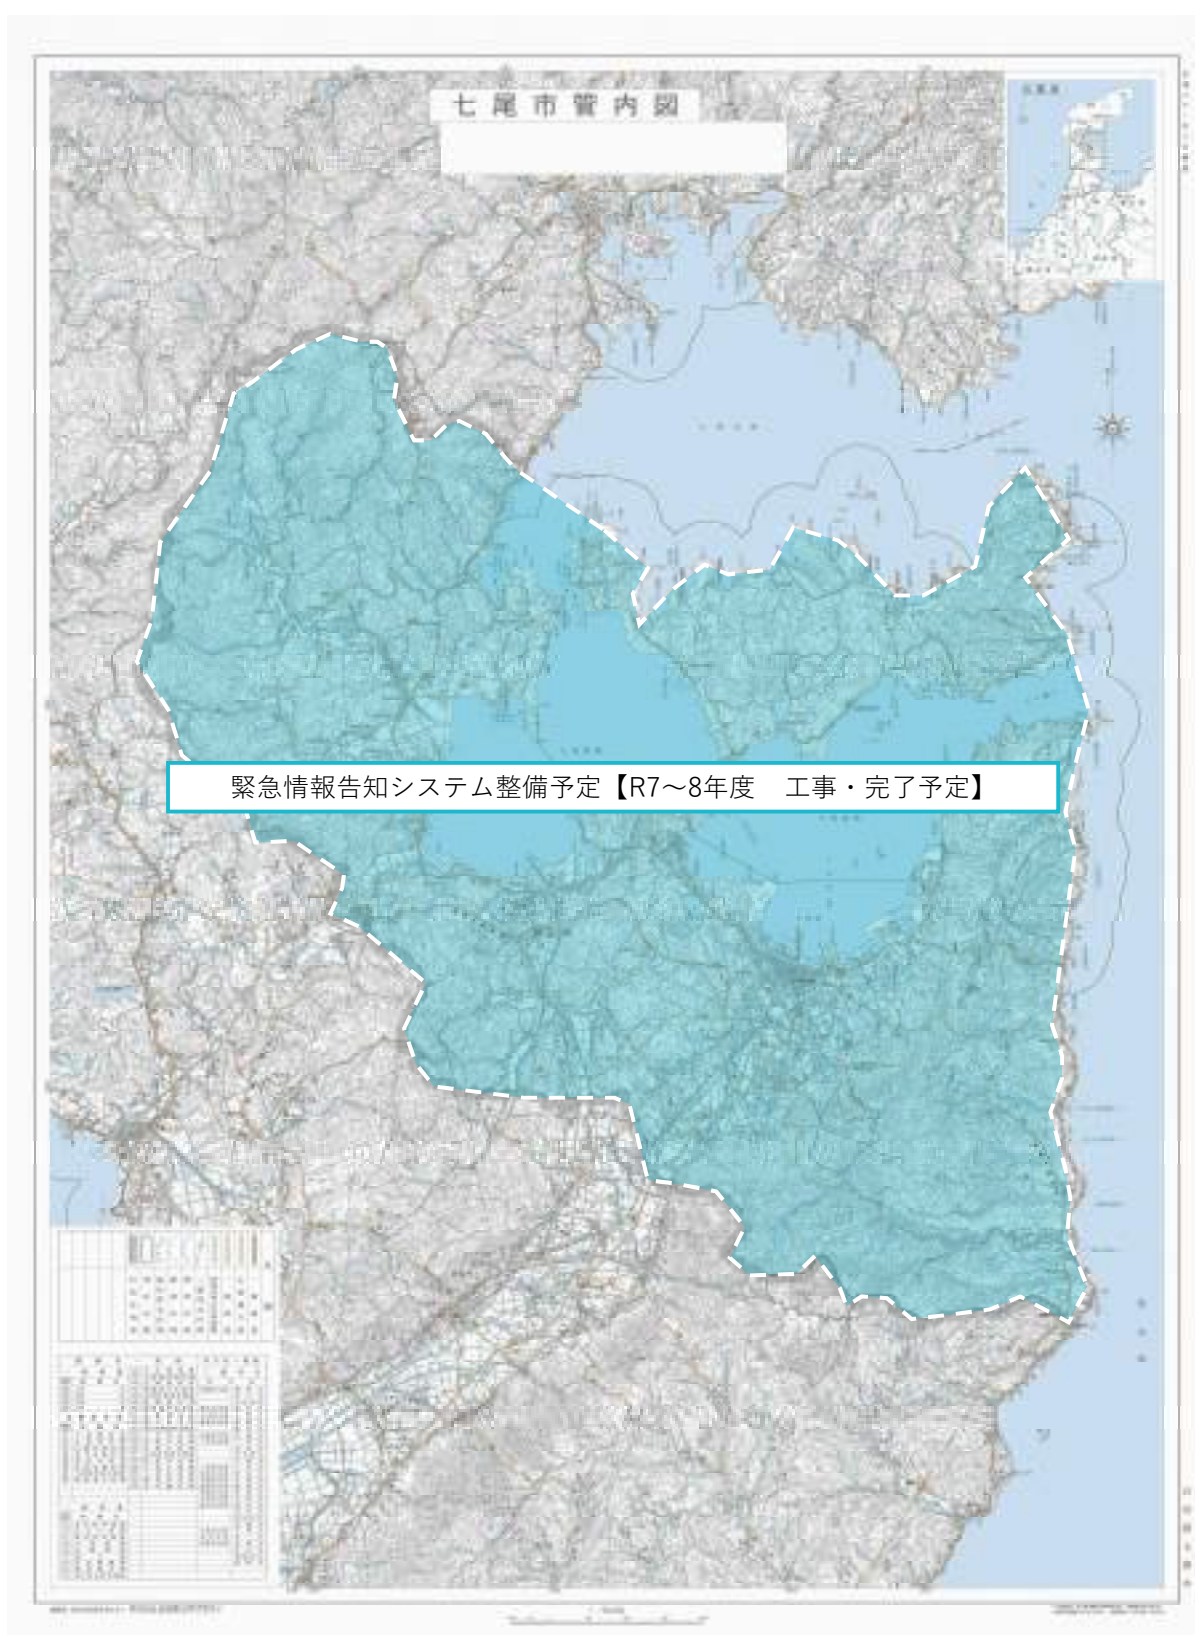



# 震災の経験を生かしたインフラ強靱化プロジェクト

【ハード事業】

## 環境施設の復旧

【担当課: 環境課】

### ■ 環境施設の災害復旧

【事業名称】 環境施設災害復旧工事 【事業期間】 令和6年度～令和8年度

【事業内容】 被災した環境施設を復旧し、ごみやし尿などの処理機能を早期に回復することで、地域の衛生環境と生活基盤を確保する。

【事業概要】 環境施設の復旧 3 施設

【事業費】 1,115,914 千円

【復旧状況】 (代表的な復旧箇所)

復旧前



復旧後




### 【事業スケジュール】

| 種別           | 令和7年度 |       | 令和8年度 |      | 令和9年度 |   | 令和10年度 |   | 令和11年度以降 |   |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|---|--------|---|----------|---|
| ななかリサイクルセンター | 工事    | 完了    | —     | —    | —     | — | —      | — | —        | — |
| ななか中央埋立場     | 完了    | —     | —     | —    | —     | — | —      | — | —        | — |
| ななかクリーンセンター  | 調査・設計 | 調査・設計 | 工事    | 完了予定 | —     | — | —      | — | —        | — |

### 【進捗状況】

| 項目   |      | 進捗率 |  | R7年度 |    |
|------|------|-----|--|------|----|
| 環境施設 | 復旧施設 | 67% |  | 2    | 施設 |
|      | 被災施設 |     |  | 3    | 施設 |

【位置図】

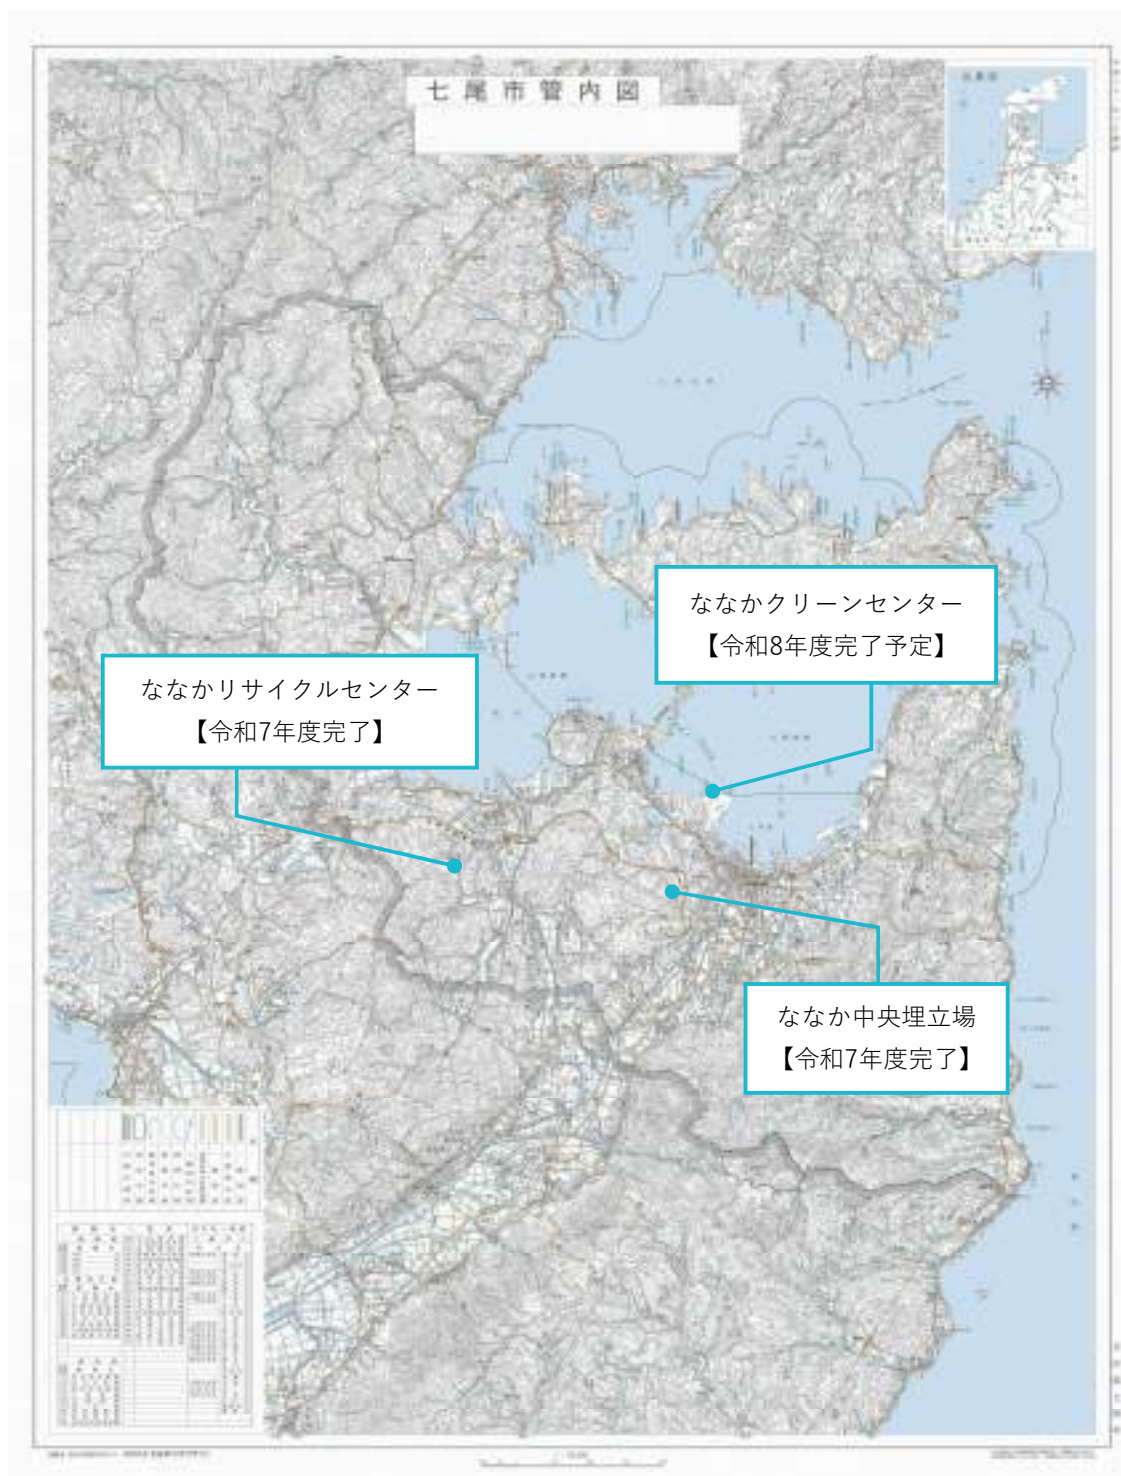

# 3

## 震災の経験を生かしたインフラ強靱化プロジェクト

【ハード事業】

### 道路・河川・港湾・漁港などの復旧

【担当課: 土木課】

#### ■主要インフラの災害復旧

|  |  |
|--|--|
| <p><b>【事業名称】</b> 道路災害復旧事業<br/>河川災害復旧事業<br/>港湾等災害復旧事業<br/>漁港等災害復旧事業</p> | <p><b>【事業期間】</b> 令和7年度～令和16年度<br/>令和7年度～令和13年度<br/>令和7年度～令和12年度<br/>令和7年度～令和15年度</p> |
|--|--|

**【事業内容】** 道路復旧  
壊れた道を直し、安全に通れるようにする。

河川復旧  
堤防や護岸を直し、洪水などを防ぐ。

港湾・漁港等の復旧  
物流や防災の拠点として港の機能を復旧し、地域の暮らしを支える。

|                       |        |           |       |
|-----------------------|--------|-----------|-------|
| <b>【事業概要】</b> 被災道路の復旧 | 212 箇所 | 被災港湾などの復旧 | 3 箇所  |
| 被災河川の復旧               | 28 箇所  | 被災漁港などの復旧 | 15 箇所 |

**【事業費】** 191,800,000 千円

**【復旧状況】** (代表的な復旧箇所)

復旧前



復旧後




【事業スケジュール】

| 種別   | 令和7年度 |    | 令和8年度 |    | 令和9年度 |    | 令和10年度 |    | 令和11年度以降 |    |
|------|-------|----|-------|----|-------|----|--------|----|----------|----|
| 道路   | 調査・設計 | 工事 | 工事    | 工事 | 工事    | 工事 | 工事     | 工事 | 工事       | 工事 |
| 河川   | 調査・設計 | 工事 | 工事    | 工事 | 工事    | 工事 | 工事     | 工事 | 工事       | 工事 |
| 港湾など | 調査・設計 | 工事 | 工事    | 工事 | 工事    | 工事 | 工事     | 工事 | 工事       | 工事 |
| 漁港など | 調査・設計 | 工事 | 工事    | 工事 | 工事    | 工事 | 工事     | 工事 | 工事       | 工事 |


【進捗状況】

| 項目   |       | 進捗率 |     | R7年度 |    |
|------|-------|-----|-----|------|----|
| 道路   | 復旧箇所数 |     | 18% | 39   | 箇所 |
|      | 被災箇所数 |     |     | 212  | 箇所 |
| 河川   | 復旧箇所数 |     | 7%  | 2    | 箇所 |
|      | 被災箇所数 |     |     | 28   | 箇所 |
| 港湾など | 復旧港湾数 |     | 0%  | 0    | 箇所 |
|      | 被災港湾数 |     |     | 3    | 箇所 |
| 漁港など | 復旧漁港数 |     | 20% | 3    | 箇所 |
|      | 被災漁港数 |     |     | 15   | 箇所 |


【位置図】 道路復旧

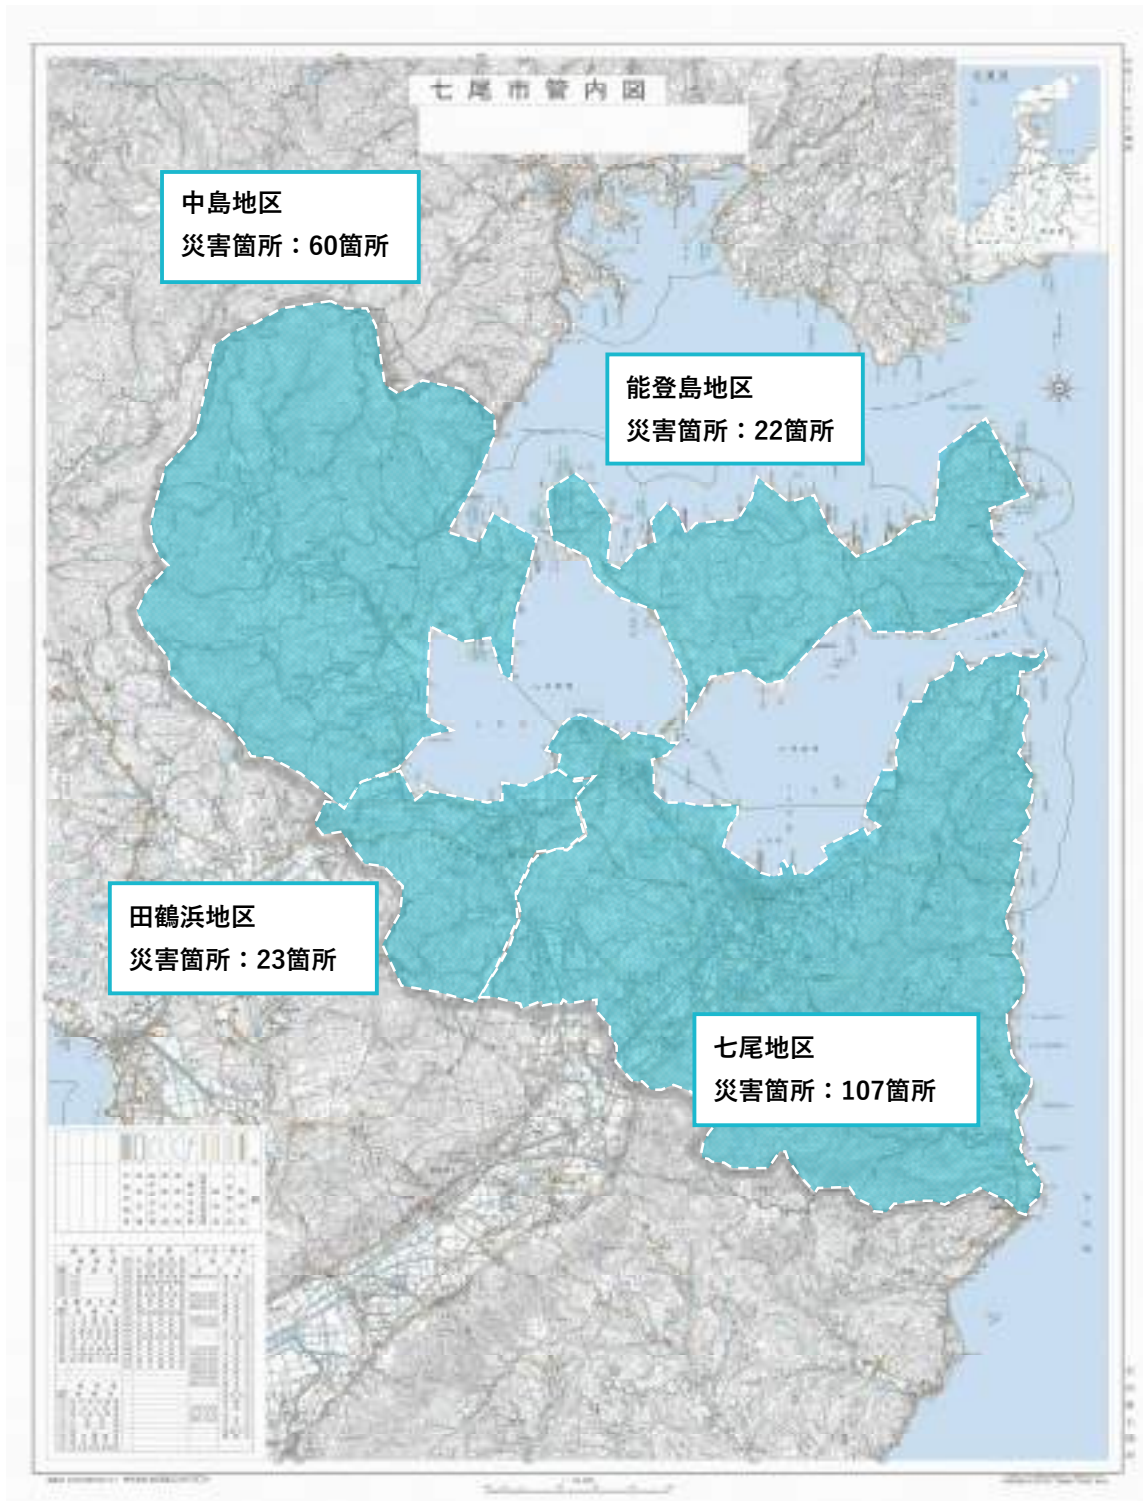

【位置図】河川復旧

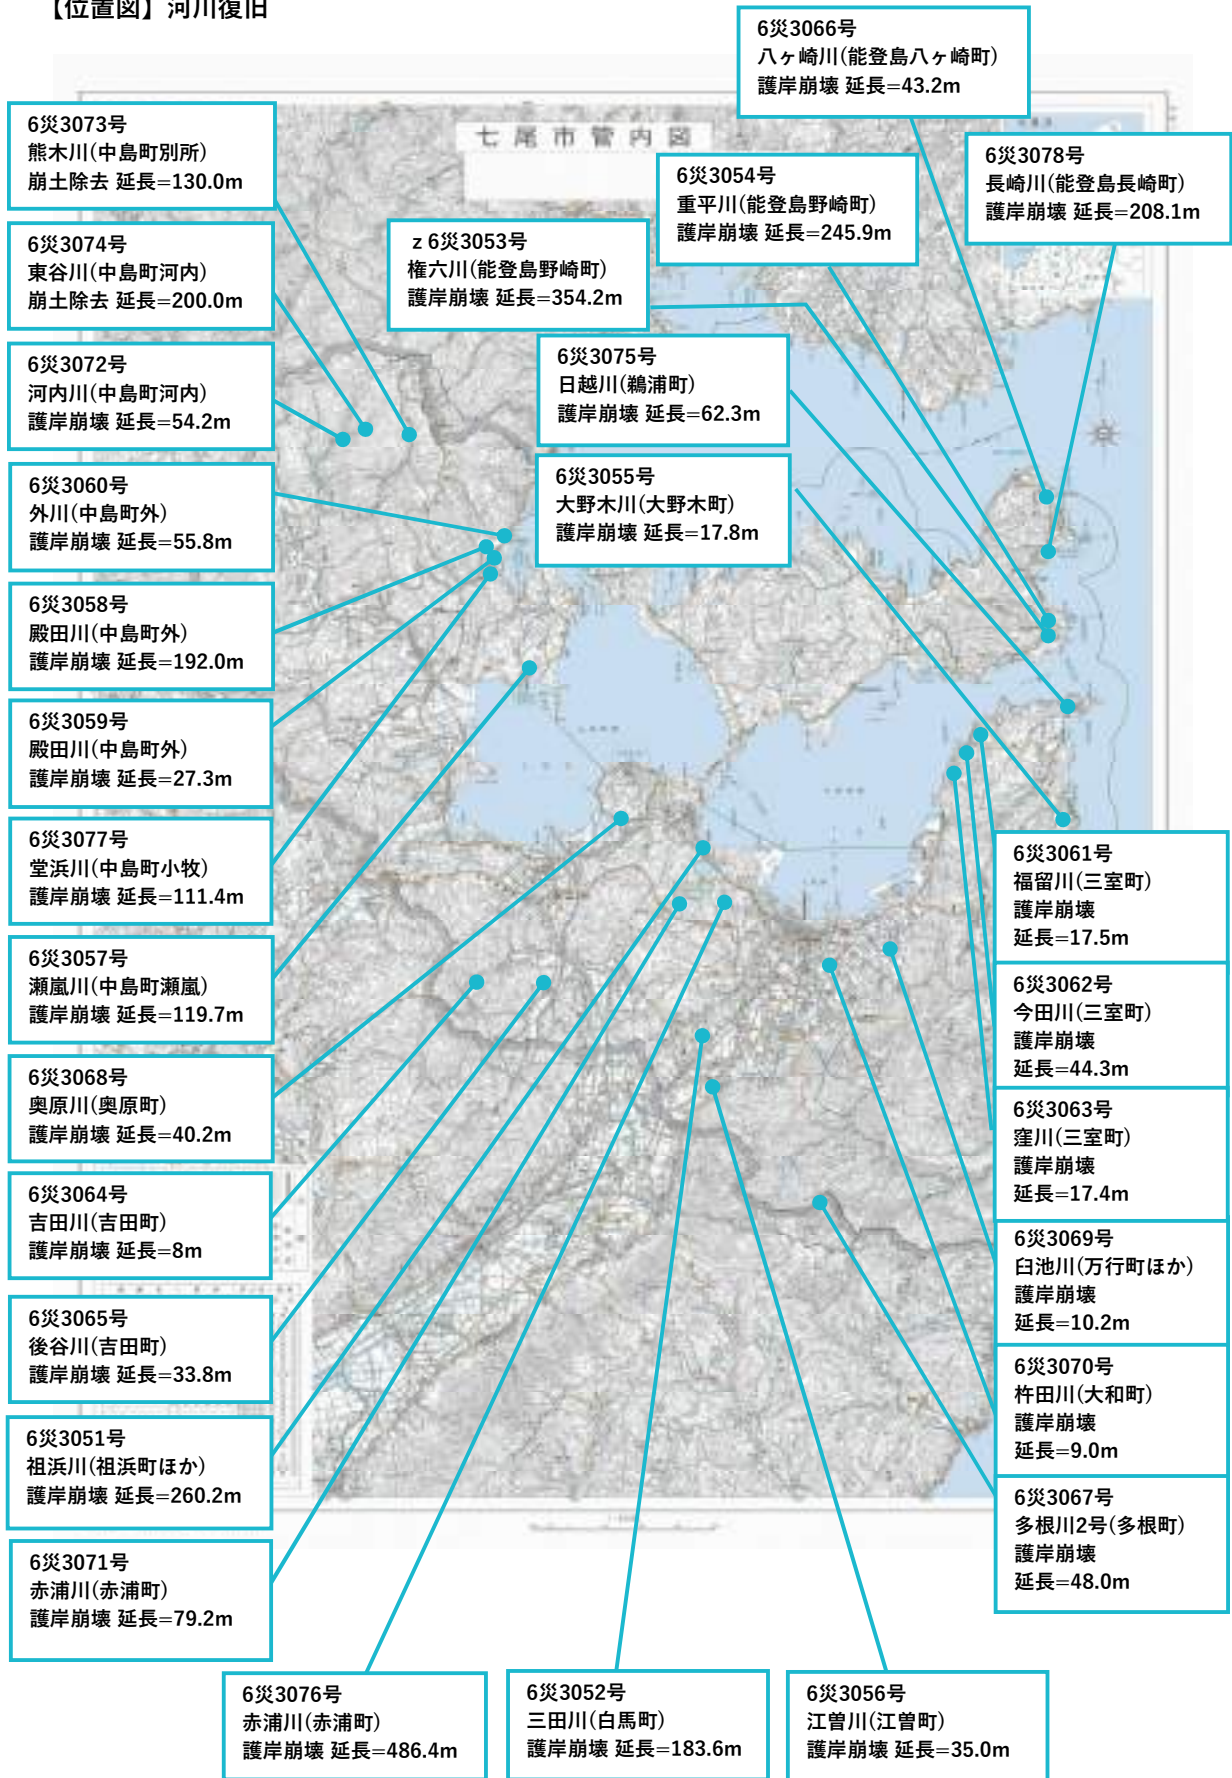

【位置図】 港湾・漁港などの復旧

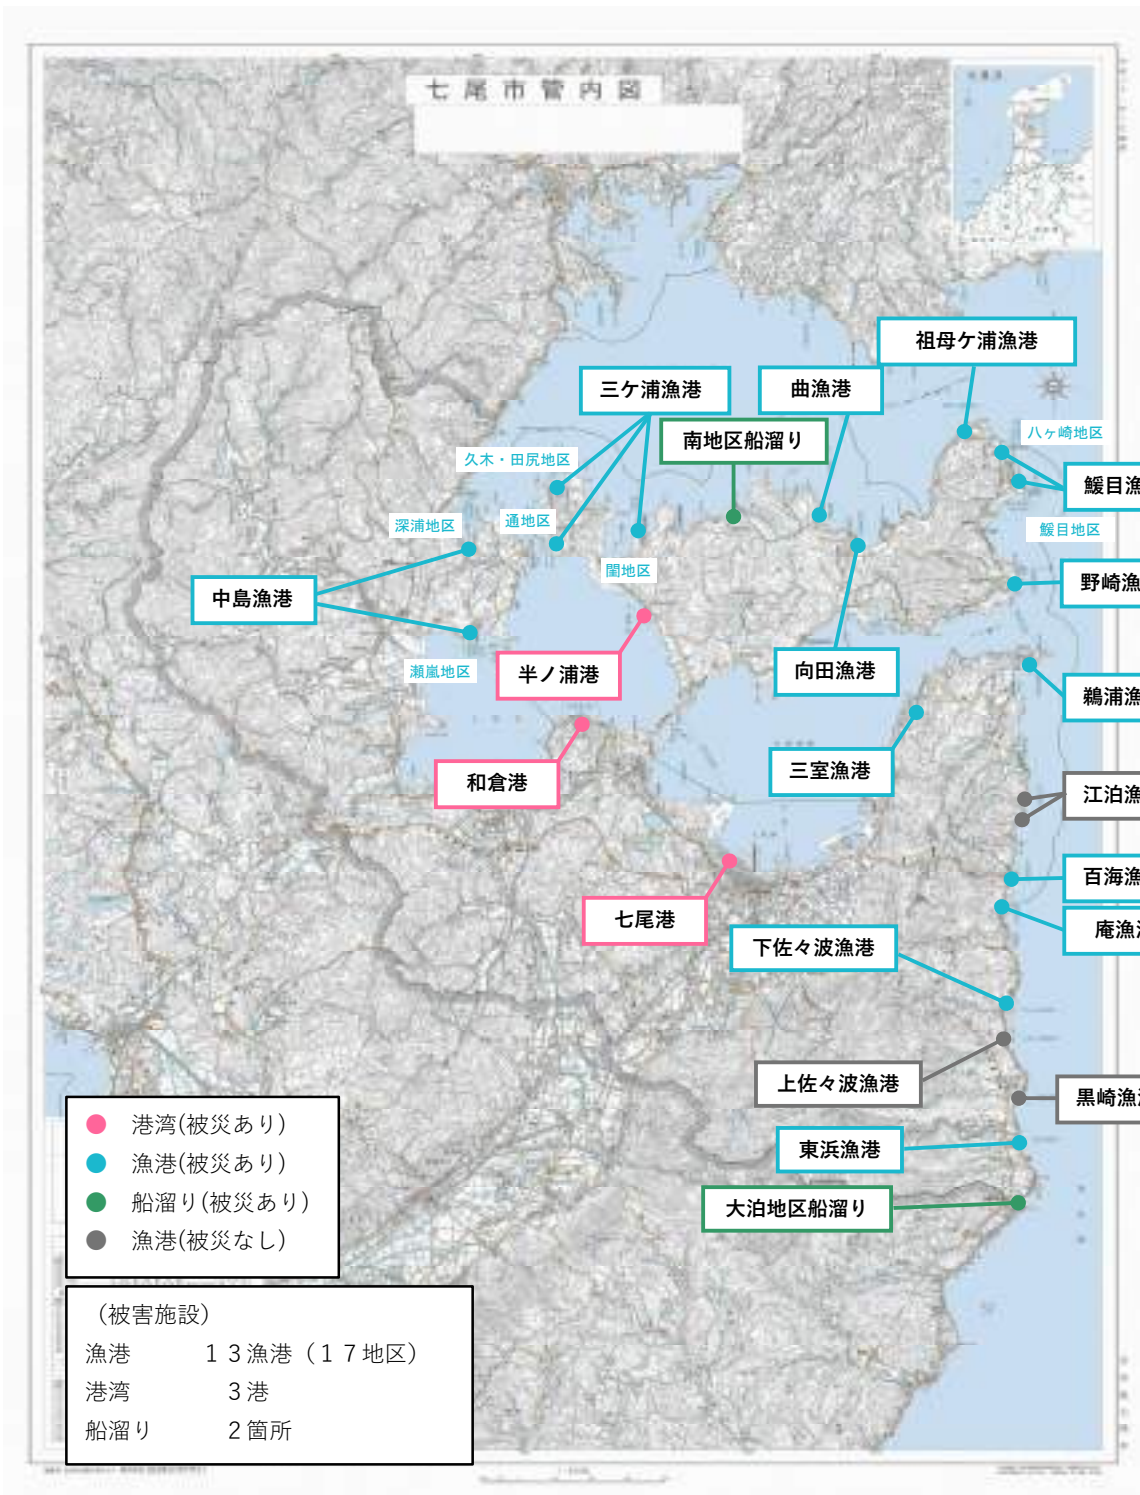



# 震災の経験を生かしたインフラ強靱化プロジェクト

【ハード事業】

## 橋梁の復旧

【 担当課: 土木課 】

### ■ 橋梁の災害復旧

【事業名称】 橋梁復旧事業

【事業期間】 令和7年度～令和10年度

【事業内容】 被災した橋梁の安全確認や応急復旧を迅速に行い、通行機能を確保するとともに恒久的な復旧工事を推進する。

【事業概要】 被災橋梁の復旧 2 橋

【事業費】 330,000 千円

【復旧状況】 (代表的な復旧箇所)



### 【事業スケジュール】

| 種別 | 令和7年度 |       | 令和8年度 |    | 令和9年度 |    | 令和10年度 |      | 令和11年度以降 |   |
|----|-------|-------|-------|----|-------|----|--------|------|----------|---|
| 橋梁 | 調査・設計 | 調査・設計 | 工事    | 工事 | 工事    | 工事 | 工事     | 完了予定 | —        | — |

### 【進捗状況】

| 項目 |      | 進捗率 | R7年度 |   |
|----|------|-----|------|---|
| 橋梁 | 復旧橋梁 | 0%  | 0    | 橋 |
|    | 被災橋梁 |     | 2    | 橋 |

【位置図】





# 震災の経験を生かしたインフラ強靱化プロジェクト

【ハード事業】

## 公園・緑地の復旧

【担当課: 都市建築課】

### ■主な公園・被災緑地の復旧

|  |   |
|--|---|
| <p><b>【事業名称】</b> 都市災害復旧事業（御祓川緑地）<br/>         都市災害復旧事業（和倉公園）<br/>         都市災害復旧事業（小丸山城址公園）<br/>         都市災害復旧事業（希望の丘公園）<br/>         都市災害復旧事業（香島1号緑地）<br/>         都市災害復旧事業（鯉ヶ浦緑地）</p> | <p><b>【事業期間】</b> 令和6年度～令和6年度<br/>         令和6年度～令和7年度<br/>         令和6年度～令和8年度<br/>         令和6年度～令和8年度<br/>         令和6年度～令和8年度<br/>         令和6年度～令和7年度</p> |
|--|---|

**【事業内容】** 被災した公園・緑地施設を復旧し、安全で安心して利用できる環境を復旧する。

**【事業概要】** 被災した公園・緑地の概要

|            |           |           |            |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 御祓川緑地の復旧   | 20,826 千円 | 希望の丘公園の復旧 | 243,442 千円 |
| 和倉公園の復旧    | 8,433 千円  | 香島1号緑地の復旧 | 22,409 千円  |
| 小丸山城址公園の復旧 | 73,586 千円 | 鯉ヶ浦緑地の復旧  | 15,626 千円  |

**【事業費】** 384,322 千円

**【復旧状況】** (代表的な復旧箇所) 御祓川緑地 時計塔

復旧前



復旧後




【事業スケジュール】

| 種別          | 令和7年度 |    | 令和8年度    |          | 令和9年度 |   | 令和10年度 |   | 令和11年度以降 |   |
|-------------|-------|----|----------|----------|-------|---|--------|---|----------|---|
| 御祓川<br>緑地   | 完了済   | —  | —        | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 和倉公園        | 完了済   | —  | —        | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 小丸山<br>城址公園 | 工事    | 工事 | 工事       | 完了<br>予定 | —     | — | —      | — | —        | — |
| 希望の丘<br>公園  | 工事    | 工事 | 工事       | 完了<br>予定 | —     | — | —      | — | —        | — |
| 香島1号<br>緑地  | 工事    | 工事 | 完了<br>予定 | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 鯉ヶ浦<br>緑地   | 完了済   | —  | —        | —        | —     | — | —      | — | —        | — |

【進捗状況】

| 項目          |     | 進捗率  | R7年度    |    |
|-------------|-----|------|---------|----|
| 御祓川<br>緑地   | 進捗額 | 100% | 20,826  | 千円 |
|             | 全体額 |      | 20,826  | 千円 |
| 和倉公園        | 進捗額 | 100% | 8,433   | 千円 |
|             | 全体額 |      | 8,433   | 千円 |
| 小丸山<br>城址公園 | 進捗額 | 45%  | 32,807  | 千円 |
|             | 全体額 |      | 73,586  | 千円 |
| 希望の丘<br>公園  | 進捗額 | 19%  | 46,923  | 千円 |
|             | 全体額 |      | 243,442 | 千円 |
| 香島1号<br>緑地  | 進捗額 | 0%   | 0       | 千円 |
|             | 全体額 |      | 22,409  | 千円 |
| 鯉ヶ浦<br>緑地   | 進捗額 | 100% | 15,626  | 千円 |
|             | 全体額 |      | 15,626  | 千円 |

【位置図】

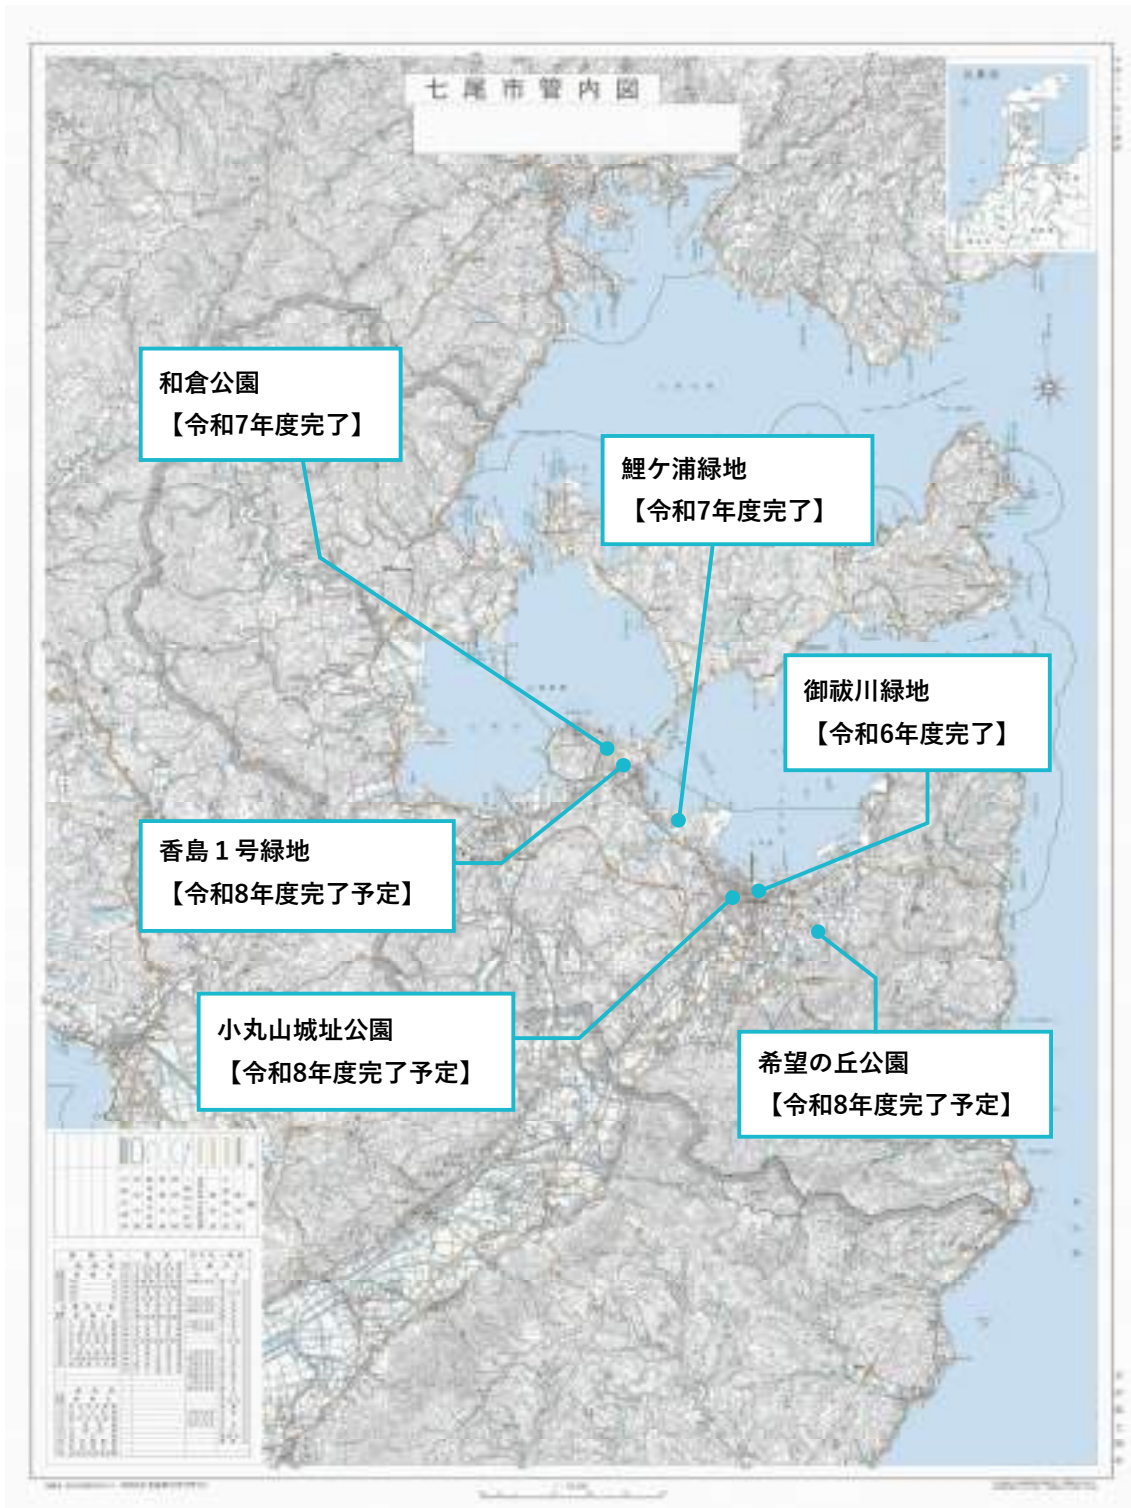

## 管路施設の復旧計画

※下水道などが整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

| 旧地区 | 地区  | 町名      | 処理区名 | 種別 | 被害 | 令和7年度 | 令和8年度 | 備考           |
|-----|-----|---------|------|----|----|-------|-------|--------------|
| 七尾  | 袖ヶ江 | 川渚通     | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 浜通      | 七尾   | 公共 | 有  | ●     | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 立丁通     | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 女良浜通    | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 七軒町通    | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 作事町     | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 相生町     | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 橘町      | 七尾   | 公共 | 無  | —     | —     |              |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 塗師町     | 七尾   | 公共 | 無  | —     | —     |              |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 今町      | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 袖ヶ江町    | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 川原町     | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 鍛冶町     | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 湊町一丁目   | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 湊町二丁目東部 | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 湊町二丁目西部 | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 郡町東部    | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 郡町西部    | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 袖ヶ江 | 矢田新町    | 七尾   | 公共 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 御祓  | 亀山町     | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 御祓  | 生駒町     | 七尾   | 公共 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 御祓  | 一本杉町    | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 御祓  | 阿良町     | 七尾   | 公共 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 御祓  | 米町      | 七尾   | 公共 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 御祓  | 三島町     | 七尾   | 公共 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 御祓  | 昭和町     | 七尾   | 公共 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 御祓  | 寿町      | 七尾   | 公共 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |

## 管路施設の復旧計画

※下水道などが整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

| 旧地区 | 地区  | 町名     | 処理区名 | 種別   | 被害 | 令和7年度 | 令和8年度 | 備考           |
|-----|-----|--------|------|------|----|-------|-------|--------------|
| 七尾  | 御祓  | 常盤町    | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 御祓  | 木町     | 七尾   | 公共   | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 御祓  | 白銀町    | 七尾   | 公共   | 無  | —     | —     |              |
| 七尾  | 御祓  | 魚町     | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 御祓  | 桜町     | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 御祓  | 富岡町    | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 御祓  | 松本町    | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 御祓  | 馬出町    | 七尾   | 公共   | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 御祓  | 西藤橋町   | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 御祓  | 南藤橋町   | 七尾   | 公共   | 無  | —     | —     |              |
| 七尾  | 御祓  | 北藤橋町   | 七尾   | 公共   | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 御祓  | 神明町    | 七尾   | 公共   | 有  | ●     | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 御祓  | 御祓町    | 七尾   | 公共   | 有  | ●     | ●     |              |
| 七尾  | 御祓  | 大手町    | 七尾   | 公共   | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 御祓  | 桧物町    | 七尾   | 公共   | 有  | ●     | ●     |              |
| 七尾  | 徳田  | 八田町    | 八田中挟 | コミプラ | 有  | ●     | ●     |              |
| 七尾  | 徳田  | 中挟町    | 八田中挟 | コミプラ | 有  | ●     | ●     |              |
| 七尾  | 徳田  | 若林町    | 若林   | 農集   | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 矢田郷 | 本府中町一区 | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 矢田郷 | 本府中町二区 | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 矢田郷 | 本府中町三区 | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 矢田郷 | 本府中町四区 | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 矢田郷 | 巴町     | 七尾   | 公共   | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 矢田郷 | 上府中町   | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 矢田郷 | 山王町    | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定 |
| 七尾  | 矢田郷 | 藤橋町    | 七尾   | 公共   | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |
| 七尾  | 矢田郷 | 所口町    | 七尾   | 公共   | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定   |

## 管路施設の復旧計画

※下水道などが整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

| 旧地区 | 地区  | 町名       | 処理区名 | 種別   | 被害 | 令和7年度 | 令和8年度 | 備考                                    |
|-----|-----|----------|------|------|----|-------|-------|---------------------------------------|
| 七尾  | 矢田郷 | 矢田町      | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 矢田郷 | 緑ヶ丘町     | 緑ヶ丘  | コミプラ | 有  | ●     |       |                                       |
| 七尾  | 矢田郷 | 大和町      | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 東湊  | 万行町      | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 東湊  | 報国町      | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 西湊  | 小島一丁目    | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 西湊  | 小島二丁目    | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 西湊  | 小島三丁目    | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 西湊  | 津向町      | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 西湊  | 松百町      | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 西湊  | 新保町      | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 西湊  | 祖浜町      | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 西湊  | 赤浦町      | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 西湊  | つつじが浜    | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 西湊  | 松百新町     | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 西湊  | なぎの浦     | 七尾   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 石崎  | 石崎町東一区   | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 石崎  | 石崎町東二区   | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 石崎  | 石崎町東三区   | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 石崎  | 石崎町東四区   | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 石崎  | 石崎町西一区   | 和倉   | 公共   | 有  |       | ●     | 令和10年度以降 実施予定<br>※県道和倉和倉停車場線のみ令和8年度予定 |
| 七尾  | 石崎  | 石崎町西二区   | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 石崎  | 石崎町西三区   | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 石崎  | 石崎町香島1丁目 | 和倉   | 公共   | 有  |       | ●     | 令和10年度以降 実施予定<br>※県道和倉和倉停車場線のみ令和8年度予定 |

## 管路施設の復旧計画

※下水道などが整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

| 旧地区 | 地区  | 町名             | 処理区名 | 種別   | 被害 | 令和7年度 | 令和8年度 | 備考                                    |
|-----|-----|----------------|------|------|----|-------|-------|---------------------------------------|
| 七尾  | 石崎  | 石崎町香島2丁目       | 和倉   | 公共   | 有  |       | ●     | 令和10年度以降 実施予定<br>※県道和倉和倉停車場線のみ令和8年度予定 |
| 七尾  | 石崎  | 石崎町香島3丁目       | 和倉   | 公共   | 有  |       | ●     | 令和10年度以降 実施予定<br>※県道和倉和倉停車場線のみ令和8年度予定 |
| 七尾  | 和倉  | 和倉東町           | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定                          |
| 七尾  | 和倉  | 和倉中町           | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定                          |
| 七尾  | 和倉  | 和倉元町           | 和倉   | 公共   | 有  |       | ●     | 令和9年度以降 実施予定<br>※県道和倉和倉停車場線のみ令和8年度予定  |
| 七尾  | 和倉  | 和倉町和泉          | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定                          |
| 七尾  | 和倉  | 和倉町ひばり         | 和倉   | 公共   | 有  |       | ●     | 令和9年度以降 実施予定<br>※県道和倉和倉停車場線のみ令和8年度予定  |
| 七尾  | 和倉  | 泉南台            | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定                          |
| 七尾  | 和倉  | 光陽台            | 和倉   | 公共   | 有  |       | ●     | 令和9年度以降 実施予定<br>※県道和倉和倉停車場線のみ令和8年度予定  |
| 七尾  | 和倉  | 奥原町            | 和倉   | 公共   | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定                         |
| 七尾  | 南大吞 | 大泊町            | 東浜大泊 | コミプラ | 無  | —     | —     |                                       |
| 七尾  | 南大吞 | 東浜町            | 東浜大泊 | コミプラ | 有  | ●     | ●     |                                       |
| 七尾  | 南大吞 | 黒崎町            | 南大吞  | 農集   | 無  | —     | —     |                                       |
| 七尾  | 南大吞 | 花園町            | 南大吞  | 農集   | 有  | ●     | ●     |                                       |
| 七尾  | 南大吞 | 山崎町            | 南大吞  | 農集   | 有  | ●     | ●     |                                       |
| 七尾  | 北大吞 | 佐々波町           | 佐々波  | 漁集   | 無  | —     | —     |                                       |
| 七尾  | 北大吞 | 庵町             | 庵    | 漁集   | 無  | —     | —     |                                       |
| 七尾  | 北大吞 | 百海町            | 庵    | 漁集   | 無  | —     | —     |                                       |
| 七尾  | 北大吞 | 江泊町            | 江泊   | 農集   | 有  | ●     | ●     |                                       |
| 七尾  | 北大吞 | 大野木町           | 大野木  | コミプラ | 有  | ●     | ●     |                                       |
| 七尾  | 崎山  | 鵜浦町<br>(中浦・山崎) | 崎山   | 農集   | 有  | ●     | ●     | 令和9年度 継続予定                            |

## 管路施設の復旧計画

※下水道などが整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

| 旧地区 | 地区  | 町名              | 処理区名 | 種別 | 被害 | 令和7年度 | 令和8年度 | 備考            |
|-----|-----|-----------------|------|----|----|-------|-------|---------------|
| 七尾  | 崎山  | 鵜浦町<br>(鹿渡島・川尻) | 鵜浦   | 漁集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 七尾  | 崎山  | 湯川町             | 崎山   | 農集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 七尾  | 崎山  | 岡町              | 崎山   | 農集 | 無  | —     | —     |               |
| 七尾  | 高階  | 町屋町             | 高階   | 農集 | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定    |
| 七尾  | 高階  | 温井町             | 高階   | 農集 | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定    |
| 七尾  | 高階  | 満仁町             | 高階   | 農集 | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定    |
| 七尾  | 高階  | 池崎町             | 高階   | 農集 | 有  | ●     | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 七尾  | 高階  | 旭町              | 高階   | 農集 | 無  | —     | —     |               |
| 七尾  | 高階  | 盤若野町            | 高階   | 農集 | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定    |
| 七尾  | 高階  | 東三階町            | 高階   | 農集 | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定    |
| 七尾  | 高階  | 西三階町            | 高階   | 農集 | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定    |
| 田鶴浜 | 端   | 舟尾町             | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定 |
| 田鶴浜 | 端   | 舟尾団地            | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定 |
| 田鶴浜 | 端   | 川尻町             | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定 |
| 田鶴浜 | 端   | 新屋町             | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定 |
| 田鶴浜 | 端   | 垣吉町             | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定 |
| 田鶴浜 | 田鶴浜 | 田鶴浜下東           | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 田鶴浜 | 田鶴浜 | 田鶴浜上東           | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定  |
| 田鶴浜 | 田鶴浜 | 田鶴浜南町           | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定  |
| 田鶴浜 | 田鶴浜 | 田鶴浜中町           | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 田鶴浜 | 田鶴浜 | 田鶴浜西町           | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 田鶴浜 | 田鶴浜 | 田鶴浜殿町           | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定  |
| 田鶴浜 | 田鶴浜 | 田鶴浜登町           | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定  |
| 田鶴浜 | 田鶴浜 | 田鶴浜丸山町          | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定  |
| 田鶴浜 | 田鶴浜 | 上野ヶ丘            | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定  |
| 田鶴浜 | 田鶴浜 | 田鶴浜馬場           | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 田鶴浜 | 赤蔵  | 三引第 1           | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定  |

## 管路施設の復旧計画

※下水道などが整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

| 旧地区 | 地区  | 町名   | 処理区名 | 種別 | 被害 | 令和7年度 | 令和8年度 | 備考            |
|-----|-----|------|------|----|----|-------|-------|---------------|
| 田鶴浜 | 赤蔵  | 三引第2 | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定  |
| 田鶴浜 | 赤蔵  | 三引第3 | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定  |
| 田鶴浜 | 赤蔵  | 高田町  | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定 |
| 田鶴浜 | 赤蔵  | 杉森町  | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定 |
| 田鶴浜 | 相馬  | 伊久留町 | 伊久留  | 農集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 田鶴浜 | 相馬  | 吉田町  | 吉田   | 農集 | 有  | ●     | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 田鶴浜 | 相馬  | 西下町  | 田鶴浜  | 特環 | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定 |
| 田鶴浜 | 金ヶ崎 | 大津町北 | 大津   | 農集 | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定    |
| 田鶴浜 | 金ヶ崎 | 大津町南 | 大津   | 農集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 田鶴浜 | 金ヶ崎 | 大津町西 | 大津   | 農集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 田鶴浜 | 金ヶ崎 | 大津町中 | 大津   | 農集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 田鶴浜 | 金ヶ崎 | 大津町東 | 大津   | 農集 | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定    |
| 田鶴浜 | 金ヶ崎 | 白浜町  | 白深   | 農集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 田鶴浜 | 金ヶ崎 | 深見町  | 白深   | 農集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 西岸  | 瀬嵐   | 瀬嵐   | 漁集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 西岸  | 鹿島台  | 長浦   | 特環 | 有  | ●     | ●     |               |
| 中島  | 西岸  | 長浦   | 長浦   | 特環 | 有  | ●     | ●     |               |
| 中島  | 西岸  | 深浦   | 外    | 農集 | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定    |
| 中島  | 西岸  | 小牧   | 外    | 農集 | 有  | ●     | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 西岸  | 外    | 外    | 農集 | 有  | ●     | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 西岸  | 田岸   | 外    | 農集 | 無  | —     | —     |               |
| 中島  | 鉦打  | 河内   | 河内   | 農集 | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定    |
| 中島  | 鉦打  | 古江   | 藤瀬   | 農集 | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定    |
| 中島  | 鉦打  | 鳥越   | 藤瀬   | 農集 | 無  | —     | —     |               |
| 中島  | 鉦打  | 西谷内  | 藤瀬   | 農集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 鉦打  | 藤瀬   | 藤瀬   | 農集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 鉦打  | 町屋   | 北免田  | 農集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |

## 管路施設の復旧計画

※下水道などが整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

| 旧地区 | 地区  | 町名   | 処理区名 | 種別 | 被害 | 令和7年度 | 令和8年度 | 備考            |
|-----|-----|------|------|----|----|-------|-------|---------------|
| 中島  | 鉦打  | 上島   | 北免田  | 農集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 鉦打  | 北免田  | 北免田  | 農集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 熊木  | 横田   | 中島   | 特環 | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定 |
| 中島  | 熊木  | 宮前   | 中島   | 特環 | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定 |
| 中島  | 熊木  | 谷内   | 中島   | 特環 | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定 |
| 中島  | 熊木  | 山戸田  | 中島   | 特環 | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定 |
| 中島  | 熊木  | 上町   | 中島   | 特環 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 熊木  | 浜田   | 中島   | 特環 | 有  | ●     | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 中島  | 代本   | 中島   | 特環 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 中島  | 新町   | 中島   | 特環 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 中島  | 中町   | 中島   | 特環 | 有  | ●     | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 中島  | 向出   | 中島   | 特環 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 中島  | 菅原   | 中島   | 特環 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 中島  | 熊野   | 中島   | 特環 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 中島  | 桜林住宅 | 中島   | 特環 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 豊川  | 崎山   | 中島   | 特環 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定  |
| 中島  | 豊川  | 奥吉田  | 中島   | 特環 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定  |
| 中島  | 豊川  | 河崎   | 中島   | 特環 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定  |
| 中島  | 豊川  | 豊田町  | 中島   | 特環 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定  |
| 中島  | 豊川  | 豊田   | 中島   | 特環 | 有  |       |       | 令和9年度以降 実施予定  |
| 中島  | 豊川  | 土川   | 中島   | 特環 | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定 |
| 中島  | 豊川  | 外原   | 中島   | 特環 | 有  |       |       | 令和10年度以降 実施予定 |
| 中島  | 笠師保 | 筆染   | 笠師保  | 農集 | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定    |
| 中島  | 笠師保 | 下笠師  | 笠師保  | 農集 | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定    |
| 中島  | 笠師保 | 中笠師  | 笠師保  | 農集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 笠師保 | 上笠師  | 笠師保  | 農集 | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定    |
| 中島  | 笠師保 | 南側   | 笠師保  | 農集 | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定    |

## 管路施設の復旧計画


※下水道などが整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

| 旧地区 | 地区  | 町名       | 処理区名  | 種別  | 被害 | 令和7年度 | 令和8年度 | 備考         |
|-----|-----|----------|-------|-----|----|-------|-------|------------|
| 中島  | 笠師保 | 塩津       | 笠師保   | 農集  | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定 |
| 能登島 | 野崎  | 能登島二穴町   | 二穴    | 農集  | 有  |       |       | 令和9年度 実施予定 |
| 能登島 | 野崎  | 能登島野崎町   | 能登島東部 | 漁集  | 有  | ●     | ●     | 令和9年度 継続予定 |
| 能登島 | 緩目  | 能登島長崎町   | 能登島東部 | 漁集  | 有  | ●     | ●     | 令和9年度 継続予定 |
| 能登島 | 緩目  | 能登島緩目町   | 能登島東部 | 漁集  | 有  | ●     | ●     | 令和9年度 継続予定 |
| 能登島 | 緩目  | 能登島八ヶ崎町  | 能登島東部 | 漁集  | 有  | ●     | ●     | 令和9年度 継続予定 |
| 能登島 | 緩目  | 能登島祖母ヶ浦町 | 祖母ヶ浦  | 漁集  | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定 |
| 能登島 | 中部  | 能登島向田町   | 能登島   | 特環  | 有  | ●     | ●     |            |
| 能登島 | 中部  | 能登島曲町    | 能登島   | 特環  | 有  | ●     | ●     |            |
| 能登島 | 中部  | 能登島別所町   | 島別所   | 農集  | 有  | ●     | ●     |            |
| 能登島 | 中部  | 能登島佐波町   | 佐波    | 小規模 | 有  | ●     | ●     |            |
| 能登島 | 西部  | 能登島須曾町   | 須曾    | 農集  | 有  | ●     | ●     |            |
| 能登島 | 西部  | 能登島半浦町   | 半浦    | 農集  | 有  | ●     | ●     |            |
| 能登島 | 西部  | 能登島南町    | 南     | 農集  | 有  | ●     | ●     |            |
| 能登島 | 西部  | 能登島無関町   | 無関    | 農集  | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定 |
| 能登島 | 西部  | 能登島閨町    | 閨     | 漁集  | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定 |
| 能登島 | 西部  | 能登島久木町   | 三ヶ    | 漁集  | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定 |
| 能登島 | 西部  | 能登島田尻町   | 三ヶ    | 漁集  | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定 |
| 能登島 | 西部  | 能登島通町    | 三ヶ    | 漁集  | 有  |       | ●     | 令和9年度 継続予定 |


# 処理施設などの復旧計画

【位置図】

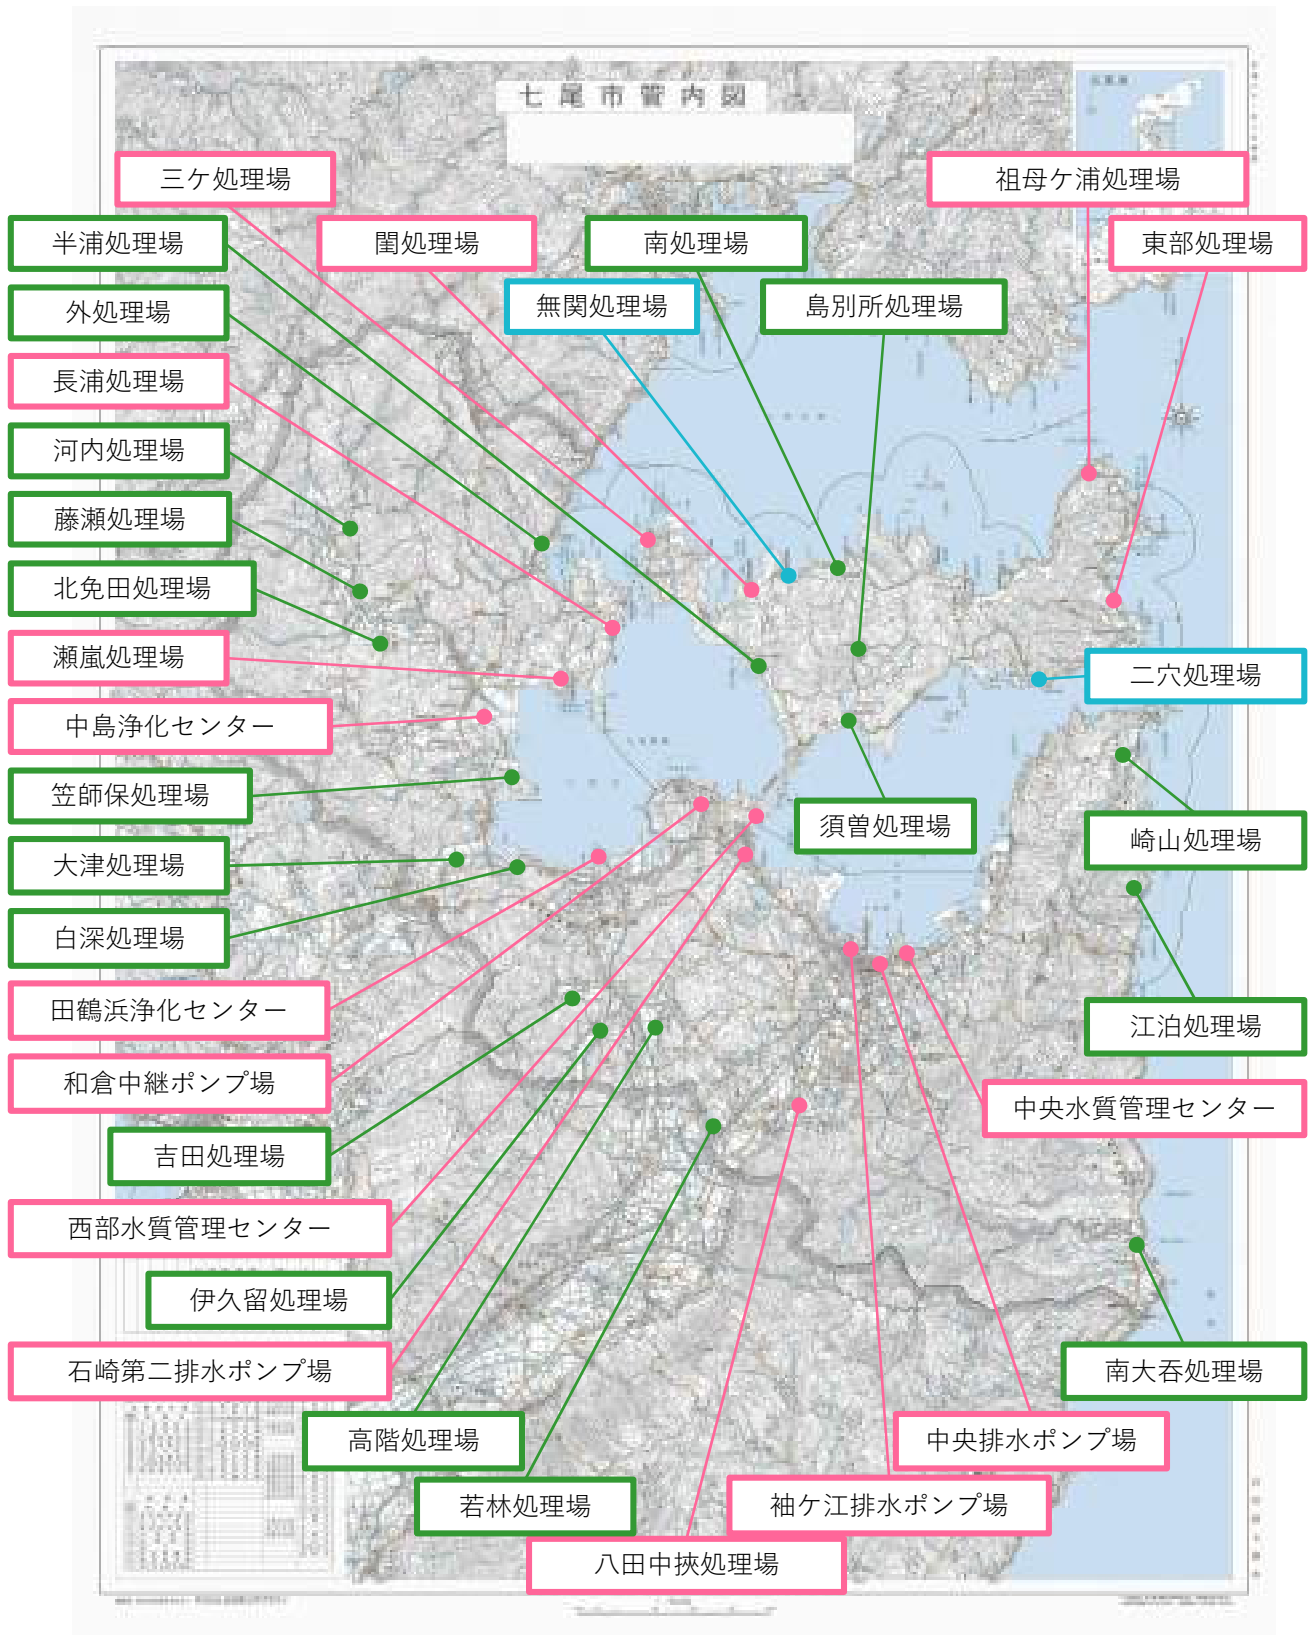


# 雨水排水路の復旧計画

【位置図】

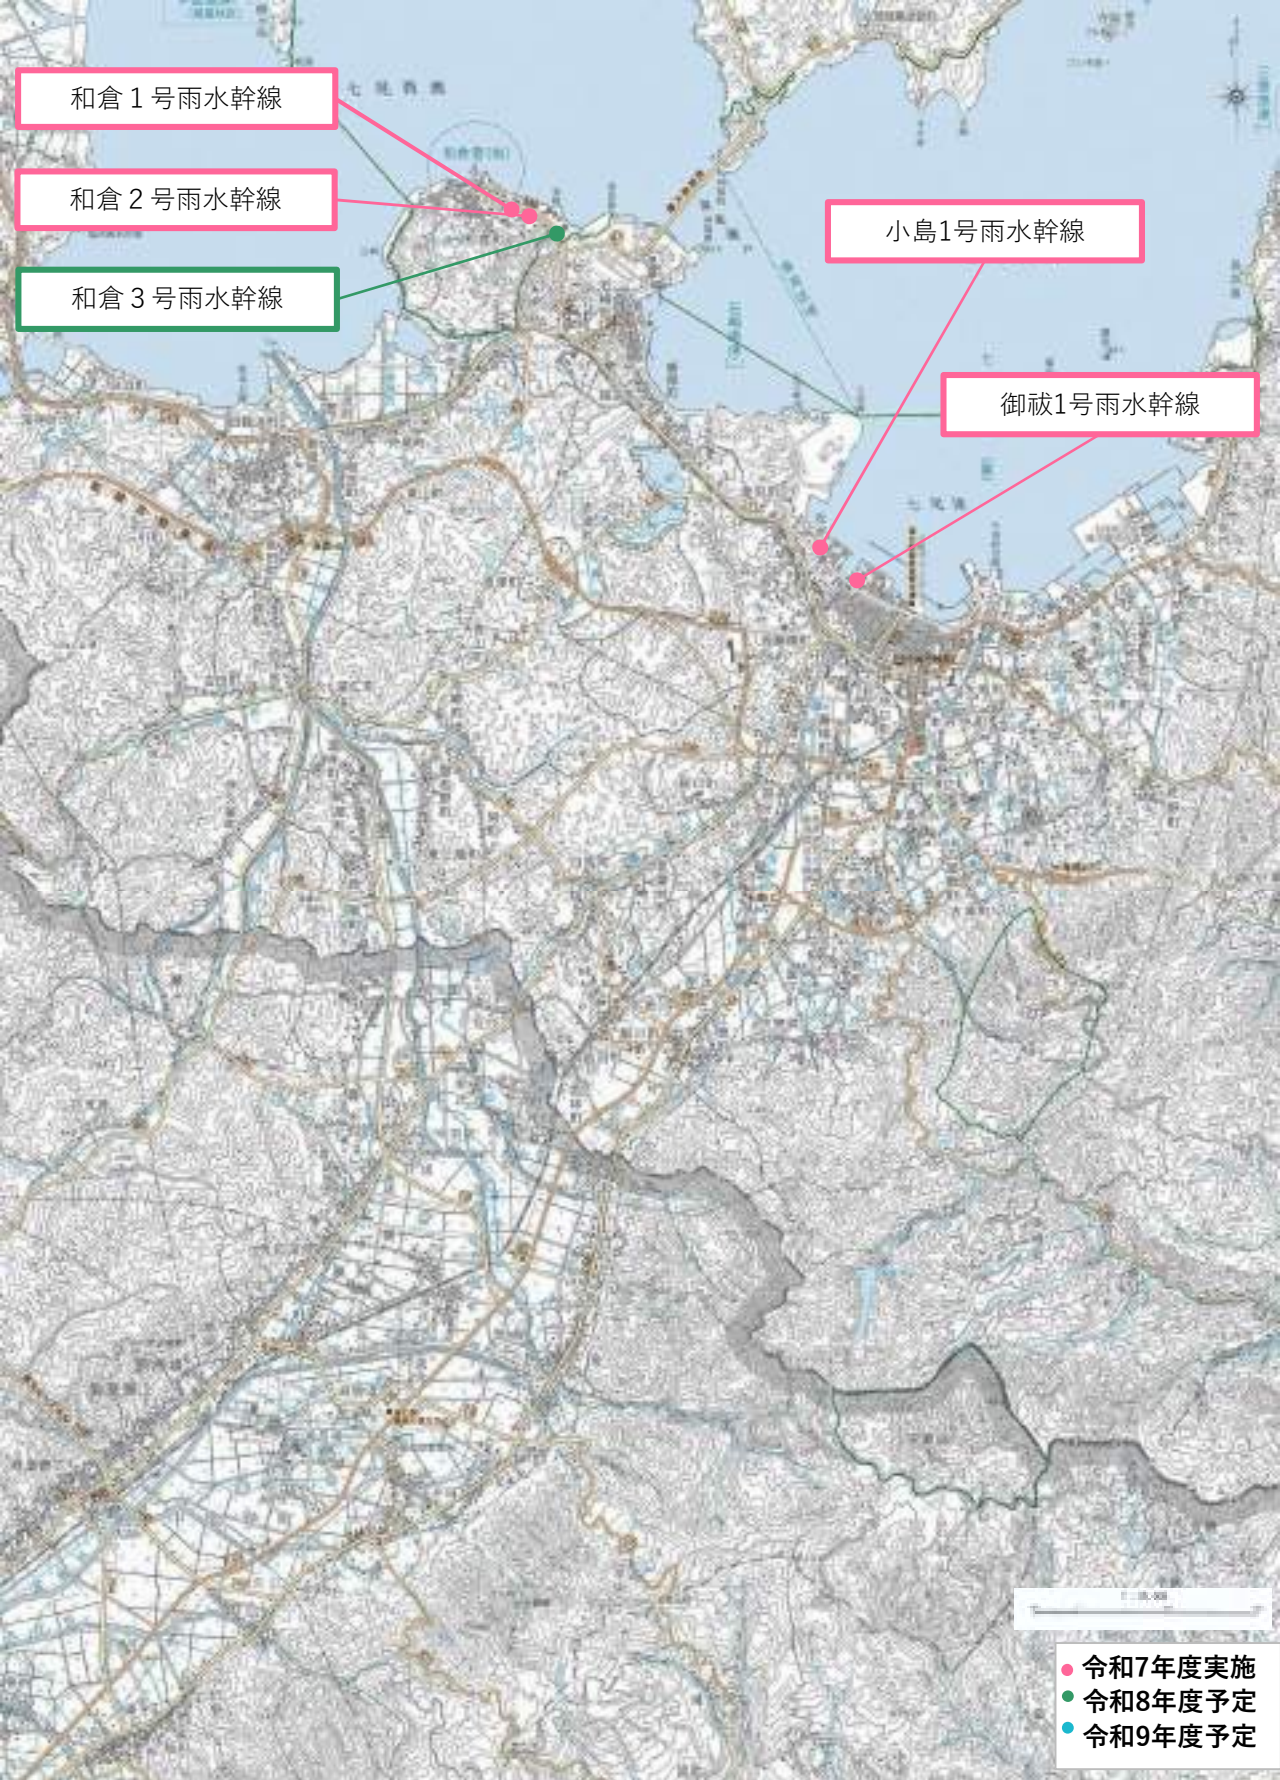



【位置図】

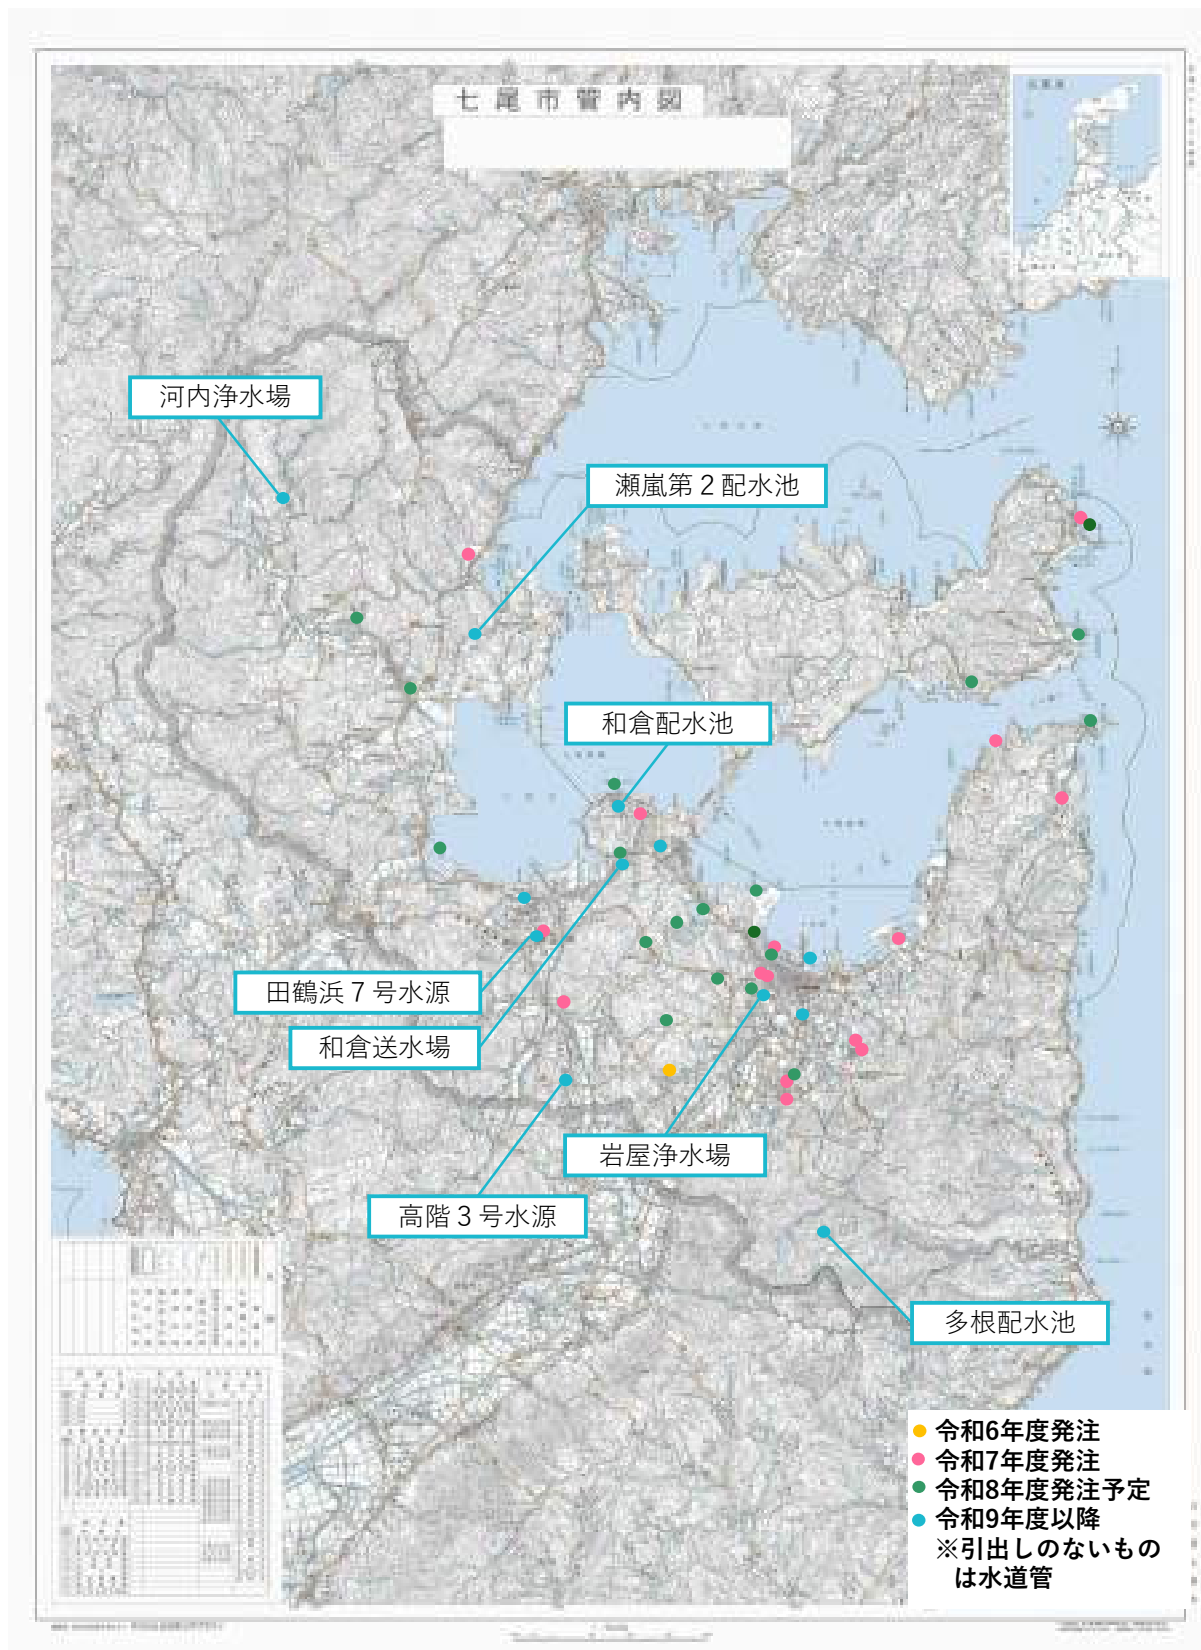



# 震災の経験を生かしたインフラ強靱化プロジェクト

【ハード事業】

## 下水道施設などの復旧

【 担当課: 上下水道課 】

### ■ 下水道施設などの災害復旧

【事業名称】 下水道施設など災害復旧事業                      【事業期間】 令和7年度～令和16年度

【事業内容】 被災した下水道施設などを復旧し、地域の生活基盤を早期に回復する。

【事業概要】 管路施設の復旧                      105 km  
                   処理施設などの復旧                      35 施設  
                   雨水排水路の復旧                      5 箇所

【事業費】 6,575,527                      千円

【復旧状況】 (代表的な箇所)

復旧前



復旧前



### 【事業スケジュール】


| 種別         | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度以降 |
|------------|----------|-------|-------|--------|----------|
| 管路施設       | 別紙一覧表を参照 |       |       |        |          |
| 処理施設<br>など | 別紙一覧表を参照 |       |       |        |          |
| 雨水排水<br>路  | 別紙一覧表を参照 |       |       |        |          |

### 【進捗状況】

| 項目         |      | 進捗率 | R7年度 |    |
|------------|------|-----|------|----|
| 管路施設       | 復旧延長 | 0%  | 0    | km |
|            | 被災延長 |     | 105  | km |
| 処理施設<br>など | 復旧施設 | 0%  | 0    | 施設 |
|            | 被災施設 |     | 35   | 施設 |
| 雨水排水<br>路  | 復旧箇所 | 0%  | 0    | 箇所 |
|            | 被災箇所 |     | 5    | 箇所 |



【位置図】

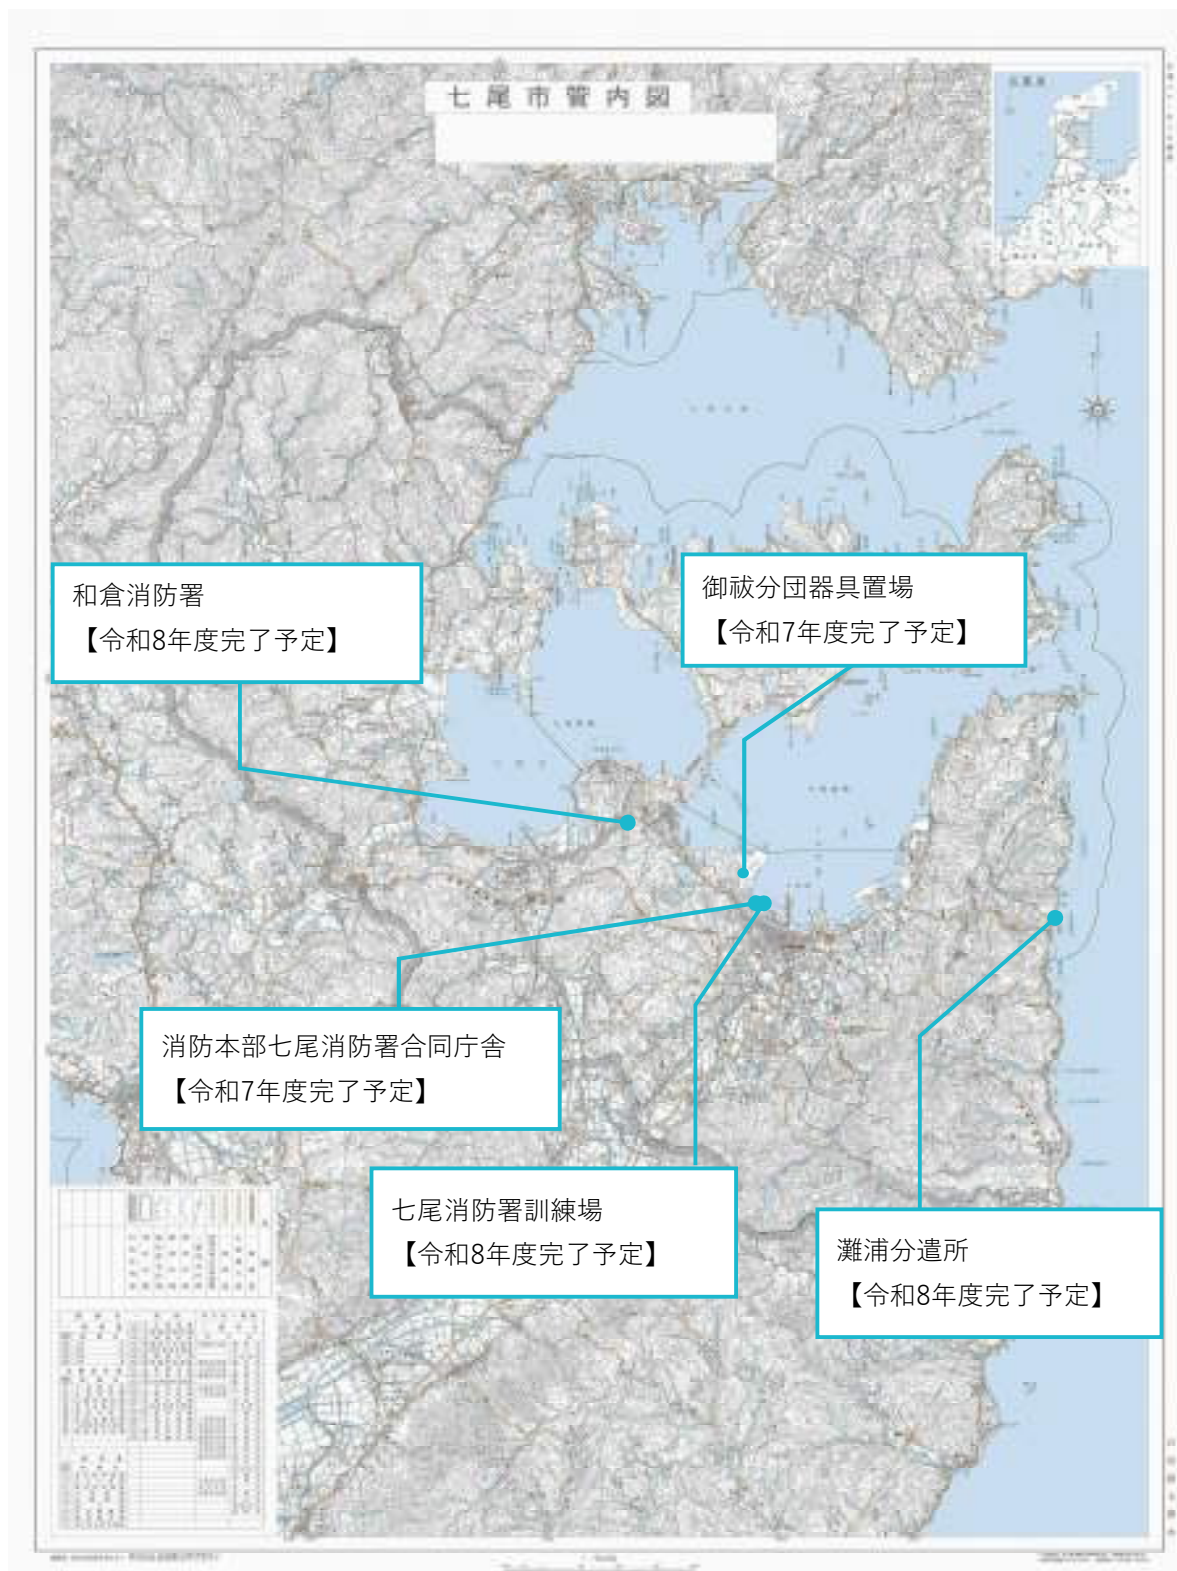

# 3 震災の経験を生かしたインフラ強靱化プロジェクト

## 能越自動車道田鶴浜七尾道路・国道159号 七尾バイパスの整備促進

**【取組・施策】** 地域経済の活性化、観光振興、救急医療体制の強化、および災害時における緊急輸送路の確保など、多岐にわたる重要な機能を担う道路ネットワークの整備を戦略的に推進する。

### ■ 能越自動車道田鶴浜七尾道路整備促進事業 【 担当課: 土木課 】

**【事業内容】** 地域発展・観光振興・災害対応を目的に、国が七尾市赤浦町～千野町間（約3.4km）で進める高規格幹線道路整備を促進する。（平成28年度～）

**【事業期間】** 令和6年度～



### ■ 国道159号七尾バイパス整備促進事業 【 担当課: 土木課 】

**【事業内容】** 交通混雑の緩和や港・観光地へのアクセス向上を目的に、国が七尾市川原町～下町間（約4.3km）で進める道路整備を促進する。（平成12年度～）

**【事業期間】** 令和6年度～



|                              | 短期    | 中期    |       | 長期    |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                              | R7    | R8    | R9    | R10   | R11   | R12   |
| ①能越自動車道<br>田鶴浜七尾道路<br>整備促進事業 | ▶     |       |       |       |       |       |
| （事業費：千円）                     | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| ②国道159号<br>七尾バイパス<br>整備促進事業  | ▶     |       |       |       |       |       |
| （事業費：千円）                     | 287   | 287   | 287   | 287   | 287   | 287   |

## 七尾港の強靱化及び防災拠点化

**【事業内容】** 大規模自然災害発生時においても、港湾機能の継続性を確保し、被災地への円滑な支援活動を可能とするため、七尾港の強靱化及び機能強化を図る。

### ■ 七尾港改修事業負担金

**【担当課:** 産業振興課 **】**

**【事業内容】** 石川県が実施する重要港湾七尾港の改修事業に対する地元負担金を支出する。

- ・大田ふ頭（国際船舶・港湾保安法に対応するための工事）
- ・矢田新第2ふ頭（荷物の積み降ろしや船客乗降対応の修繕工事）
- ・泊地浚渫工事など

**【事業期間】** 令和6年度～



|             | 短期             | 中期     |    | 長期  |     |     |
|-------------|----------------|--------|----|-----|-----|-----|
|             | R7             | R8     | R9 | R10 | R11 | R12 |
| ①七尾港改修事業負担金 | 事業期間中継続的に支出される |        |    |     |     |     |
| (事業費：千円)    | 53,885         | 96,315 | 未定 | 未定  | 未定  | 未定  |

# 3 震災の経験を生かしたインフラ強靱化プロジェクト

## 避難所機能の強化

**【取組・施策】** 能登半島地震の教訓などを生かし、避難所に防災資機材を配備することで、大規模災害による断水や停電が起きた場合にも対応できるよう、避難環境の強化を図る。また、平時から資機材を活用し、避難訓練や防災教育に取り組むことで、市民の防災意識の向上を図る。

### ■ 避難所の生活環境強化事業

**【担当課:** 危機対策課 **】**

**【事業内容】** 避難所の受入体制を強化するため、鍵管理用キーボックスや循環型シャワーなどを整備する。  
また、新たに公表された地震被害想定において、最大避難者数が29,451人となり、それに伴う災害備蓄食糧の充実を図る。

**【事業期間】** 令和6年度～



|               | 短期     | 中期     |        | 長期     |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|               | R7     | R8     | R9     | R10    | R11    | R12    |
| ①避難所の生活環境強化事業 | ▶      |        |        |        |        |        |
| (事業費：千円)      | 69,797 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |



# なりわい再建プロジェクト

【ハード事業】

## 農林業施設の復旧

【 担当課: 農林水産課 】

### ■ 農道・林道の災害復旧

【事業名称】 農業用施設復旧事業  
 林業災害復旧事業

【事業期間】 令和7年度～令和9年度  
 令和7年度～令和9年度

【事業内容】 農道・林道の復旧事業は、災害で被災した道路を修復し、農林業・森林管理の再開を支援するとともに、地域の生活道路としての機能の早期回復を図る。

【事業概要】 農道の復旧 39 路線  
 林道の復旧 4 路線

【事業費】 4,021,777 千円

【復旧状況】 (代表的な復旧箇所)




### 【事業スケジュール】

| 種別 | 令和7年度 |    | 令和8年度 |    |    | 令和9年度 |   | 令和10年度 |   | 令和11年度以降 |  |
|----|-------|----|-------|----|----|-------|---|--------|---|----------|--|
| 農道 | 調査・設計 | 工事 | 工事    | 工事 | 工事 | 完了予定  | - | -      | - | -        |  |
| 林道 | 調査・設計 | 工事 | 工事    | 工事 | 工事 | 完了予定  | - | -      | - | -        |  |


### 【進捗状況】

| 項目 |       | 進捗率 |  |  |  | R7年度 |    |
|----|-------|-----|--|--|--|------|----|
| 農道 | 復旧路線数 | 0%  |  |  |  | 0    | 路線 |
|    | 被災路線数 |     |  |  |  | 39   | 路線 |
| 林道 | 復旧路線数 | 25% |  |  |  | 1    | 路線 |
|    | 被災路線数 |     |  |  |  | 4    | 路線 |

# 位置図 (1/2)

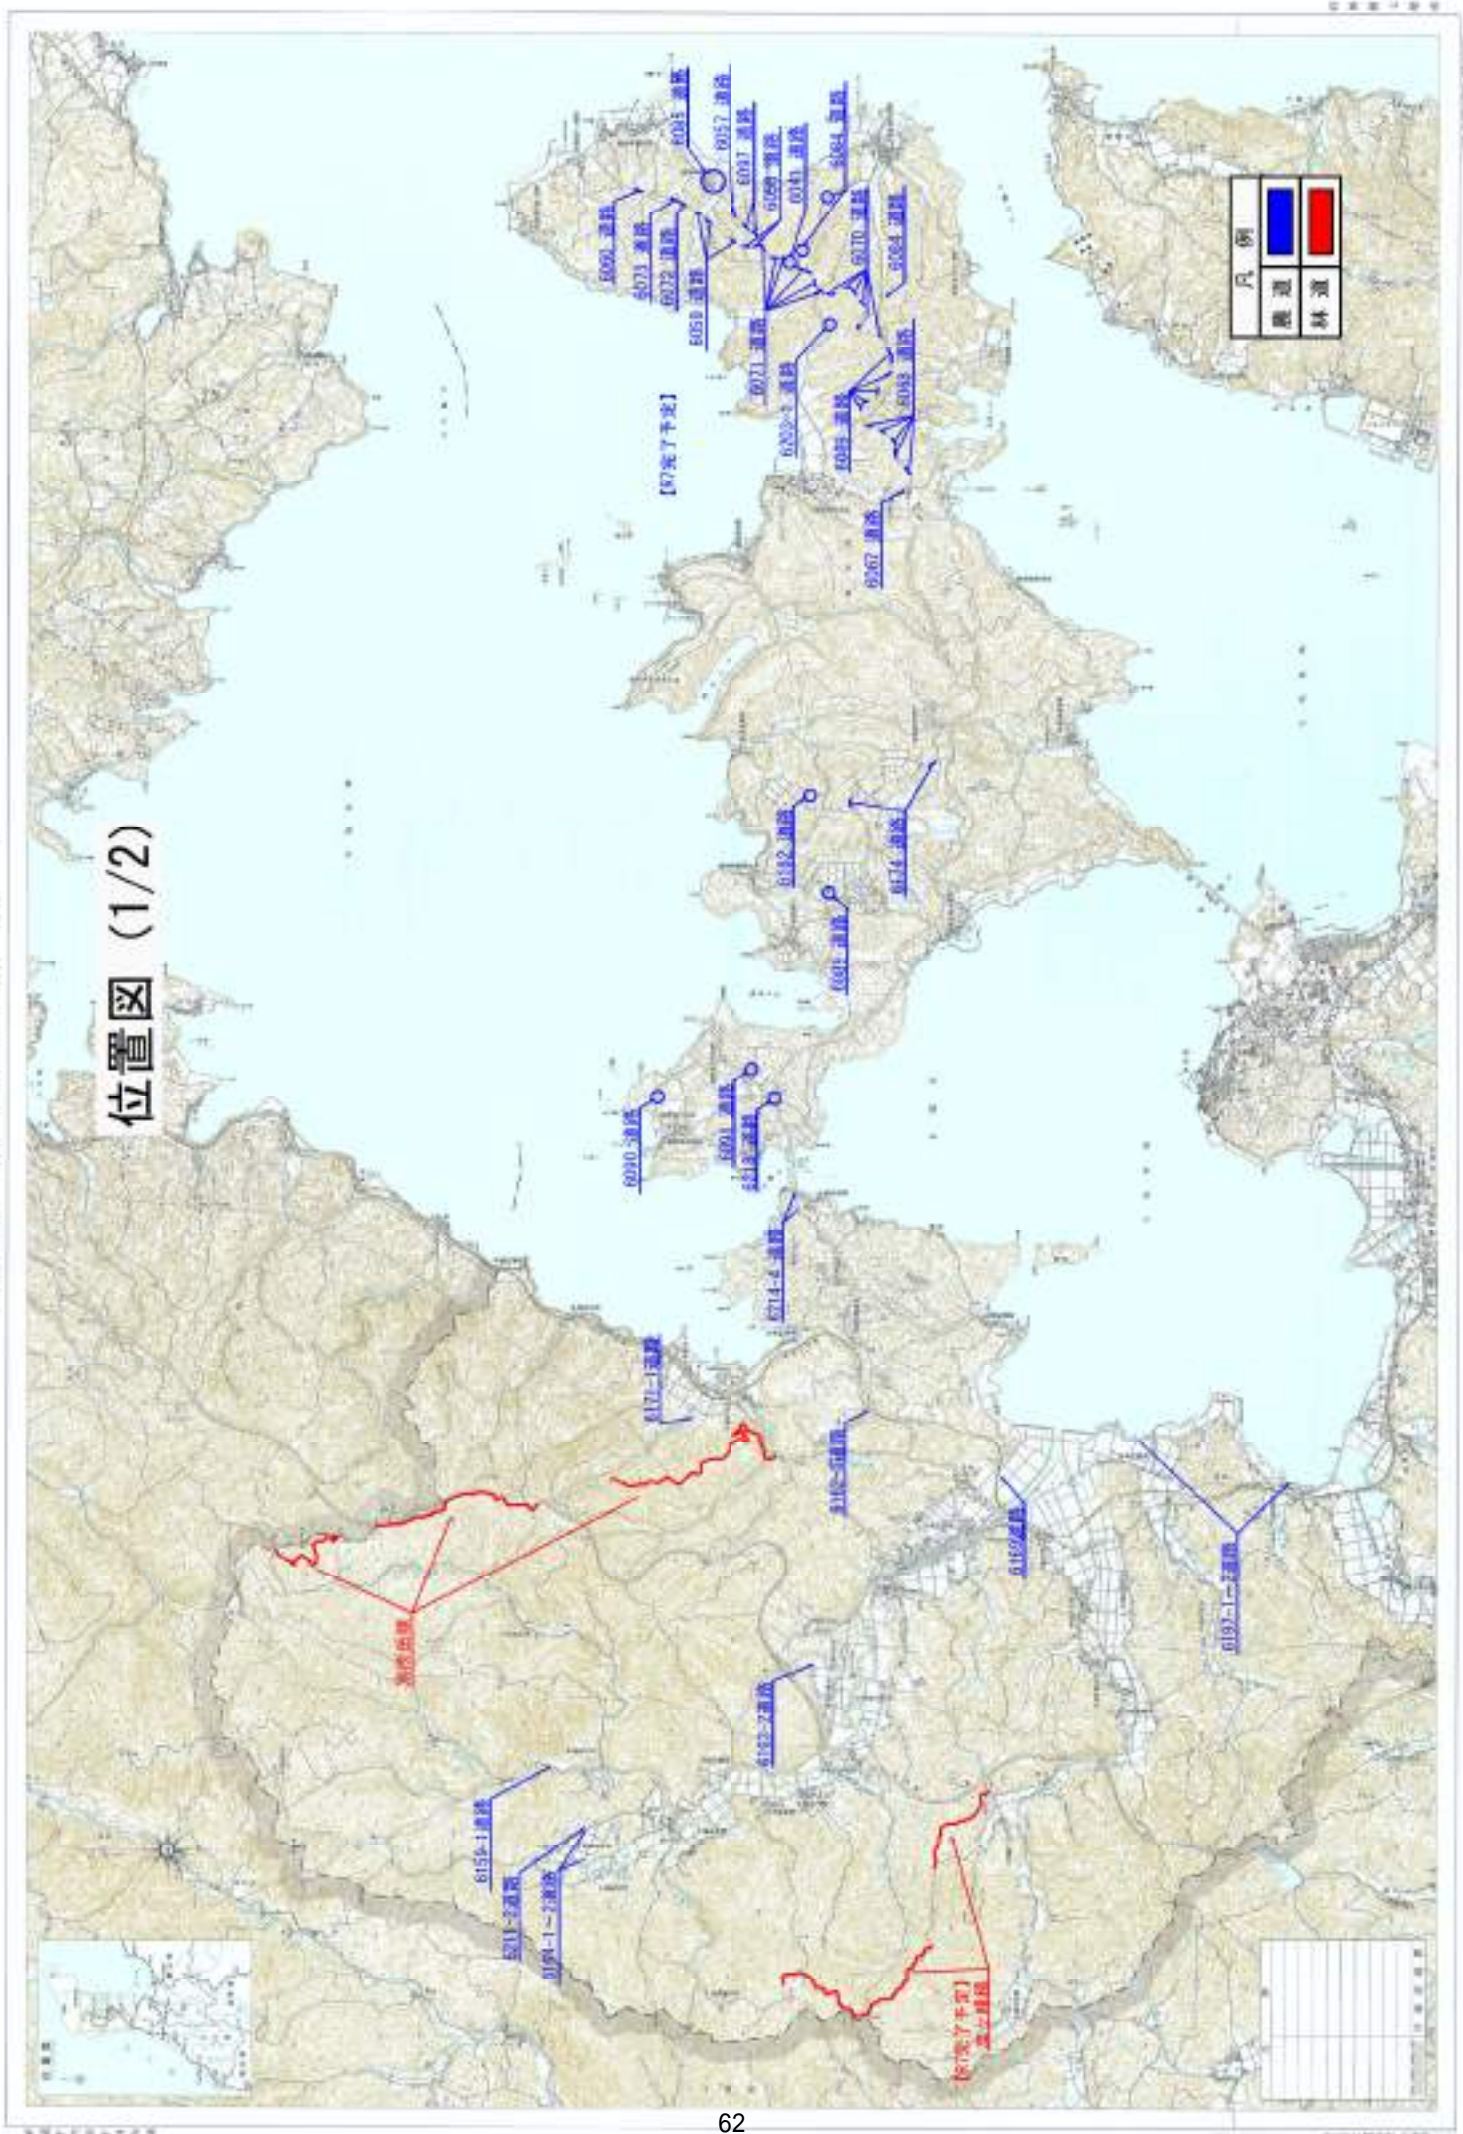

# 位置圖 (2/2)

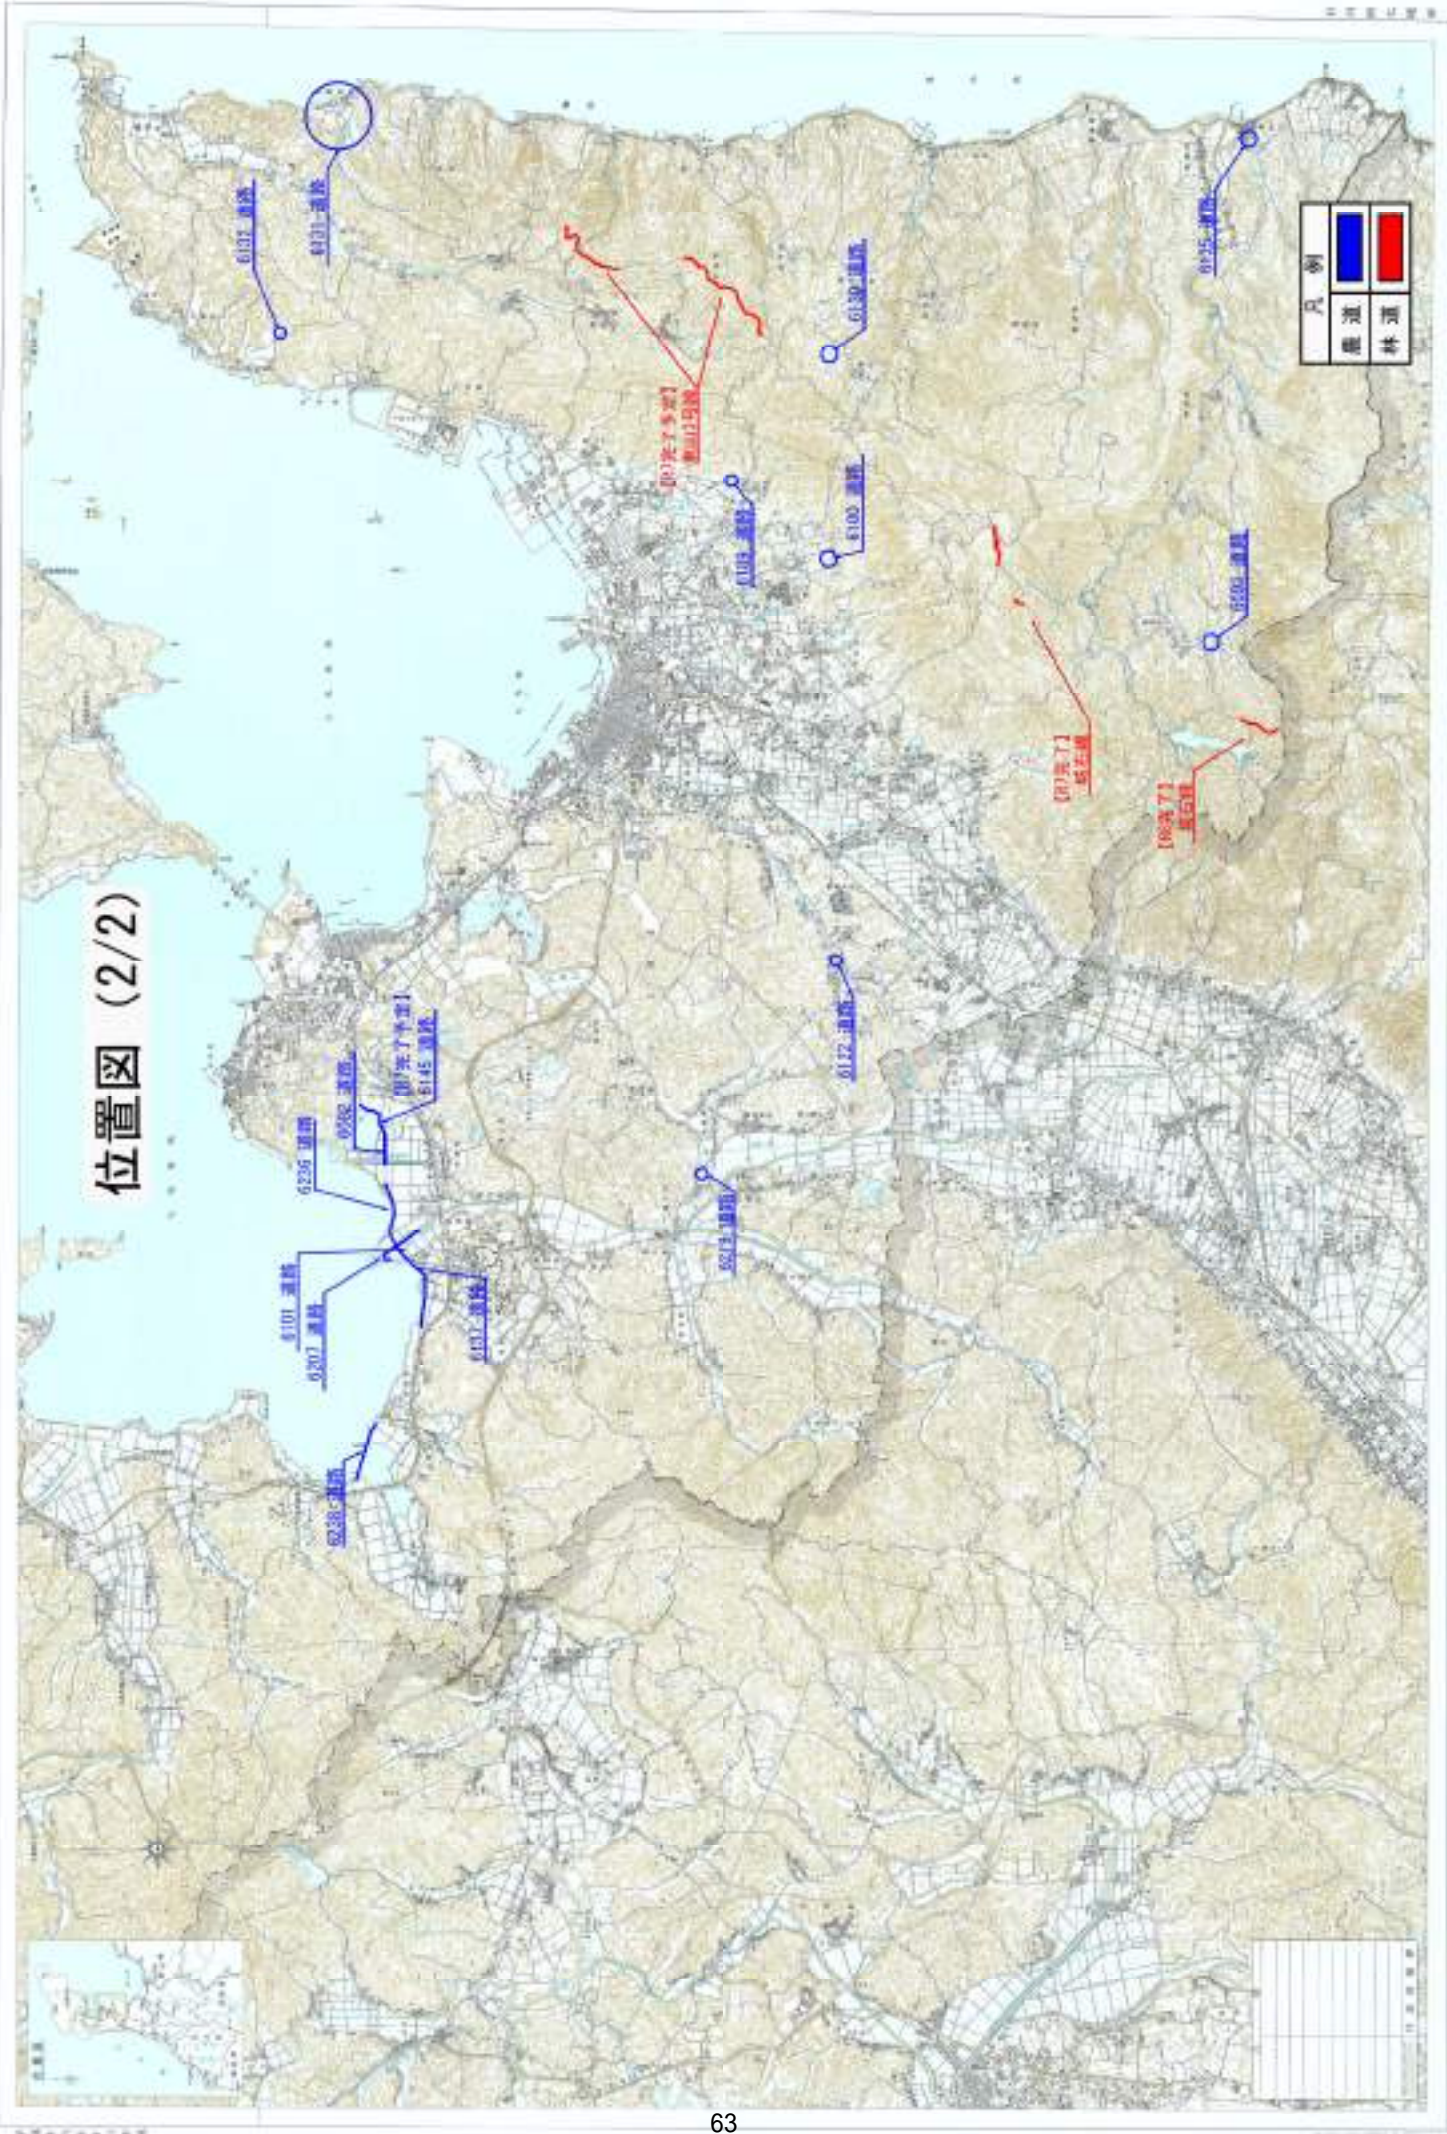

## 再建を目指す事業者への支援

**【取組・施策】** 地域経済の主要な担い手である中小企業者に対し、迅速かつ多様な支援を実施するとともに、国、県、地域金融機関との密接な連携の下、事業者の円滑な事業再建を図る。

### ■ 営業再開支援補助金事業

**【 担当課: 産業振興課 】**

**【事業内容】** 被災事業者の早期営業再開を支援するために、県と連携して営業再開に必要な仮施設などの整備に係る経費を助成する。

**【事業期間】** 令和7年度～令和8年度



### ■ 七尾市雇用維持支援事業

**【 担当課: 産業振興課 】**

**【事業内容】** 営業再開に向けて一定数の従業員を維持していく必要がある事業者へ営業再開までの期間における人件費負担の軽減を目的とした支援を行う。

**【事業期間】** 令和7年度～令和9年度



## ■ 雇用確保支援補助金事業

【 担当課: 産業振興課 】

【事業内容】 雇用調整助成金（令和7年1月1日からの能登半島地震豪雨・半島過疎臨時特例）及び産業雇用安定助成金（災害特例人材確保支援コース）の上乗せ支援を行う。

【事業期間】 令和7年度～令和9年度



|               | 短期      | 中期     |    | 長期  |     |     |
|---------------|---------|--------|----|-----|-----|-----|
|               | R7      | R8     | R9 | R10 | R11 | R12 |
| ① 営業再開支援補助金事業 | ▶       |        |    |     |     |     |
| (事業費：千円)      | 10,000  | 10,000 |    |     |     |     |
| ② 七尾市雇用維持支援事業 | ▶       |        |    |     |     |     |
| (事業費：千円)      | 36,000  | 15,000 | 未定 |     |     |     |
| ③ 雇用確保支援補助金事業 | ▶       |        |    |     |     |     |
| (事業費：千円)      | 481,089 | 40,264 | 未定 |     |     |     |

## 商業、商店街の再建や賑わい創出への支援

**【取組・施策】** 地震の被害により被災した地域における店舗、施設及び経済活動の機能回復を図るため、商店や商店街に対し迅速な支援を行うとともに、人々が集い交流する「にぎわい」を創出するための包括的な支援を展開し、地域商業の再生を推進する。

### ■ 商工融資資金信用保証料支援事業費

**【 担当課: 産業振興課 】**

**【事業内容】** 災害からの事業再建に取り組む事業者に対して、石川県保証協会の保証を得て融資を受けた際の信用保証料を助成する。

**【事業期間】** 令和7年度～令和11年度



### ■ なりわい再生支援事業費

**【 担当課: 産業振興課 】**

**【事業内容】** 災害からの事業再建に取り組む事業者に対して、国・県と連携して事務所などの復旧に要する経費を助成する。

**【事業期間】** 令和7年度～



### ■ 商店街災害復旧事業補助金

**【 担当課: 産業振興課 】**

**【事業内容】** 被災した施設や設備の復旧に取り組む商店街組織に対して、県と連携して、共同施設の改修・建て替え費用を助成する。

**【事業期間】** 令和7年度～令和8年度



■ 官民連携まちなか再生推進事業補助金

【 担当課: 企画政策課 】

【事業内容】 地区の復興計画に記載されている事業の効果を検証するため、社会実験を行う経費を助成する。  
(和倉地区、御祓地区)

【事業期間】 令和8年度



|                    | 短期                            | 中期     |    | 長期  |     |     |
|--------------------|-------------------------------|--------|----|-----|-----|-----|
|                    | R7                            | R8     | R9 | R10 | R11 | R12 |
| ①商工融資資金信用保証料支援事業費  | [Progress bar from R7 to R11] |        |    |     |     |     |
| (事業費：千円)           | 20,000                        | 5,450  | 未定 | 未定  | 未定  |     |
| ②なりわい再生支援事業費       | [Progress bar from R7 to R12] |        |    |     |     |     |
| (事業費：千円)           | 100,000                       | 50,000 | 未定 | 未定  | 未定  | 未定  |
| ③商店街災害復旧事業補助金      | [Progress bar from R7 to R8]  |        |    |     |     |     |
| (事業費：千円)           | 1,500                         | 797    |    |     |     |     |
| ④官民連携まちなか再生推進事業補助金 | [Progress bar from R8 to R9]  |        |    |     |     |     |
| (事業費：千円)           |                               | 10,000 |    |     |     |     |

# 4

## なりわい再建プロジェクト

### 被災した農業用機械や施設の修理、再生整備支援

**【取組・施策】** 地震により被害を受けた農林水産業者に対し、営農再開と経営の継続を目的として、国および県と連携の上、財政的・技術的な支援を実施することで、早期復旧・復興を推進する。

#### ■ 農業用機械・農業施設修繕支援事業

**【担当課:** 農林水産課 **】**

**【事業内容】** 令和6年能登半島地震により被災した農業者に対し、農産物の生産や加工に必要な施設や機械などの復旧・再取得などの費用を一部を補助する。

**【事業期間】** 令和7年度～令和8年度



#### ■ 木材加工流通施設復旧支援事業

**【担当課:** 農林水産課 **】**

**【事業内容】** 令和6年能登半島地震により被災した地域の林業・木材産業を回復し、生業の再建を図るため、被災した木材加工流通施設などの復旧・再取得などの費用を一部を補助する。

**【事業期間】** 令和7年度



■ 県漁協共同利用施設復旧事業

【 担当課: 農林水産課 】

【事業内容】 令和6年度能登半島地震により被災した、漁協の共同利用施設（荷捌き施設、製氷施設、給油施設）の復旧の費用を一部を補助する。

【事業期間】 令和6年度～令和8年度



|                   | 短期        | 中期      |    | 長期  |     |     |
|-------------------|-----------|---------|----|-----|-----|-----|
|                   | R7        | R8      | R9 | R10 | R11 | R12 |
| ①農業用機械・農業施設修繕支援事業 | ▶         |         |    |     |     |     |
| (事業費：千円)          | 1,080,000 | 900,000 |    |     |     |     |
| ②木材加工流通施設復旧支援事業   | ▶         |         |    |     |     |     |
| (事業費：千円)          | 178,600   |         |    |     |     |     |
| ③県漁協共同利用施設復旧事業    | ▶         |         |    |     |     |     |
| (事業費：千円)          | 13,140    | 37,400  |    |     |     |     |

## 能登ブランドの価値向上

【取組・施策】 能登の「里山里海」が有する多様な地域資源を最大限に活用し、高付加価値化を図ることで、農林漁業者の能登半島地震からの事業再建を促進する。

### ■ ブランド品目生産拡大加速事業

【 担当課: 農林水産課 】

【事業内容】 石川県がブランド化を進めている「ルビーロマン」の生産拡大や商品化率向上などに必要な施設及び機械の導入に対して支援を行う。

【百万石の極み生産拡大型】

【事業期間】 令和6年度～



### ■ 水産物産地流通強化対策事業

【 担当課: 農林水産課 】

【事業内容】 「いきいき七尾魚」や、「能登かき」、「能登ふぐ」に加えて、「トリガイ」や「七尾牡蠣」など新たな水産資源の掘り起こしとブランド化に対する補助を行う。

【事業期間】 令和6年度～






### ■ 能登野菜ブランド化事業

【 担当課: 農林水産課 】

【事業内容】 七尾の自然豊かな農地で栽培される能登野菜などのブランド力の向上に対する負担金を支出する。

【事業期間】 令和6年度～



|                                  | 短期   | 中期  |     | 長期  |     |     |
|----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                  | R7   | R8  | R9  | R10 | R11 | R12 |
| <b>①ブランド品<br/>目生産拡大加<br/>速事業</b> |  |     |     |     |     |     |
| (事業費：千円)                         | 339  | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| <b>②水産物産地<br/>流通強化対策<br/>事業</b>  |  |     |     |     |     |     |
| (事業費：千円)                         | 900  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| <b>③能登野菜ブ<br/>ランド化事業</b>         |  |     |     |     |     |     |
| (事業費：千円)                         | 231  | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |

## 4 なりわい再建プロジェクト

### 事業承継の推進

**【取組・施策】** 地震災害の影響や高齢化の進展下において、中小企業・小規模事業者が長年培ってきた技術、ノウハウ、雇用などの貴重な経営資源を途絶えさせることなく、事業承継を円滑かつ計画的に推進する取組みを構築する。

#### ■ 事業承継推進事業

**【担当課:** 産業振興課 **】**

**【事業内容】** 市内中小企業者で事業承継を行う者に対し、事業承継計画書の策定や企業価値の算定などに係る経費を助成する。

**【事業期間】** 令和6年度～



#### ■ 創業者支援事業費

**【担当課:** 産業振興課 **】**

**【事業内容】** 七尾創業応援カルテットと連携し、創業塾、専門家による個別相談会、創業セミナーなどを開催し、新規創業者を支援及び起業に必要な事務所の整備費などを支援する。

**【事業期間】** 令和6年度～



|                  | 短期     | 中期    |        | 長期     |        |        |
|------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                  | R7     | R8    | R9     | R10    | R11    | R12    |
| <b>①事業承継推進事業</b> | ▶      |       |        |        |        |        |
| (事業費：千円)         | 500    | 250   | 500    | 500    | 500    | 500    |
| <b>②創業者支援事業費</b> | ▶      |       |        |        |        |        |
| (事業費：千円)         | 10,750 | 5,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |



## なりわい再建プロジェクト

### 持続可能な地域経済の復興

**【取組・施策】** 人口減少や高齢化などの構造的な課題に対応しつつ、災害からの教訓を踏まえた強靱性を備え、将来にわたって地域住民の雇用と所得を確保できる自立的な経済構造の再構築を目指す。

#### ■ 広域的な経済復興推進事業

**【担当課:** 産業振興課 **】**

**【事業内容】** 「能登経済復興広域連携協議会」が取り組む、支援団体の支援力強化、地域基盤・稼ぐ力強化、および戦略的情報発信の実施などに対する支援。

**【事業期間】** 令和8年度～



※能登4市5町の商工会議所、商工会が中心となって設立した協議体のこと

#### ■ 企業誘致促進事業

**【担当課:** 産業振興課 **】**

**【事業内容】** 震災からの復旧・復興を見据えた企業誘致を後押しするため、工業団地の造成に取り組む

**【事業期間】** 令和6年度～



|               | 短期     | 中期                            |       | 長期    |       |       |
|---------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|               | R7     | R8                            | R9    | R10   | R11   | R12   |
| ①広域的な経済復興推進事業 |        | [Progress bar from R8 to R12] |       |       |       |       |
| (事業費：千円)      |        | 4,400                         | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| ②企業誘致促進事業     |        | [Progress bar from R7 to R12] |       |       |       |       |
| (事業費：千円)      | 10,000 |                               | 未定    | 未定    | 未定    | 未定    |

## 和倉温泉創造的復興プランの実現

【取組・施策】 和倉温泉街における多様な魅力創出とエリア機能の強化を図り、能登地域の交流拠点となることを目指した具体的事業の実現に向け、必要な支援を実施する。

## ■ 湯っ足りパーク整備事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 ウォーターフロントの魅力向上のため、足湯施設のほか、七尾湾や能登島を見渡せる海岸公園として整備する。

【事業期間】 令和7年度



## ■ 和倉温泉復興応援救済支援事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 和倉温泉旅館協同組合に対し復興イベントの開催や宿泊客数回復のための施策への支援を行う。

【事業期間】 令和7年度～令和10年度



## ■ 和倉温泉復興支援事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 和倉温泉創造的復興プランの実現に向けた実証実験や販わい創出事業に対する支援を行う。

【事業期間】 令和7年度～令和10年度



## ■ 和倉温泉エリア再整備事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 交流拠点となる(旧)シーサイドパークや湯っ足りりパークについて、地元との調整や事業化に向けた検討を行いながら、基本計画を策定し、和倉温泉エリアの更なる観光促進・地域の魅力向上に資するための再整備を進める。

【事業期間】 令和8年度～令和12年度



※イメージ図

## ■ 都市再生整備計画策定事業

【 担当課: 企画政策課 】

【事業内容】 和倉温泉の復興プロジェクト実施のため、事業の整備計画（5年）を策定する。

【事業期間】 令和8年度



※イメージ図

|                 | 短期                            | 中期     |        | 長期     |     |     |
|-----------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|
|                 | R7                            | R8     | R9     | R10    | R11 | R12 |
| ①湯っ足りりパーク整備事業   | [Progress bar from R7 to R8]  |        |        |        |     |     |
| (事業費：千円)        | 9,205                         |        |        |        |     |     |
| ②和倉温泉復興応援救済支援事業 | [Progress bar from R7 to R10] |        |        |        |     |     |
| (事業費：千円)        | 33,000                        | 33,000 | 33,000 | 33,000 |     |     |
| ③和倉温泉復興支援事業     | [Progress bar from R7 to R10] |        |        |        |     |     |
| (事業費：千円)        | 5,000                         | 5,800  | 5,800  | 5,800  |     |     |
| ④和倉温泉エリア再整備事業   | [Progress bar from R8 to R12] |        |        |        |     |     |
| (事業費：千円)        |                               | 31,614 | 未定     | 未定     | 未定  | 未定  |
| ⑤都市再生整備計画策定事業   | [Progress bar from R8 to R9]  |        |        |        |     |     |
| (事業費：千円)        |                               | 5,764  |        |        |     |     |

## 護岸の早期復旧によるまちなみの再生

【取組・施策】 地震により被災した和倉港の護岸について、早期の機能修復を実施することで、港湾施設の安全性を速やかに確保するとともに、美しい景観の再生を図る。

## ■ 和倉港整備事業費

【 担当課: 土木課 】

【事業内容】 震災により護岸が倒壊し、背後地の旅館などに甚大な被害が生じたことから国へ護岸復旧を要請する。現在市に代わって国が護岸復旧工事を実施中。  
護岸復旧工 延長 = 711m (令和6年度～)

【事業期間】 令和7年度～令和8年度



## ■ 過年発生港湾など災害復旧事業費

【 担当課: 土木課 】

【事業内容】 震災により護岸が倒壊し、背後地の旅館などに甚大な被害が生じたことから国へ護岸復旧を要請する。現在市に代わって国が護岸復旧工事を実施中。  
護岸復旧工 延長 = 343m (令和6年度～)

【事業期間】 令和7年度～令和8年度



|                  | 短期        | 中期      |    | 長期  |     |     |
|------------------|-----------|---------|----|-----|-----|-----|
|                  | R7        | R8      | R9 | R10 | R11 | R12 |
| ①和倉港整備事業費        | ▶         |         |    |     |     |     |
| (事業費：千円)         | 2,432,303 | 200,000 |    |     |     |     |
| ②過年発生港湾など災害復旧事業費 | ▶         |         |    |     |     |     |
| (事業費：千円)         | 1,710,572 |         |    |     |     |     |

## 5

## 和倉温泉創造的復興プロジェクト

## 復興に向けた誘客の促進

【取組・施策】 能登半島地震からの復興を目的とし、和倉温泉や能登島など市内宿泊施設への集客促進、地域への観光消費の拡大など、国や県と連携し、多角的な支援策を実施する。

## ■ 誘客促進事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 国や県と連携し、観光客や来訪者を対象とする観光需要喚起策を実施することで、市内への誘客を促進する。

【事業期間】 令和7年度～(県)



|          | 短期 | 中期 |    | 長期  |     |     |
|----------|----|----|----|-----|-----|-----|
|          | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| ①誘客促進事業  |    | ▶  |    |     |     |     |
| (事業費：千円) | 0  | 未定 | 未定 | 未定  |     |     |



## スポーツ・歴史文化で賑わい創出プロジェクト

【ハード事業】

### 観光施設や観光資源、スポーツ拠点施設の早期復旧

【担当課: スポーツ・文化課】

#### ■文化施設の復旧

【事業名称】 史跡七尾城跡災害復旧事業  
 明治の館（室木家住宅）災害復旧事業

【事業期間】 令和7年度～令和16年度  
 令和7年度～令和9年度

【事業内容】 被災した七尾城跡及び明治の館の施設などを復旧し、歴史的資産の保全と観光資源の再生を図る。

【事業概要】 七尾城跡の復旧 260,700 千円  
 明治の館の復旧 256,600 千円

【事業費】 517,300 千円

【復旧状況】 桜馬場北側下段の石垣内部が膨らみ、外側の石が前へ押し出されるはらみが生じ、園路沿いであるため、応急修理工事を行った。（R6）

復旧前



復旧後



#### 【事業スケジュール】

| 種別   | 令和7年度 |       | 令和8年度 |    | 令和9年度 |      | 令和10年度 |    | 令和11年度以降 |      |
|------|-------|-------|-------|----|-------|------|--------|----|----------|------|
| 七尾城跡 | 工事    | 調査・設計 | 調査・設計 | 工事 | 調査・設計 | 工事   | 調査・設計  | 工事 | 調査・設計    | 完了予定 |
| 明治の館 | 調査・設計 | 調査・設計 | 工事    | 工事 | 工事    | 完了予定 | —      | —  | —        | —    |

#### 【進捗状況】

| 項目   |     | 進捗率 |        | R7年度 |         |
|------|-----|-----|--------|------|---------|
| 七尾城跡 | 進捗額 | 9%  | 22,460 | 千円   | 260,700 |
|      | 全体額 |     |        |      |         |
| 明治の館 | 進捗額 | 5%  | 13,722 | 千円   | 256,600 |
|      | 全体額 |     |        |      |         |

【位置図】





## スポーツ・歴史文化で賑わい創出プロジェクト

【ハード事業】

### 観光施設や観光資源、スポーツ拠点施設の早期復旧

【担当課: スポーツ・文化課】

#### ■ 運動公園の復旧

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>【事業名称】</b> 運動公園の復旧整備 | <b>【事業期間】</b> 令和7年度～令和8年度 |
| 屋内スポーツ施設の復旧整備           | 令和7年度～令和8年度               |
| 屋外スポーツ施設の復旧整備           | 令和7年度～令和8年度               |

**【事業内容】** 被災した運動公園施設・屋内スポーツ施設・屋外スポーツ施設を復旧し、市民の健康増進や交流の場としての機能の早期回復を図る。

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>【事業概要】</b> 運動公園の復旧 | 3 箇所 |
| 屋内スポーツ施設の復旧           | 6 箇所 |
| 屋外スポーツ施設の復旧           | 1 箇所 |

**【事業費】** 849,194 千円

**【復旧状況】** (代表的な復旧箇所)

復旧前



復旧後




【事業スケジュール】

| 種別               | 令和7年度 |    | 令和8年度 |          | 令和9年度 |   | 令和10年度 |   | 令和11年度以降 |   |
|------------------|-------|----|-------|----------|-------|---|--------|---|----------|---|
|                  | 工事    | 工事 | 工事    | 完了<br>予定 | —     | — | —      | — | —        | — |
| 運動公園             | 工事    | 工事 | 工事    | 完了<br>予定 | —     | — | —      | — | —        | — |
| 屋内<br>スポーツ<br>施設 | 工事    | 工事 | 工事    | 完了<br>予定 | —     | — | —      | — | —        | — |
| 屋外<br>スポーツ<br>施設 | 工事    | 工事 | 工事    | 完了<br>予定 | —     | — | —      | — | —        | — |

【進捗状況】

| 項目               |         | 進捗率 | R7年度 |    |
|------------------|---------|-----|------|----|
| 運動公園             | 整備済箇所数  | 0%  | 0    | 箇所 |
|                  | 整備予定箇所数 |     | 3    | 箇所 |
| 屋内<br>スポーツ<br>施設 | 整備済箇所数  | 0%  | 0    | 箇所 |
|                  | 整備予定箇所数 |     | 6    | 箇所 |
| 屋外<br>スポーツ<br>施設 | 整備済箇所数  | 0%  | 0    | 箇所 |
|                  | 整備予定箇所数 |     | 1    | 箇所 |

【位置図】

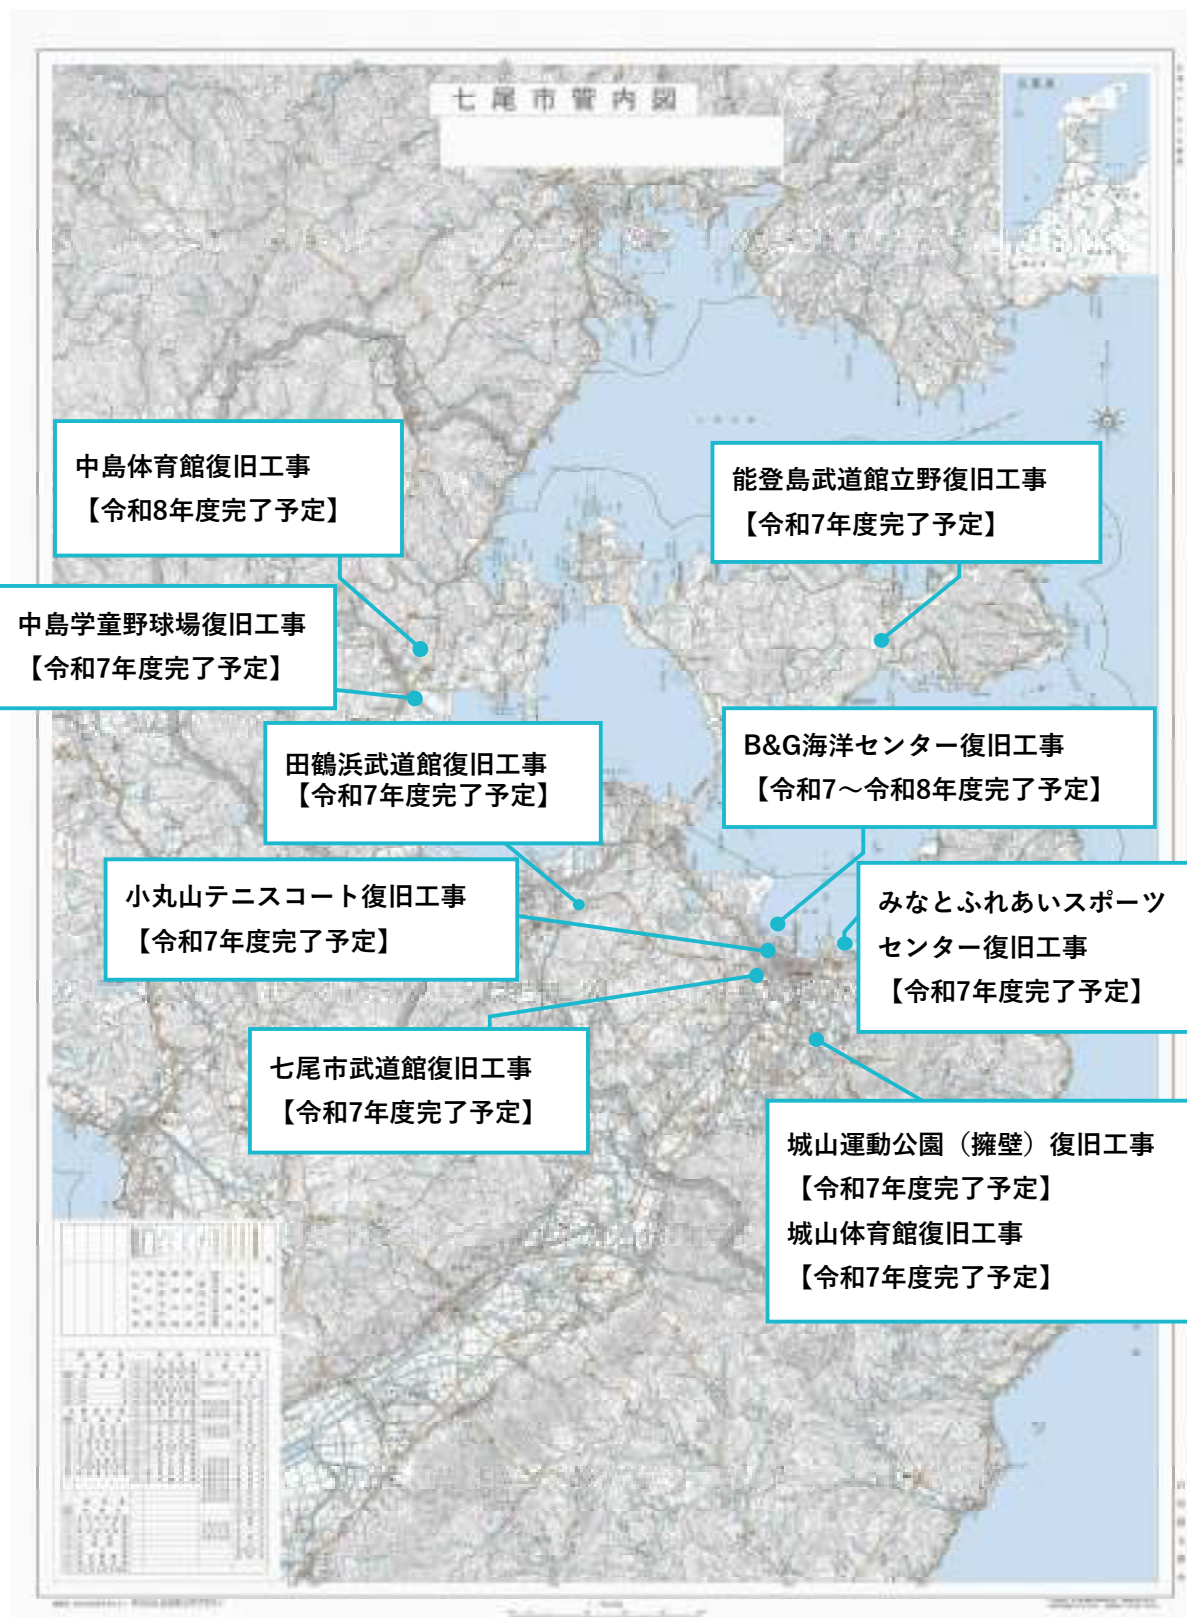




【事業スケジュール】

| 種別                | 令和7年度     |           | 令和8年度    |          | 令和9年度 |   | 令和10年度 |   | 令和11年度以降 |   |
|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|-------|---|--------|---|----------|---|
|                   | 工事        | 工事        | 完了<br>予定 | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 和倉以外<br>観光施設      | 工事        | 工事        | 完了<br>予定 | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 和倉温泉<br>運動公園      | 工事        | 工事        | 工事       | 完了<br>予定 | —     | — | —      | — | —        | — |
| 湯っ足り<br>パーク       | 工事        | 工事        | 完了<br>予定 | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 和倉温泉<br>お祭り会<br>館 | 調査・<br>設計 | 調査・<br>設計 | 工事       | 完了<br>予定 | —     | — | —      | — | —        | — |

【進捗状況】

| 項目                |       | 進捗率 |  | R7年度 |    |
|-------------------|-------|-----|--|------|----|
| 和倉以外<br>観光施設      | 復旧施設数 | 67% |  | 6    | 箇所 |
|                   | 被災施設数 |     |  | 9    | 箇所 |
| 和倉温泉<br>運動公園      | 復旧施設数 | 33% |  | 1    | 箇所 |
|                   | 被災施設数 |     |  | 3    | 箇所 |
| 湯っ足り<br>パーク       | 復旧施設数 | 0%  |  | 0    | 箇所 |
|                   | 被災施設数 |     |  | 1    | 箇所 |
| 和倉温泉<br>お祭り会<br>館 | 復旧施設数 | 0%  |  | 0    | 箇所 |
|                   | 被災施設数 |     |  | 1    | 箇所 |

【位置図】

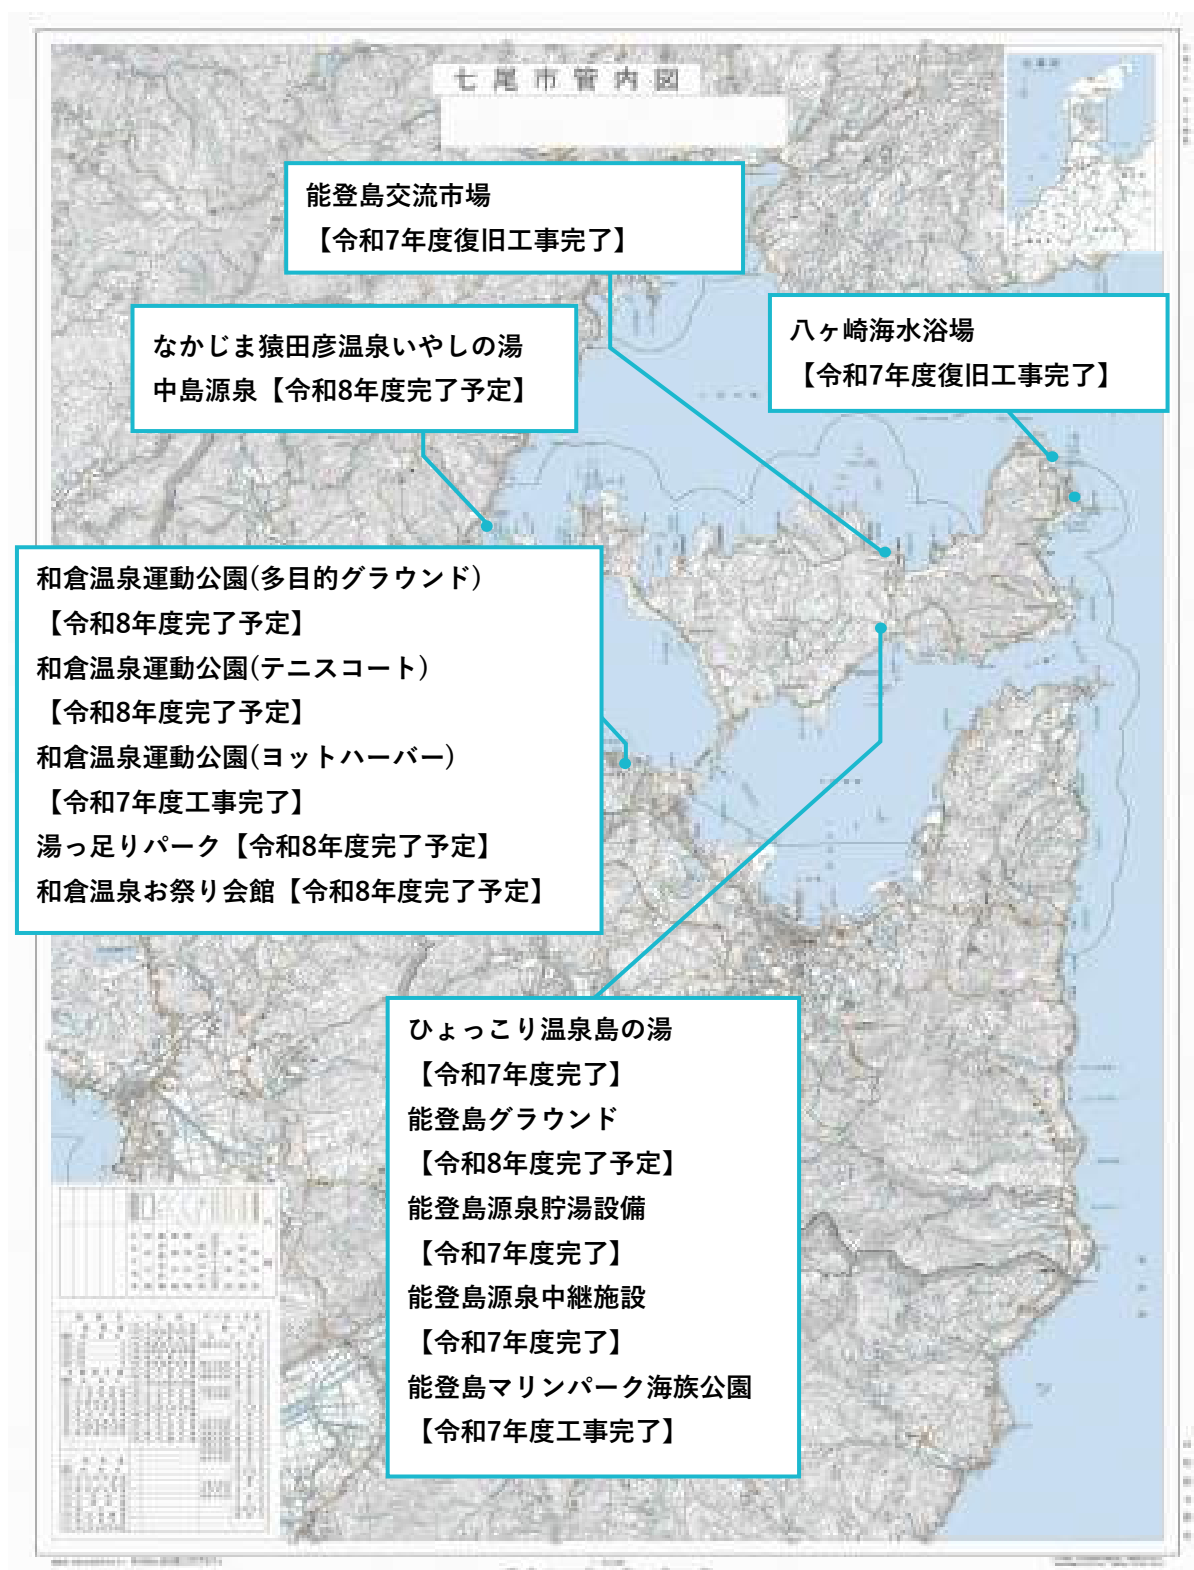



## 6 スポーツ・歴史文化で賑わい創出プロジェクト

### 新たな合宿や体験型旅行の誘致

**【取組・施策】** 能登地域固有の魅力および震災からの経験を活用し、教育旅行などの体験型観光の受入体制を強化するとともに、新たなスポーツ合宿などの誘致に積極的に取り組み、交流人口の拡大を図る。

#### ■ 合宿など誘致事業

【 担当課: 交流推進課 】

**【事業内容】** 交流人口を拡大するため、小中高大学などの合宿、スポーツ大会、コンベンション及び教育旅行の誘致を行う。

**【事業期間】** 令和6年度～



#### ■ 海外誘客プロモーション事業

【 担当課: 交流推進課 】

**【事業内容】** 市の認知度を高めインバウンド誘客を促進するため、国外向けの観光プロモーション活動を展開する。

**【事業期間】** 令和7年度～



#### ■ 教育旅行向け震災学習プログラム造成事業

【 担当課: 交流推進課 】

**【事業内容】** 震災の教訓や復興の歩みを学ぶ体験プログラムを開発することで、防災意識を育むとともに、教育旅行の誘致を通じて地域の活性化と風化防止を目指す。

**【事業期間】** 令和7年度～



## ■七尾パワーフード推進事業

【 担当課: 交流推進課 】

**【事業内容】** 復興後の合宿やスポーツ大会誘致における競争力を高めるため、プロスポーツチームと連携し、「食」をテーマにした独自のメニュー開発により、地域の新たな魅力として定着を図る。

**【事業期間】** 令和8年度～令和10年度



|                             | 短期    | 中期     |        | 長期     |     |     |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
|                             | R7    | R8     | R9     | R10    | R11 | R12 |
| <b>①合宿など誘致事業</b>            | ▶     |        |        |        |     |     |
| (事業費：千円)                    | 493   | 2,493  | 未定     | 未定     | 未定  | 未定  |
| <b>②海外誘客プロモーション事業</b>       | ▶     |        |        |        |     |     |
| (事業費：千円)                    | 8,416 | 5,000  | 未定     | 未定     | 未定  | 未定  |
| <b>③教育旅行向け震災学習プログラム造成事業</b> | ▶     |        |        |        |     |     |
| (事業費：千円)                    | 391   | 160    | 未定     | 未定     |     |     |
| <b>④七尾パワーフード推進事業</b>        | ▶     |        |        |        |     |     |
| (事業費：千円)                    |       | 13,944 | 12,000 | 12,000 |     |     |



## スポーツ・歴史文化で賑わい創出プロジェクト

### スポーツイベントを活用した魅力づくりの推進

**【取組・施策】** 和倉温泉運動公園や能登島グラウンドといった主要スポーツ拠点を早期に復旧させ、機能回復を図るとともに、大規模スポーツ大会、合宿、および市民参加型イベントなどの誘致、開催、支援を推進し、交流人口の拡大を図る。

#### ■ 能登和倉国際女子オープンテニス開催事業

**【 担当課: 交流推進課 】**

**【事業内容】** ITFワールドテニスツアーの一環として和倉温泉運動公園テニスコートで開催する女子テニスの国際大会を開催する。

**【事業期間】** 令和8年度～



#### ■ プロスポーツイベント等活用事業

**【 担当課: 交流推進課 】**

**【事業内容】** 県内のプロスポーツチームと連携した取組みを実施することで交流人口の拡大を促進する。

**【事業期間】** 令和7年度～



#### ■ 大学スポーツ連携事業

**【 担当課: 企画政策課 】**

**【事業内容】** 大学アスリート選手と地域住民（小中学生）との交流事業を通じて、地域のにぎわいを創出する。

**【事業期間】** 令和7年度～



## ■ リフレッシュスポーツ祭事業

【 担当課: スポーツ・文化課 】

【事業内容】 学校や地域を超えたスポーツ体験や親子参加種目を通じて、児童生徒の交流と家庭の絆を深め、震災後の心身のリフレッシュと地域コミュニティの再生を図る。

【事業期間】 令和8年度



|                      | 短期    | 中期    |       | 長期    |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      | R7    | R8    | R9    | R10   | R11   | R12   |
| ①能登和倉国際女子オープンテニス開催事業 | ▶     |       |       |       |       |       |
| (事業費：千円)             | 0     | 7,794 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ②プロスポーツイベント等活用事業     | ▶     |       |       |       |       |       |
| (事業費：千円)             | 5,300 | 4,300 | 未定    | 未定    | 未定    | 未定    |
| ③大学スポーツ連携事業          | ▶     |       |       |       |       |       |
| (事業費：千円)             | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ④リフレッシュスポーツ祭事業       | ▶     |       |       |       |       |       |
| (事業費：千円)             |       | 3,000 |       |       |       |       |



## スポーツ・歴史文化で賑わい創出プロジェクト

### 能登演劇堂などの文化施設の活用促進

**【取組・施策】** 創造的復興に向けて、地域資源である能登演劇堂や七尾市文化ホールなどの文化交流施設を効果的に活用し、文化活動の推進および地域間交流の促進を図る。

#### ■ 演劇のまち復興公演振興事業

**【 担当課:        スポーツ・文化課        】**

**【事業内容】**        令和6年能登半島地震復興能登限定公演  
演劇「肝っ玉お母と子供たち」の公演を5月30日から6月22日の20回、能登演劇堂にて上演した。

**【事業期間】** 令和7年度



#### ■ 「長谷川等伯展」開催事業

**【 担当課:        スポーツ・文化課        】**

**【事業内容】**        石川県七尾美術館にて、開館30周年記念・震災復興祈念として「長谷川等伯展」を開催し、20年ぶりに等伯筆・国宝「松林図屏風」を展示した。

**【事業期間】** 令和7年度



開会式(内覧会)風景  
国宝・松林図屏風（東京国立博物館蔵）前にて

#### ■ 演劇のまち振興団事業

**【 担当課:        スポーツ・文化課        】**

**【事業内容】**        能登演劇堂を拠点に演劇の力で市民の絆を深め、街に賑わいと活力を生み出す公演事業などの取組に対して補助する。

**【事業期間】** 令和8年度～令和12年度



「わが町」初回公演1998年

## ■美術館展覧会事業

【 担当課: スポーツ・文化課 】

**【事業内容】** 石川県七尾美術館及び石川県能登島ガラス美術館において各種展覧会を行うことで、市民の美術に対する知識を深めるとともに、郷土ゆかりの作品の周知及び交流人口の拡大を図る。

**【事業期間】** 令和8年度～令和12年度



左：長谷川等伯展

右：NON GLASS and GLASS 七美×ガラ美

|                | 短期     | 中期     |    | 長期  |     |     |
|----------------|--------|--------|----|-----|-----|-----|
|                | R7     | R8     | R9 | R10 | R11 | R12 |
| ①演劇のまち復興公演振興事業 | ▶      |        |    |     |     |     |
| (事業費：千円)       | 11,697 |        |    |     |     |     |
| ②「長谷川等伯展」開催事業  | ▶      |        |    |     |     |     |
| (事業費：千円)       | 25,513 |        |    |     |     |     |
| ③演劇のまち振興団事業    |        | ▶      |    |     |     |     |
| (事業費：千円)       |        | 49,995 | 未定 | 未定  | 未定  | 未定  |
| ④七尾美術館展覧会事業    |        | ▶      |    |     |     |     |
| (事業費：千円)       |        | 51,854 | 未定 | 未定  | 未定  | 未定  |



## 6 スポーツ・歴史文化で賑わい創出プロジェクト

### 周遊サイクリングロードの整備促進

**【取組・施策】** サイクルツーリズムによる地域誘客や住民の健康増進、生活利便性の向上などを目的として、地域内の魅力的な周遊ルートや広域連携ルートなどの整備を積極的に推進する。

#### ■ 周遊サイクリングロード整備事業

**【 担当課:** 交流推進課 **】**

**【事業内容】** 七尾湾や富山湾沿いの豊かな自然、美しい里山里海の景観などを堪能いただけるよう、サイクリストなどの受け入れ環境を整備する。

**【事業期間】** 令和7年度～令和12年度



|                  | 短期  | 中期 |    | 長期  |     |     |
|------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|
|                  | R7  | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| ①周遊サイクリングロード整備事業 | ▶   |    |    |     |     |     |
| (事業費：千円)         | 205 | 0  | 未定 | 未定  | 未定  | 未定  |

## 学校施設の早期復旧

【 担当課: 教育総務課 】

### ■ 学校施設の早期復旧

【事業名称】 田鶴浜小学校校舎改築災害復旧事業  
学校施設の災害復旧事業

【事業期間】 令和7年度～令和8年度  
令和6年度～令和7年度

【事業内容】 被災した学校施設を早期に復旧し、教育環境の安全確保と学習活動の継続を図るとともに、子どもたちの居場所を守る。

【事業概要】 田鶴浜小学校校舎の改築 1 箇所  
学校施設の復旧 12 箇所

【事業費】 4,461,749 千円

【復旧状況】 (代表的な復旧箇所)

復旧前



復旧後




【事業スケジュール】

| 種別                 | 令和7年度     |          | 令和8年度 |          | 令和9年度 |   | 令和10年度 |   | 令和11年度以降 |   |
|--------------------|-----------|----------|-------|----------|-------|---|--------|---|----------|---|
|                    |           |          |       |          |       |   |        |   |          |   |
| 田鶴浜<br>小学校<br>[改築] | 調査・<br>設計 | 工事       | 工事    | 完了<br>予定 | —     | — | —      | — | —        | — |
| 小丸山<br>小学校         | 工事        | 完了<br>予定 | —     | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 山王<br>小学校          | 完了        | —        | —     | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 天神山<br>小学校         | 工事        | 完了       | —     | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 東湊<br>小学校          | 完了        | —        | —     | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 石崎<br>小学校          | 完了        | —        | —     | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 和倉<br>小学校          | 完了        | —        | —     | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 田鶴浜<br>小学校<br>[復旧] | 工事        | 完了       | —     | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 中島<br>小学校          | 完了        | —        | —     | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 能登島<br>小学校         | 工事        | 完了       | —     | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 七尾東部<br>中学校        | 工事        | 完了<br>予定 | —     | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 能登香島<br>中学校        | 完了        | —        | —     | —        | —     | — | —      | — | —        | — |
| 中島<br>中学校          | 完了        | —        | —     | —        | —     | — | —      | — | —        | — |

【進捗状況】

| 項目                 |       | 進捗率  | R7年度 |    |
|--------------------|-------|------|------|----|
| 田鶴浜<br>小学校<br>[改築] | 復旧施設数 | 0%   | 0    | 箇所 |
|                    | 被災施設数 |      | 1    | 箇所 |
| 小丸山<br>小学校         | 復旧施設数 | 0%   | 0    | 箇所 |
|                    | 被災施設数 |      | 1    | 箇所 |
| 山王<br>小学校          | 復旧施設数 | 100% | 1    | 箇所 |
|                    | 被災施設数 |      | 1    | 箇所 |
| 天神山<br>小学校         | 復旧施設数 | 100% | 1    | 箇所 |
|                    | 被災施設数 |      | 1    | 箇所 |
| 東湊<br>小学校          | 復旧施設数 | 100% | 1    | 箇所 |
|                    | 被災施設数 |      | 1    | 箇所 |
| 石崎<br>小学校          | 復旧施設数 | 100% | 1    | 箇所 |
|                    | 被災施設数 |      | 1    | 箇所 |
| 和倉<br>小学校          | 復旧施設数 | 100% | 1    | 箇所 |
|                    | 被災施設数 |      | 1    | 箇所 |
| 田鶴浜<br>小学校<br>[復旧] | 復旧施設数 | 100% | 1    | 箇所 |
|                    | 被災施設数 |      | 1    | 箇所 |
| 中島<br>小学校          | 復旧施設数 | 100% | 1    | 箇所 |
|                    | 被災施設数 |      | 1    | 箇所 |
| 能登島<br>小学校         | 復旧施設数 | 100% | 1    | 箇所 |
|                    | 被災施設数 |      | 1    | 箇所 |
| 七尾東部<br>中学校        | 復旧施設数 | 0%   | 0    | 箇所 |
|                    | 被災施設数 |      | 1    | 箇所 |
| 能登香島<br>中学校        | 復旧施設数 | 100% | 1    | 箇所 |
|                    | 被災施設数 |      | 1    | 箇所 |
| 中島<br>中学校          | 復旧施設数 | 100% | 1    | 箇所 |
|                    | 被災施設数 |      | 1    | 箇所 |

【位置図】

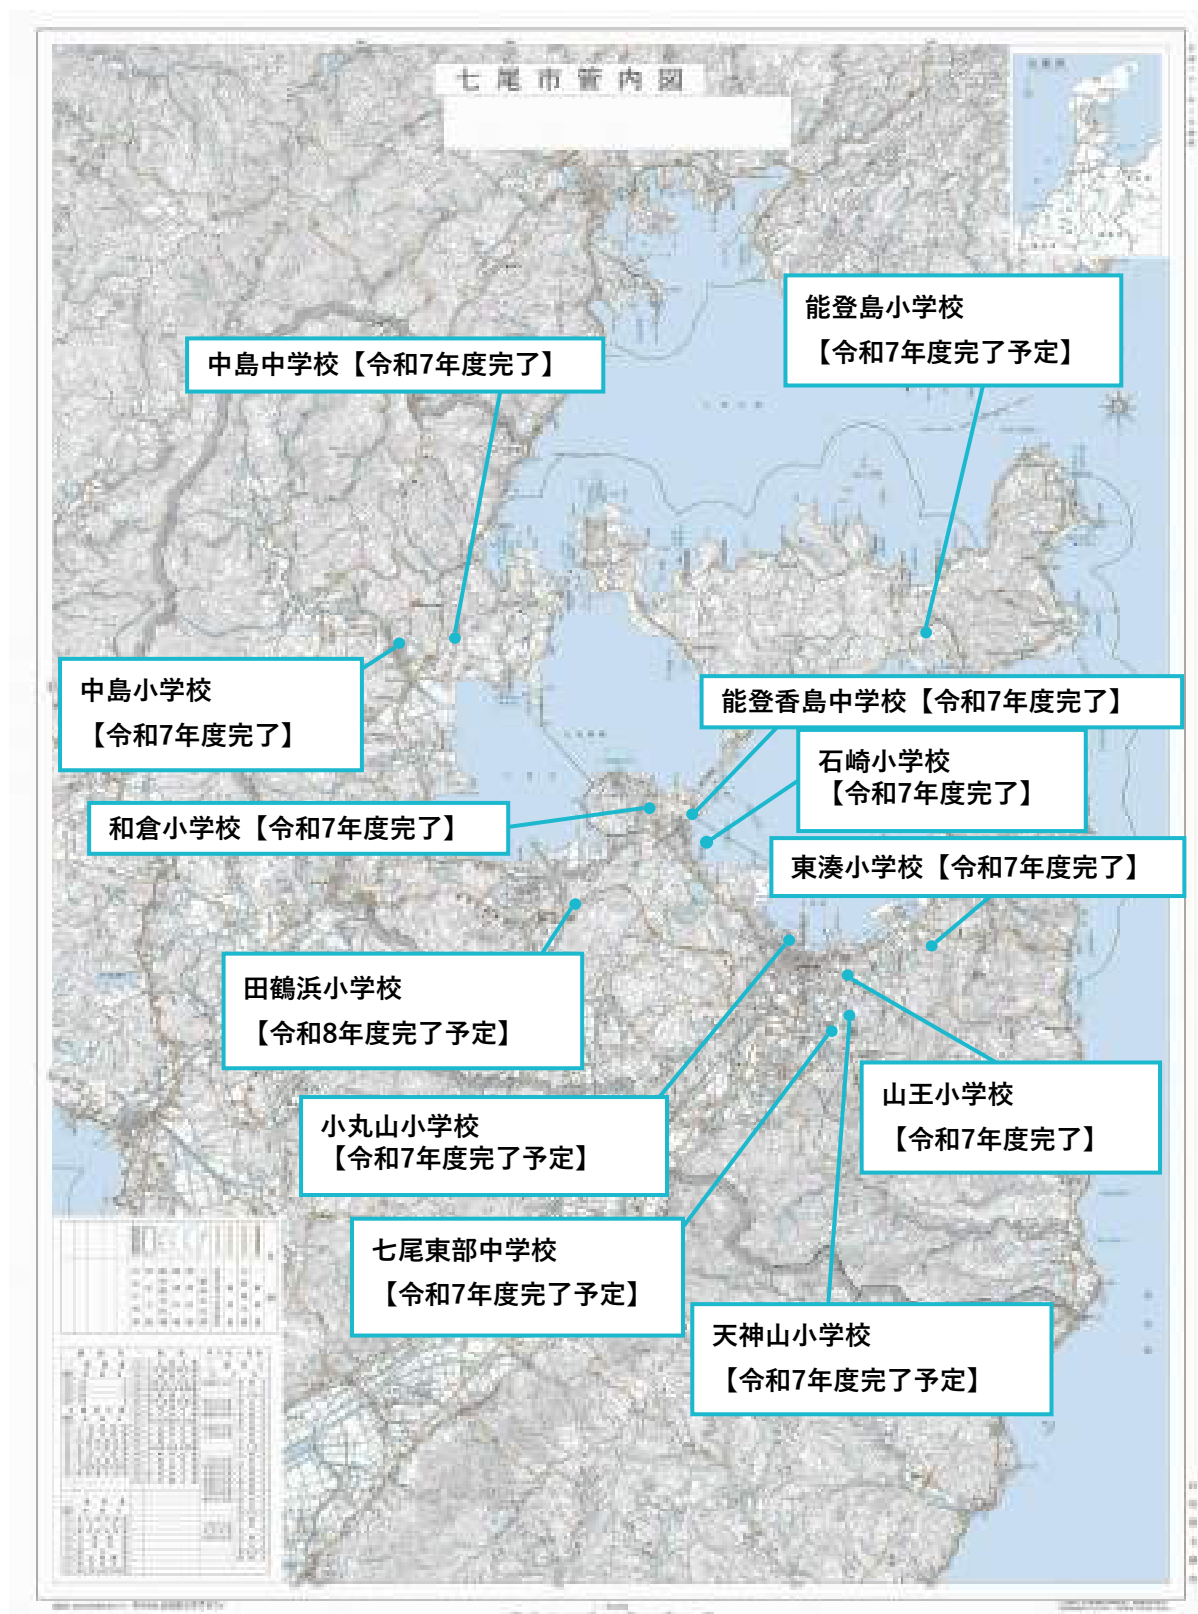

## 公園・緑地の機能強化

【 担当課: 子育て支援課 】

## ■ 主な公園・被災緑地の復旧・子どもの遊び場整備事業

## 【事業名称】

七尾市児童公園  
 能登歴史公園  
 能登島地区コミュニティセンター屋外広場  
 日和が丘カルチャーパーク  
 希望の丘公園

## 【事業期間】

令和7年度  
 令和7年度  
 令和7年度  
 令和7年度～令和8年度  
 令和9年度～令和10年度

【事業内容】 旧1市3町のそれぞれの地区に核となる公園の子どもの遊び場を整備する。

## 【事業概要】 被災した公園・緑地の概要

|                         |      |              |      |
|-------------------------|------|--------------|------|
| 七尾市児童公園                 | 1 箇所 | 日和が丘カルチャーパーク | 1 箇所 |
| 能登歴史公園                  | 1 箇所 | 希望の丘公園       | 1 箇所 |
| 能登島地区コミュニティ<br>センター屋外広場 | 1 箇所 |              |      |

【事業費】 506,035 千円

## 【復旧状況】 (代表的な復旧箇所)

復旧前



復旧後



※参考イメージ

【事業スケジュール】

| 種別                                      | 令和7年度     |          | 令和8年度 |          | 令和9年度     |    | 令和10年度 |          | 令和11年度以降 |   |
|---|-----------|----------|-------|----------|-----------|----|--------|----------|----------|---|
| 七尾市<br>児童公園                             | 工事        | 完了<br>予定 | —     | —        | —         | —  | —      | —        | —        | — |
| 能登<br>歴史公園                              | 工事        | 完了<br>予定 | —     | —        | —         | —  | —      | —        | —        | — |
| 能登島<br>地区<br>コミュ<br>ニティ<br>センター<br>屋外広場 | 工事        | 完了<br>予定 | —     | —        | —         | —  | —      | —        | —        | — |
| 日和が丘<br>カルチャ<br>ーパーク                    | 調査・<br>設計 | 工事       | 工事    | 完了<br>予定 | —         | —  | —      | —        | —        | — |
| 希望の丘<br>公園                              | —         | —        | —     | —        | 調査・<br>設計 | 工事 | 工事     | 完了<br>予定 | —        | — |

【進捗状況】

| 項目        |          | 進捗率 | R7年度 |    |
|-----------|----------|-----|------|----|
| 屋外<br>遊び場 | 復旧施設(箇所) | 0%  | 0    | 箇所 |
|           | 被災施設(箇所) |     | 5    | 箇所 |

【位置図】



## 子どもの屋内遊び場の整備

【 担当課: 子育て支援課 】

### ■子どもの遊び場整備

【事業名称】子どもの遊び場整備事業 【事業期間】 令和7年度～令和11年度

【事業内容】子どもの健やかな成長を支えるため、安全で多様な遊具や交流空間を整備し、地域の憩いと学びの場を創出する。

【事業概要】子どもの遊び場 1 箇所

【事業費】 2,000,495 千円

【整備場所】(候補地の一つ)

復旧前 (旧御祓中学校武道館・体育館)



復旧後




### 【事業スケジュール】

| 種別      | 令和7年度 |       | 令和8年度 |       | 令和9年度 |    | 令和10年度 |    | 令和11年度以降 |      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--------|----|----------|------|
| 子どもの遊び場 | 調査・設計 | 調査・設計 | 調査・設計 | 調査・設計 | 工事    | 工事 | 工事     | 工事 | 工事       | 完了予定 |

### 【進捗状況】

| 項目      |          | 進捗率 | R7年度 |    |
|---------|----------|-----|------|----|
| 子どもの遊び場 | 整備済(箇所)  | 0%  | 0    | 箇所 |
|         | 整備予定(箇所) |     | 1    | 箇所 |

【位置図】

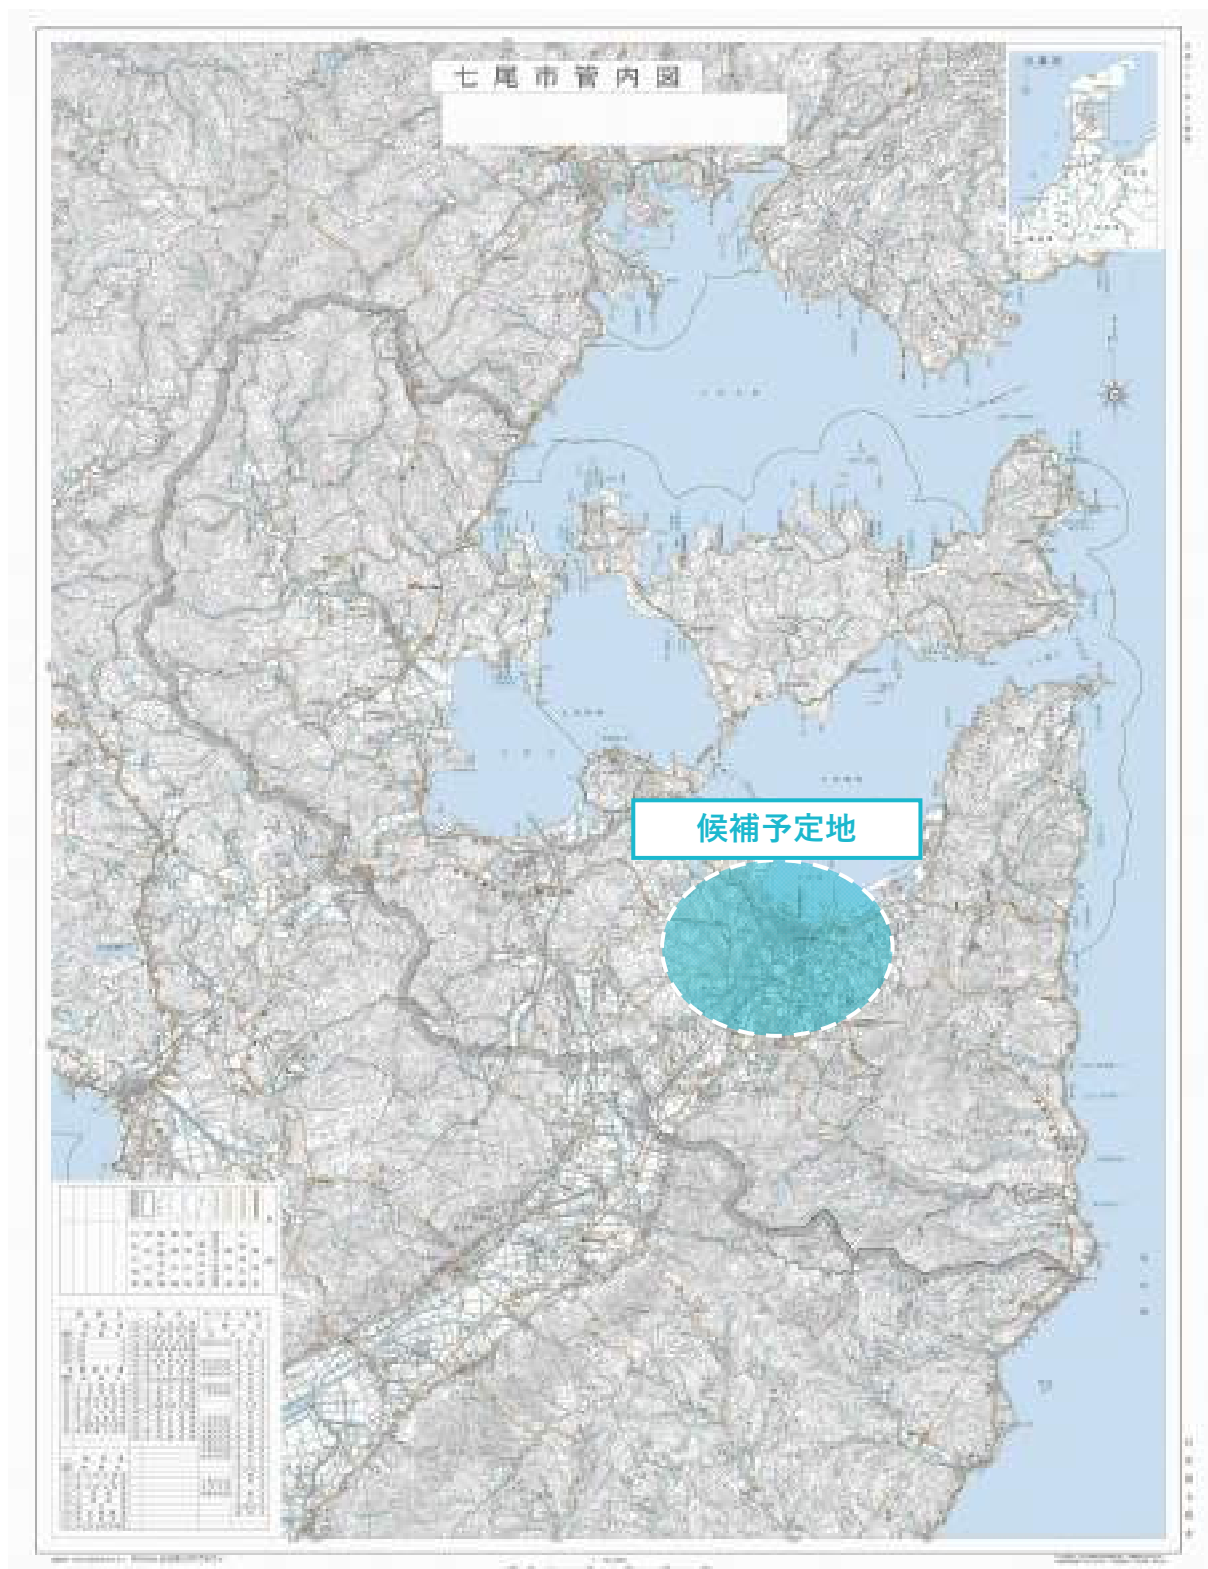

## 被災した子どもたちの心のケア

**【取組・施策】** 被災した子どもたちの心理的負担の軽減と回復を図ることを目的として、遊びの機会提供、学習スペースの設置など、子どもの居場所づくりに関する支援の充実に取り組む。

### ■被災した子どもの居場所づくり 支援体制強化事業

【担当課: 子育て支援課】

**【事業内容】** 子どもたちの心のケアを目的にNPO法人などと連携し、食事や遊びなどの機会を提供するなど、安心・安全に過ごせる子どもの居場所づくりを行う。

**【事業期間】** 令和7年度～令和8年度



|                                     | 短期     | 中期    |    | 長期  |     |     |
|-------------------------------------|--------|-------|----|-----|-----|-----|
|                                     | R7     | R8    | R9 | R10 | R11 | R12 |
| ①被災した<br>子どもの居場所<br>づくり支援<br>体制強化事業 | ▶      |       |    |     |     |     |
| (事業費：千円)                            | 15,000 | 5,000 |    |     |     |     |



# 7 未来を担うひとづくりプロジェクト

## ICT環境を活用した情報活用能力の育成

**【取組・施策】** 児童生徒一人1台端末やインターネット環境を整備することにより、次代を担う子どもたちの自発的な学習環境を充実させるとともに、校務におけるDXの推進による教職員の業務改善により、児童生徒に対する指導時間の確保を図る。

### ■ 児童生徒学習用ICT環境の整備 【 担当課: 教育総務課 】


**【事業内容】** 児童生徒一人1台端末の整備と校内ネットワークの構築により、効果的な学習環境を確保するとともに、インターネット環境の快適化を図ることにより、多様で深化した学習ニーズに応えられる学習基盤を提供する。



**【事業期間】** 令和6年度～

### ■ DXによる教職員の多忙化の改善 【 担当課: 教育総務課 】

**【事業内容】** 校務支援システムの適正管理を行うとともに、生成AIの習得を促進することにより教職員の業務の軽減を図る。また、中学校の教職員に向けて、「デジタル採点支援システム（名称：百問繚乱）」を導入し、テストの採点・集計・分析などにかかる時間を削減する。



**【事業期間】** 令和6年度～

|                  | 短期      | 中期      |    | 長期  |     |     |
|------------------|---------|---------|----|-----|-----|-----|
|                  | R7      | R8      | R9 | R10 | R11 | R12 |
| ①児童生徒学習用ICT環境の整備 | ▶       |         |    |     |     |     |
| (事業費：千円)         | 210,928 | 157,916 | 未定 | 未定  | 未定  | 未定  |
| ②DXによる教職員の多忙化の改善 | ▶       |         |    |     |     |     |
| (事業費：千円)         | 36,204  | 36,271  | 未定 | 未定  | 未定  | 未定  |

## 女性活躍、男女共同参画推進のための人材育成支援

【取組・施策】 女性の活躍推進および男女共同参画社会の実現に資するため、指導的役割を担う人材の育成に向けた支援に取り組む。

## ■ 男女共同参画事業

【担当課: 総務課】

【事業内容】 男女共同参画推進員を委嘱し、地域での啓発活動、講演会、学習会などへの参加による自己啓発を促す。  
女性団体運営補助により、団体の主体性を活かした活動を推進する。

【事業期間】 令和6年度～



## ■ 女性の多様な働き方支援事業

【担当課: 産業振興課】

【事業内容】 テレワークスキルアップ講座の開催など女性が自分らしく働き続けられる環境づくりにより、企業の成長人手不足解消を支え、地域の活気と「住み続けたい街」としての魅力を高める好循環をつくる。

【事業期間】 令和8年度～



|                | 短期 | 中期    |       | 長期    |       |       |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | R7 | R8    | R9    | R10   | R11   | R12   |
| ①男女共同参画事業      | ▶  |       |       |       |       |       |
| (事業費：千円)       | 86 | 86    | 95    | 95    | 95    | 95    |
| ②女性の多様な働き方支援事業 | ▶  |       |       |       |       |       |
| (事業費：千円)       |    | 7,335 | 7,335 | 7,335 | 7,335 | 7,335 |

## 市内企業が求める人材の育成

**【取組・施策】** 七尾市教育大綱の基本目標である「ふるさと七尾を愛し誇りに思い、輝く未来を切り拓く人づくり」を推進し、将来に向けて地元企業への定着やUターン就職によりふるさとで活躍できる人材の育成を図る。

### ■ ふるさと七尾SDGs教育の推進

**【事業内容】** 七尾城跡、長谷川など伯と水墨画など、当市が有する文化・歴史資源を積極的に活用し「ふるさと七尾の学び」について児童生徒が探求と体験によって取り組むことにより、ふるさと七尾を愛し誇りに思う人材の育成を図る。

**【担当課:** 学校教育課 **】**

**【事業期間】** 令和6年度～



### ■ キャリア教育の推進

**【事業内容】** 地元企業における中学2年生の職場体験「わく・ワーク体験」の実施により仕事への理解を深め、将来のキャリア形成を考えるきっかけとするとともに、地元企業への愛着をつくる。

**【担当課:** 教育総務課 **】**

**【事業期間】** 令和6年度～



|                  | 短期    | 中期    |    | 長期  |     |     |
|------------------|-------|-------|----|-----|-----|-----|
|                  | R7    | R8    | R9 | R10 | R11 | R12 |
| ①ふるさと七尾SDGs教育の推進 | ▶     |       |    |     |     |     |
| (事業費：千円)         | 3,684 | 2,666 | 未定 | 未定  | 未定  | 未定  |
| ②キャリア教育の推進       | ▶     |       |    |     |     |     |
| (事業費：千円)         | 258   | 230   | 未定 | 未定  | 未定  | 未定  |

## 保育園留学やデュアルスクールなどの促進

【取組・施策】 地方と都市の学校間連携による教育環境を構築することにより、双方の視点に立った多角的な思考力を有する人材の育成を図る。

### ■ 保育園留学推進事業

【事業内容】 都市部に住む子育て世帯が七尾市に滞在し、子どもは地元の保育園に短期間通い、親がリモートワークを行う移住体験プログラムを実施する。

【担当課: 産業振興課】

【事業期間】 令和6年度～令和8年度



|                | 短期    | 中期    |    | 長期  |     |     |
|----------------|-------|-------|----|-----|-----|-----|
|                | R7    | R8    | R9 | R10 | R11 | R12 |
| ①保育園留学<br>推進事業 | ▶     |       |    |     |     |     |
| (事業費：千円)       | 2,707 | 2,750 |    |     |     |     |

## 参考 地域との意見交換会でいただいた意見

地域との意見交換会でいただいた意見を、重点プロジェクトごとに一覧表として整理しました。

### 1. 被災者一人ひとりに寄り添った生活再建プロジェクト

| 意見のあった地区                      | 主な意見  | 反映した取組み                |
|-------------------------------|---|------------------------|
| <b>P4 災害公営住宅の建設</b>           |   |                        |
| 田鶴浜、西湊、<br>矢田郷                | <b>復興公営住宅を活かした地域づくり</b><br>・復興公営住宅での交流機能の整備検討         | ■復興公営住宅の建設             |
| 袖ヶ江、田鶴浜                       | <b>まちなかへの居住誘導</b><br>・まちなかの空き地を活かした復興公営住宅の検討          | ■復興公営住宅の建設             |
| 田鶴浜                           | <b>伝統文化の保護・継続への支援</b><br>・復興公営住宅に田鶴浜建具や組子を入れる         | ■復興公営住宅の建設             |
| <b>P8 仮設住宅の再利用による安価な住宅の提供</b> |   |                        |
| 和倉、北大呑、<br>崎山、高階、<br>東湊、矢田郷   | <b>住宅の再建支援</b><br>・仮設住宅の再利用による安価な住宅の提供                | ■応急仮設住宅再利用支援事業         |
| <b>P15 被災者の見守り体制づくり</b>       |   |                        |
| 田鶴浜、西湊                        | <b>医療・福祉サービスの充実</b><br>・介護タクシーへの助成<br>・高齢者に対する医療福祉の強化 | ■被災者の見守り・相談支援<br>など事業費 |
| 田鶴浜                           | <b>高齢者の見守りに向けた取組み</b><br>・地域の見守り機能の導入支援               | ■被災者の見守り・相談支援<br>など事業費 |

## 2. 地域コミュニティ再生プロジェクト

| 意見のあった地区  | 主な意見  | 反映した取組み   |
|---|---|---|
| <b>P16 集会施設や地域コミュニティ施設の再建と機能強化（コミュニティ施設の災害復旧）</b> |   |   |
| 高階、袖ヶ江、<br>西湊、崎山                                  | <b>コミュニティセンターの機能強化</b><br>・コミュニティセンターの改修・機能強化・移転などの検討                             | ■コミュニティ施設の災害復旧  |
| 北大呑、田鶴浜、<br>崎山、徳田、<br>和倉、東湊、<br>矢田郷、南大呑           | <b>避難時に利用する施設の整備・強化</b><br>・各地区における避難所の整備・強化                                      | ■コミュニティ施設の災害復旧  |
| <b>P21 集会施設や地域コミュニティ施設の再建と機能強化（震災復興ゆめ基金事業）</b>    |   |   |
| 矢田郷   | <b>関係人口構築に向けた取組み</b><br>・ゆめ基金を活用した起業（産業）への支援                                      | ■震災復興ゆめ基金事業   |
| 田鶴浜、高階、<br>能登島、徳田、<br>中島                          | <b>地域コミュニティ強化に向けた支援</b><br>・地域の活動（獅子舞などの文化的活動）への金銭面の支援                            | ■震災復興ゆめ基金事業   |
| 田鶴浜、高階、<br>能登島、徳田、<br>中島                          | <b>地域コミュニティ強化に向けた支援</b><br>・地域のアピール活動を支援  | ■震災復興ゆめ基金事業   |
| 田鶴浜、能登島   | <b>地域コミュニティ強化に向けた支援</b><br>・田鶴浜高校ボランティアとの連携や活動支援<br>・出張カフェやこども会議などの人件費に対する支援制度の検討 | ■震災復興ゆめ基金事業   |
| 高階、田鶴浜、<br>袖ヶ江                                    | <b>伝統文化の保護・継続への支援</b><br>・祭り関係の補助拡充   | ■震災復興ゆめ基金事業   |
| 北大呑、田鶴浜、<br>崎山、徳田、和倉、<br>東湊、矢田郷、<br>南大呑           | <b>避難時に利用する施設の整備・強化</b><br>・各地区における避難所の整備・強化                                      | ■地域コミュニティ施設など<br>再建支援事業<br>■集会施設など再建支援事業<br>■震災復興ゆめ基金事業 |
| 北大呑、田鶴浜、<br>崎山、徳田、和倉、<br>東湊、矢田郷、<br>南大呑           | <b>避難時に利用する施設の整備・強化</b><br>・体育館・集会所の冷暖房整備   | ■地域コミュニティ施設など<br>再建支援事業<br>■集会施設など再建支援事業<br>■震災復興ゆめ基金事業 |

## 2. 地域コミュニティ再生プロジェクト

| 意見のあった地区   | 主な意見   | 反映した取組み   |
|--|--|---|
| <b>P20 集会施設や地域コミュニティ施設の再建と機能強化</b>               |  |   |
| 北大吞、田鶴浜、<br>崎山、徳田、和倉、<br>東湊、矢田郷、<br>南大吞          | <b>避難時に利用する施設の整備・強化</b><br>・ 体育館・集会所の冷暖房整備                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 地域コミュニティ施設など再建支援事業</li> <li>■ 集会施設など再建支援事業</li> <li>■ 震災復興ゆめ基金事業</li> </ul>                    |
| 徳田、袖ヶ江、<br>高階、和倉、石崎、<br>中島、北大吞、<br>矢田郷、南大吞       | <b>避難時に利用する施設の整備・強化</b><br>・ 集会所などの耐震工事や再建に対する補助や支援                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 地域コミュニティ施設など再建支援事業</li> <li>■ 集会施設など再建支援事業</li> <li>■ 震災復興ゆめ基金事業</li> </ul>                    |
| 徳田、袖ヶ江、<br>高階、和倉、<br>石崎、中島、<br>北大吞、矢田郷、<br>南大吞   | <b>避難時に利用する施設の整備・強化</b><br>・ 避難所への空調の整備                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 地域コミュニティ施設など再建支援事業</li> <li>■ 集会施設など再建支援事業</li> <li>■ 震災復興ゆめ基金事業</li> </ul>                    |
| 西湊、袖ヶ江、<br>北大吞、崎山、<br>東湊、南大吞、<br>御祓、矢田郷、<br>高階   | <b>避難しやすい環境の構築</b><br>・ 地域の自治組織の体制強化や見直し                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 地域コミュニティ施設など再建支援事業</li> <li>■ 集会施設など再建支援事業</li> <li>■ 震災復興ゆめ基金事業</li> </ul>                    |
| <b>P22 祭りや被災文化財の再建</b>                           |  |   |
| 御祓、矢田郷、<br>東湊                                    | <b>文化施設の保護・修繕</b><br>・ 補助金（7/8）（上限 1,400 万）1/9の負担軽減                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 指定文化財の保存事業など補助金</li> </ul>   |
| <b>P23・P24 祭りや伝統文化行事の開催支援</b>                    |  |   |
| 徳田、田鶴浜<br>矢田郷、石崎<br>和倉、北大吞<br>中島、御祓、東湊<br>西湊、能登島 | <b>祭りの伝統文化行事への支援</b><br>・ 石崎奉燈祭の継続開催への支援<br>・ 祭りボランティアへの継続的なサポート支援 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 石崎奉燈祭開催支援事業</li> <li>■ 青柏祭でか山開催支援事業</li> <li>■ 能登島向田の火祭開催支援事業</li> <li>■ お熊甲祭開催支援事業</li> </ul> |

## 2. 地域コミュニティ再生プロジェクト

| 意見のあった地区  | 主な意見  | 反映した取組み  |
|---|---|--|
| <b>P25 震災後のニーズを踏まえた公共交通網の構築</b>                                     |   |  |
| 高階、能登島、<br>中島、徳田、<br>袖ヶ江、和倉、<br>北大呑、崎山、<br>東湊、矢田郷、<br>御祓、南大呑、<br>石崎 | <b>新たな交通サービス導入・強化</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>公共交通の路線や便数、車両規模などの見直し</li> <li>既存のバス（ぐるっとセブン）の運行ルート検討</li> <li>デマンド交通の導入に向けた検討</li> <li>乗合交通における金銭面（維持管理費など）の支援や助成</li> <li>移動時間や移動料金の改善やタクシーの補助</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■地域主体デマンド型乗合タクシー推進事業</li> <li>■オンデマンド型地域公共交通システム構築事業</li> </ul> |
| <b>P26 空き家、空き地などの利活用の推進</b>   |   |  |
| 御祓、袖ヶ江  | <b>空き家、空き地の有効活用</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>解体されたまとまった空き地を一時的に借用して活用</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■空き家バンク運営事業</li> <li>■空き家リフォーム支援事業補助金</li> </ul>                |
| 和倉、袖ヶ江、<br>西湊、高階、石崎   | <b>空き家、空き地の有効活用</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>空き家の有効活用実現化に向けた検討</li> <li>空き地バンクや空き家バンクの活用促進</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■空き家バンク運営事業</li> <li>■空き家リフォーム支援事業補助金</li> </ul>                |
| 北大呑、東湊  | <b>空き家、空き地の有効活用</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>空き家に関する情報発信</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■空き家バンク運営事業</li> <li>■空き家リフォーム支援事業補助金</li> </ul>                |
| 御祓、中島   | <b>空き家、空き地の有効活用</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>空き家の改修・活用</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■空き家バンク運営事業</li> <li>■空き家リフォーム支援事業補助金</li> </ul>                |

### 3. 震災の経験を活かしたインフラ強靱化プロジェクト

| 意見のあった地区  | 主な意見   | 反映した取組み  |
|---|--|--|
| <b>P27 防災機能の強化（防災備蓄倉庫の整備）</b>                           |  |  |
| 徳田、袖ヶ江、<br>高階、和倉、石崎、<br>中島、矢田郷、<br>田鶴浜、崎山、東湊<br>北大呑、南大呑 | <b>避難時に利用する施設の整備・強化</b><br>・防災備蓄倉庫を各町に配置   | ■防災備蓄倉庫の整備   |
| 東湊  | <b>公共施設の復旧</b><br>・希望の丘公園における防災機能の充実   | ■防災備蓄倉庫の整備   |
| <b>P29 防災機能の強化（緊急情報告知システムの整備）</b>                       |  |  |
| 北大呑、田鶴浜、<br>崎山、徳田、和倉、<br>東湊、矢田郷、<br>南大呑                 | <b>災害時の対応強化</b><br>・地区限定の放送ができるように対応   | ■緊急情報告知システム<br>の整備                                   |
| <b>P58 能越自動車道田鶴浜七尾道路・国道159号七尾バイパスの整備促進</b>              |  |  |
| 西湊、高階、東湊  | <b>広域インフラの整備推進</b><br>・(都)外環状線の整備促進<br>・能越自動車道七尾田鶴浜道路の早期開通                             | ■国道159号線七尾<br>バイパス整備促進事業<br>■能越自動車道田鶴浜<br>七尾道路整備促進事業 |
| <b>P60 避難所機能の強化</b>                                     |  |  |
| 徳田、袖ヶ江、<br>高階、和倉、石崎、<br>中島、北大呑、<br>矢田郷、南大呑              | <b>避難時に利用する施設の整備・強化</b><br>・お寺などの民間施設との災害時の連携強化<br>・災害時の鍵の管理に関する改善<br>・急傾斜地整備に向けた県との調整 | ■避難所の生活環境強化<br>事業                                    |

#### 4. なりわい再建プロジェクト

| 意見のあった地区                          | 主な意見   | 反映した取組み         |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| <b>P69 被災した農業用機械や施設の修理、再生整備支援</b> |  |                 |
| 中島                                | <b>漁業関係の機能強化</b><br>・ 漁業施設・港湾施設の強化               | ■ 県漁協共同利用施設復旧事業 |
| <b>P73 持続可能な地域経済の復興</b>           |  |                 |
| 能登島、北大呑、御祓、西湊、高階、崎山               | <b>観光 PR や地域連携の強化</b><br>・ 地区をまたいだ観光施策や広域的な連携の検討 | ■ 広域的な経済復興推進事業  |
| 西湊、御祓、崎山                          | <b>企業誘致などの取組み</b><br>・ 廃校などの古民家の情報提供             | ■ 企業誘致促進事業      |

#### 5. 和倉温泉創造的復興プロジェクト

| 意見のあった地区                   | 主な意見  | 反映した取組み                          |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| <b>P74 和倉温泉創造的復興プランの実現</b> |   |                                  |
| 能登島、北大呑、御祓、西湊、高階、崎山        | <b>観光 PR や地域連携の強化</b><br>・ 和倉とセットでの国内外への観光 PR | ■ 和倉温泉復興応援救済支援事業<br>■ 和倉温泉復興支援事業 |

#### 6. スポーツ・歴史文化で賑わい創出プロジェクト

| 意見のあった地区                         | 主な意見   | 反映した取組み                       |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>P86 新たな合宿や体験型旅行の誘致</b>        |  |                               |
| 矢田郷、石崎                           | <b>スポーツ合宿などの誘致に向けた支援</b><br>・ スポーツ合宿やイベントの誘致<br>(スポーツコミッションを進める) | ■ 合宿など誘致事業<br>■ 海外誘客プロモーション事業 |
| <b>P88 スポーツイベントを活用した魅力づくりの推進</b> |  |                               |
| 田鶴浜、高階、能登島、徳田、中島                 | <b>地域コミュニティ強化に向けた支援</b><br>・ 大学などとの連携支援、橋渡し                      | ■ 大学スポーツ連携事業                  |

## 7. 未来を担うひとづくりプロジェクト

| 意見のあった地区                 | 主な意見  | 反映した取組み                                     |
|--------------------------|---|---|
| <b>P93 学校施設の早期復旧</b>     |   |   |
| 田鶴浜                      | <b>公共施設の機能強化</b><br>・ 田鶴浜小学校の校舎建て替え                   | ■学校施設の早期復旧                                  |
| 高階、袖ヶ江、<br>西湊、崎山         | <b>コミュニティセンターの機能強化</b><br>・ 子どもが利用しやすい<br>コミュニティ施設の整備 | ■学校施設の早期復旧                                  |
| <b>P97 公園・緑地の機能強化</b>    |   |   |
| <b>P100 子どもの屋内遊び場の整備</b> |   |   |
| 高階、袖ヶ江、<br>西湊、崎山         | ・ 子どもが利用しやすい<br>コミュニティ施設の整備                           | ■主な公園・被災緑地の復旧・<br>子どもの遊び場整備事業<br>■子どもの遊び場整備 |

# 七尾市復興アクションプラン

初 版 令和 8 年 3 月

【発行】七尾市

〒926-8611 石川県七尾市袖ヶ江町イ部 2 5 番地

ホームページ <http://www.city.nanao.lg.jp/>



七尾市
